



Gobierno de Calidad con Esperanza para todos!

## CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	07	2021

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Prog. presupuestario	URBANIZACION				K005
Actividad Institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				006
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ENTRADA SELVAN *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2021*				OPH-031
Ofic. Validación	ACTA No. 58 ORDINARIA 01/07/2021				
Mes de Registro	Julio				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	D) SERVICIOS PÚBLICOS OPORTUNOS Y DE EXCELENCIA				4
Objetivo	a) MEJOR CALIDAD, EFICIENCIA Y MEJORA CONTINUA EN SERVICIOS PÚBLICOS				1
Estrategia	a) DISMINUIR EL REZAGO EXISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS				1
Línea de acción	b) SERVICIOS PÚBLICOS EN CONTACTO CON LA CIUDADANÍA				1
Programa de Acción					
Objetivo	SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN				5
Estrategia	Queremos dejar un precedente, que permita en el futuro que la infraestructura educativa existente se encuentre en perfectas condiciones, con la finalidad de que nuestros jóvenes estudiantes tengan los espacios adecuados para elevar su nivel educativo				5
Línea de acción	a) En coordinación con el Estado y la Federación extender y mejorar la educación básica en todo el Municipio.				5
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	07	2021

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	OPH-031		EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ENTRADA SELVAN 'FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2021'			
Localidad (clave y descripción)	0029		Reforma 2da. Sección (Santa María), Jalpa de Méndez, Tabasco			
Proyecto Antecedente	Nuevo					
Empleos generados	0	Población Beneficiada	1370	Proyectos Complementarios		
Inversión Total		Inversión anterior		Inversión programada 2021		Inversión pendiente
0.00		0.00		0.00		0.00
Meta total		Unidad de medida		Meta programada		Meta pendiente
1.00		MEJORAMIENTO		1.00		0.00
Periodo de ejecución:				Modalidad de ejecución:		
Inicio 20/07/2021				Administración		
Término 08/09/2021						

ESTRUCTURA ECONOMICA

Tipo de gasto		Fuente de financiamiento	
Clave	Descripción	Clave	Descripción
2	GASTO DE CAPITAL	23	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %				1.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.60	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.40	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim.	1.00	4to Trim.	0.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				186,243.43
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	111,146.06	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	74,097.37	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim.	185,243.43	4to Trim.	0.00	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			Modificado
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021	TR-JULIO-001-B	TR-JULIO-001-B	01/07/2021	0.00	185,243.43	0.00	185,243.43



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA


PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ


DD	MM	AAAA
01	07	2021

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	OPH-031	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ENTRADA SELVAN 'FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2021'
--------------------------------	---------	---

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,070.80
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	183,172.83
<b>Total Capitulo</b>		<b>185,243.43</b>
<b>Global</b>		<b>185,243.43</b>

Vo.Bo  
  
 ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTIELLA  
 DIRECTOR DE LA D.O.I.T.S.M.

FORMULO  
  
 ING. RENAN TRINIDAD GARCIA  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL

AUTORIZO  
  
 PROFR. JOSE LUIS CORDOVA OVANDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

FECHA DE ELABORACION:

20 de junio de 2021

PROYECTO : OPH-031.-



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JALPA DE MENDEZ TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Jalpa de Méndez Tabasco 2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Departamento de Precios Unitarios



JALPA de Méndez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MENDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS:

TIPO DE PROYECTO PROYECTO DE INVERSION

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005.-URBANIZACION

NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ENTRADA SELVAN

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0029.-RA. REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA)

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO:

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$185,243.43

COSTO PROGRAMADO PARA 2021: \$185,243.43

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: MEJORAMIENTO TOTALES DE PROYECTO: 1.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2021: 100%

FECHA DE INICIO: 20-jul-21 FECHA DE TERMINACION: 08-ago-21

PERIODO DE LICITACIÓN: PERIODO DE FINIQUITO:

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2021: 0 No. DE EMPLEOS: 0

- MODALIDAD DE EJECUCION: ( ) CONTRATO ( ) ADMINISTRACION DIRECTA ( ) ADMINISTRACION COMITÉ ( X ) ADMINISTRACION MUNICIPAL ( ) MIXTA

FECHA DE ELABORACION:

20 de junio de 2021

PROYECTO : OPH-031.-



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JALPA DE MENDEZ TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Jalpa de Méndez Tabasco 2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales Departamento de Precios Unitarios



¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ENTRADA SELVAN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.-URBANIZACION

LOCALIZACION: 0029.-RA. REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA)

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0029.-RA. REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA)

BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: ( )

EN PROCESO: ( )

AMPLIACION: ( )

REHABILITACION: ( X )

COMPLEMENTARIA: ( )

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LOS TRABAJOS CONSISTEN: EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO EN LAS VIVIENDAS, SOLUCIONANDO EL PROBLEMA DE FLUIDEZ ELECTRICA A LA POBLACION

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 1,370 HABITANTES

FECHA DE ELABORACION: 20 de junio de 2021

PROYECTO: OPH-031.-



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
Jalpa de Méndez Tabasco  
2018-2021

**Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y  
Servicios Municipales**  
Departamento de Precios Unitarios



**JALPA**  
*de Méndez*  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

## VALIDACIÓN O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ENTRADA SELVAN

PROYECTO DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.-URBANIZACION

LOS TRABAJOS CONSISTEN: EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR A LA RED DE  
ENERGIA ELECTRICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO EN LAS  
VIVIENDAS, SOLUCIONANDO EL PROBLEMA DE FLUIDEZ ELECTRICA A LA POBLACION

0029.-RA. REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA)

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA


ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA  
DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 20 de junio de 2021

INFORMACION ADICIONAL:

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO 2018-2021  
DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL  
Y DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Méndez, Tabasco, a; 20 de junio de 2021

Folio No.: DPADS/344/2021

Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental.

**Ing. Sergio Alberto Hernández Portilla.**

Director de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales.

H. Ayuntamiento De Jalpa de Méndez, Tab.

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 113,114,115,116 del capítulo 12 de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 22 de diciembre de 2012 y artículos 32,33, inciso A,B,C,D,K,L, artículo 34 y 35 del reglamento de protección ambiental y desarrollo sustentable del municipio de Jalpa de Méndez del 26 de octubre de 2019 Se concede ejecutar la obra **OPH-031.-EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ENTRADA SELVAN.**, a ejecutarse en: **0029.- RA. REFORMA 2DA SECCION (SANTA MARIA)**, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversión Autorizada
OPH-031.-	<b>EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ENTRADA SELVAN</b>	<b>0029.- RA. REFORMA 2DA SECCION (SANTA MARIA)</b>	1 MEJORAMIENTO	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 185,243.43

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**ING. LUISA MERCEDES VERA LAZARO**  
**DIRECTORA DE PROTECCION AMBIENTAL Y**  
**DESARROLLO SUSTENTABLE**

C.C.P. ARCHIVO



RAMO GENERAL 23: PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS - FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 12 de agosto de 2021  
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

PROYECTO: OPH-031

DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ENTRADA SELVAN

LOCALIDAD: RA REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARIA)

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

PROGRAMA PRESUP: K005 - URBANIZACION

MODALIDAD: ADMINISTRACION MUNICIPAL

INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 185,243.43

META: 1.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 DIAS NATURALES  
INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 20-Jul-2021  
TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 8-ago-2021

UNIDAD: MEJORAMIENTO

POBLACIÓN BENEFICIADA: 56 HABITANTES

Código	Conceptos	Unidad	Cantidad	Precio unit.	Importe
<b>A</b>	<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>				
1.00	POSTE DE CONCRETO 12-750 INCLUYE FLETE	PIEZA	5.00	\$ 8,450.00	\$ 42,250.00
2.00	PIEDRA BOLA DE RIO	M3	2.00	\$ 892.50	\$ 1,785.00
3.00	ABRAZADERA 2UH O UL	PIEZA	2.00	\$ 74.50	\$ 149.00
4.00	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4	KG	10.00	\$ 184.00	\$ 1,840.00
5.00	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 13.2 KV	PIEZA	3.00	\$ 892.00	\$ 2,676.00
6.00	AFARTARRAYO DE 13.2 KV	PIEZA	2.00	\$ 111.00	\$ 222.00
7.00	SOPORTE CV1	METRO	25.00	\$ 157.00	\$ 3,925.00
8.00	CABLE THW CAL. 30	KG	280.00	\$ 73.00	\$ 20,440.00
9.00	CABLE AC6R CAL. 30	PIEZA	3.00	\$ 144.50	\$ 433.50
10.00	BASTIDOR B3	PIEZA	6.00	\$ 73.00	\$ 438.00
11.00	ABRAZADERA 2BS	PIEZA	9.00	\$ 16.50	\$ 148.50
12.00	AISLADOR 1C	PIEZA	4.00	\$ 71.00	\$ 284.00
13.00	AISLADOR 3R	PIEZA	15.00	\$ 16.50	\$ 247.50
14.00	CONECTOR H 3/0	PIEZA	4.00	\$ 629.00	\$ 2,516.00
15.00	CRUCETA PT200	PIEZA	4.00	\$ 630.00	\$ 2,520.00
16.00	CRUCETA PR200	PIEZA	5.00	\$ 52.00	\$ 260.00
17.00	ABRAZADERA UC	PIEZA	8.00	\$ 94.00	\$ 752.00
18.00	PERNO DR 16XS06	PIEZA	2.00	\$ 125.00	\$ 250.00
19.00	ABRAZADERA 1AG	PIEZA	15.00	\$ 487.00	\$ 7,305.00
20.00	AISLADOR 13PD	PIEZA	6.00	\$ 264.50	\$ 1,587.00
21.00	AISLADOR 13SHL450	PIEZA	6.00	\$ 264.50	\$ 1,587.00
22.00	GRAPA RAL 8	PIEZA	4.00	\$ 209.50	\$ 838.00
23.00	VARILLA DE TIERRA DE 3M	PIEZA	4.00	\$ 157.00	\$ 628.00
24.00	CONECTOR PARA VARILLA GAR	JGO	2.00	\$ 58.50	\$ 117.00
25.00	MOLDURA RE	PIEZA	4.00	\$ 31.50	\$ 126.00
26.00	OJO RE	PIEZA	6.00	\$ 134.00	\$ 804.00
27.00	CONECTOR PARA LINEA VIVA	PIEZA	6.00	\$ 66.00	\$ 516.00
28.00	CONECTOR ESTRIBO	M	50.00	\$ 21.00	\$ 1,050.00
29.00	CABLE PARA RETENIDA AG 5/18	PIEZA	2.00	\$ 262.00	\$ 524.00
30.00	ANCLA C3	PIEZA	2.00	\$ 151.00	\$ 302.00
31.00	PERNO ANCLA 1PA	PIEZA	6.00	\$ 28.00	\$ 168.00
32.00	REMATE CURVO RET 5/16	PIEZA	12.00	\$ 30.00	\$ 360.00
33.00	REMATE RECTO RET 5/16	PIEZA	4.00	\$ 30.00	\$ 120.00
34.00	REMATE PARA CAL. 2	PIEZA	2.00	\$ 13.50	\$ 27.00
35.00	GUARDACABO G2	PIEZA	4.00	\$ 105.00	\$ 420.00
36.00	TORNILLO MAQUINA 16X76	PIEZA	1.00	\$ 47,250.00	\$ 47,250.00
37.00	TRANSFORMADOR DE 75 KVA 3B 13200 V.	PIEZA	5.00	\$ 262.00	\$ 1,310.00
38.00	BRAZO PARA LUMINARIO DE Fogo DE 1.20 M CEDULA 30	PIEZA	5.00	\$ 367.00	\$ 1,835.00
39.00	FOCO LED DE 50 WATTS	LA	20.00	\$ 15.50	\$ 310.00
40.00	CABLE THW CAL 10	PIEZA	5.00	\$ 420.00	\$ 2,100.00
41.00	CARCAZA SUBURBANA PARA ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	5.00	\$ 99.50	\$ 497.50
42.00	FOTOCÉLDA 120-240 V MARCA TORK	II	300.00	\$ 18.80	\$ 5,640.00
43.00	CABLE 2+1 CAL 6				

SUB-TOTAL: \$ 159,442.00  
IVA EN MATERIALES: \$ 25,510.72  
TOTAL DE MATERIAL: \$ 184,952.72



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



META: MEJORAMIENTO  
 IMPORTE TOTAL EJERCIDO EN ESTA COMUNIDAD \$ 184,952.73  
 IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 184,952.73  
 INICIO REAL: 20-jul-2021  
 TERMINO REAL: 8-ago-2021  
 SALDO POR CANCELAR \$ 290.70

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio	Fecha	Inversión (\$)
ANEXO 01 DEL ACTA DE CABILDO ORDINARIA No. 58/2018 - 2021	1-jul-2021	\$ 185,243.43

VERIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio	Fecha	Metas

EN LAS CUALES SE EFECTUÓ LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DEPENDENCIA:  
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
 NOMBRE Y FIRMA: ING. SERGIO ALBERTO HERNÁNDEZ PORTILLA  
 DIRECTOR DE LA DDOOTSM  
 POR LA COMUNIDAD BENEFICIADA:  
 NOMBRE Y FIRMA: C. URBANO OLIVERA  
 DELEGADO  
 POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:  
 CARGO: DIRECTOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NOMBRE Y FIRMA: LIC. ROMEO LUGO DE LA FUENTE

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LA MISMA Y 166 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_  
 Razones: \_\_\_\_\_  
 Nombre y firma: \_\_\_\_\_

# ALBUM FOTOGRAFICO

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

OPH-031.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ENTRADA SELVAN

FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2021

OBRA:

RA. REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARIA)

LOCALIDAD:

RAMO GENERAL 23: PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS - FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES

RECURSOS:

HOJA:


DEL 20 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2021

PERIODO:



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Jalpa de Méndez Tabasco  
2018-2021

2018, Año del Y Centenario del Excmo. de los Mártires de Tabasco  
Secretaría de Obras, Construcción, Territorialidad y Servicios Municipales  
Departamento de Obras Públicas y Mantenimiento

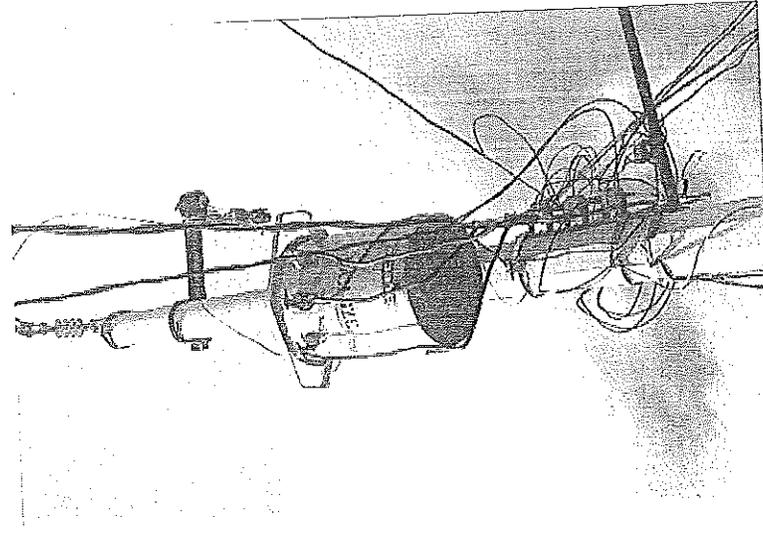

# ALBUM FOTOGRAFICO

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

OPH-031.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ENTRADA SELVAN

FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2021

RA. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)

RAMO GENERAL 23: PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS - FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES


OBRA:

LOCALIDAD:

RECURSOS:



PERIODO:

HOJA:



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Jalpa de Méndez, Tabasco  
2018-2021

2008, Año del Centenario del Escarabajo de las Yucas en Tabasco  
Strategia al Poder, Ordenamiento Territorial y Servicio Municipal  
Departamento de Previsión, Planeación y Promoción

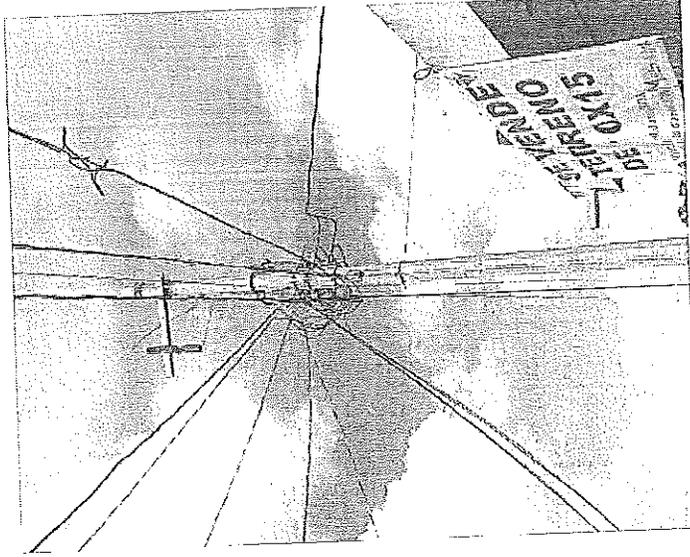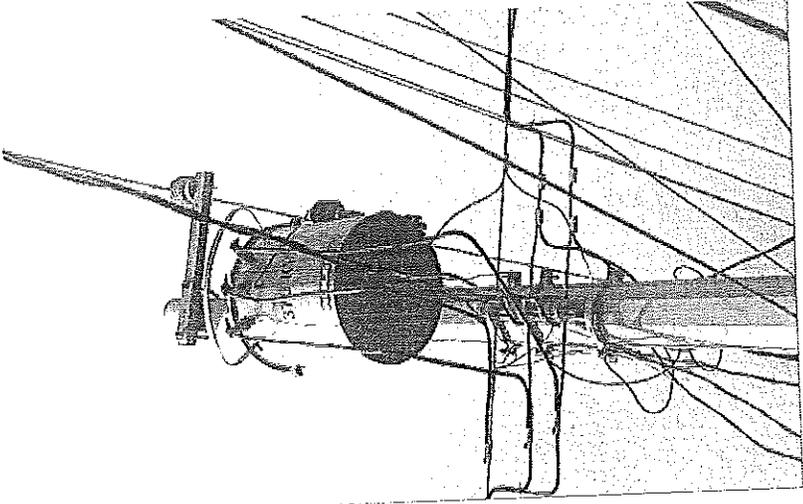

Elaboró: 

ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZASUPERVISOR DE LA DOOTSM

# BITACORA DE OBRA

JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO A 20 DE JULIO DE 2021

NOTA No: 01

DE ACUERDO A ESTA FECHA SE PROCEDE A LA APERTURA DE LA SIGUIENTE BITACORA DE OBRA CON LA FINALIDAD DE MANIFESTAR EN LA MISMA TODOS LOS SUCESOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA REALIZADA POR ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA CUAL SE ASIENTAN LOS SIGUIENTES DATOS:

OBRA: OPH-031.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ENTRADA SELVAN.

RECURSOS: RAMO GENERAL 23: PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS - FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES

LOCALIDAD: RA. REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA)

IMPORTE: \$184,952.73

PLAZO DE EJECUCION: DEL 20 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2021

FECHA DE INICIO: 20/07/2021

FECHA DE TERMINO: 08/08/2021

ESTA BITACORA PODRA SER UTILIZADA POR LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN ESTA HOJA DE REGISTRO DE FIRMAS Y LAS CUALES FUERON ASIGNADOS Y PERTENECEN AL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACION:

ING. SERGIO ALBERTO PORTILLA HERNANDEZ  
DIRECTOR DE LA DOOTSM



ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

# BITACORA DE OBRA

JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO A 20 DE JULIO DE 2021

## NOTA No: 02

CON ESTA FECHA SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS EL SUPERVISOR DE OBRA DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN CONSTATANDO EL MOVIMIENTO DE EQUIPO Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: OPH-031.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ENTRADA SELVAN.

SE INICIA CON UNA PLATICA DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ACUERDO AL CAPITULO 100 DISTRIBUCION DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA QUE LOS TRABAJOS SE LLEVEN DE ACUERDO A ESTE REGLAMENTO Y SE LE INDICA A LA SUPERINTENDENCIA QUE DEBERA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LAS NORMAS DE DISTRIBUCION AEREAS DE LA C.F.E. ALCANCES Y ESPECIFICACIONES LOS CUALES FUERON ENTREGADOS PREVIO A ESTA REUNION.

SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE: INCADO DE POSTES Y VESTIDO DE ESTRUCTURAS ASI COMO INSTALACION DE CONDUCTORES

1.00	POSTE DE CONCRETO 12-750 INCLUYE: FLETE	PIEZA	5.00
2.00	PIEDRA BOLA DE RIO	M3	2.00
3.00	ABRAZADERA 2UHO UL	PIEZA	2.00
4.00	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4	KG	10.00
5.00	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 13.2 KV	PIEZA	3.00
6.00	APARTARRAYO DE 13.2 KV	PIEZA	3.00
7.00	SOPORTE CV1	PIEZA	2.00
8.00	SOPORTE CV1	METRO	25.00
9.00	CABLE THW CAL. 3/0	KG	260.00
10.00	CABLE ACSR CAL. 3/0	PIEZA	3.00
11.00	BASTIDOR B3	PIEZA	6.00
12.00	ABRAZADERA 2BS	PIEZA	9.00
13.00	ASLADOR 1C	PIEZA	4.00
14.00	ASLADOR 3R	PIEZA	15.00
15.00	CONECTOR H 3/0	PIEZA	4.00
16.00	CRUCETA PT200	PIEZA	4.00
16.00	CRUCETA PR200	PIEZA	4.00



ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
SUPERVISOR DE LA DOOTSM

# BITACORA DE OBRA

JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO A 31 DE JULIO DE 2021

## NOTA No: 03

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS REALIZADOS CON PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: OPH-031.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ENTRADA SELVAN.

SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE: INSTALACION DE HERRAJES EN ESTRUCTURAS DE MEDIA Y BAJA TENSION

17.00	ABRAZADERA UC	PIEZA	5.00
18.00	PERNO DR 16X506	PIEZA	8.00
19.00	ABRAZADERA 1AG	PIEZA	2.00
20.00	ABRAZADERA 1AG	PIEZA	15.00
21.00	AISLADOR 13PD	PIEZA	6.00
21.00	AISLADOR 13SHL45C	PIEZA	6.00
22.00	GRAPA RAL 8	PIEZA	4.00
23.00	VARILLA DE TIERRA DE 3M	PIEZA	4.00
24.00	CONECTOR PARA VARILLA GAR	JGO	2.00
25.00	MOLDURA RE	PIEZA	4.00
26.00	OJO RE	PIEZA	6.00
27.00	CONECTOR PARA LINEA VIVA	PIEZA	6.00
28.00	CONECTOR ESTRIBO	PIEZA	6.00
29.00	CABLE PARA RETENIDA AG 5/16	M	50.00
30.00	ANCLA C3	PIEZA	2.00
31.00	PERNO ANCLA 1PA	PIEZA	2.00
32.00	PERNO ANCLA 1PA	PIEZA	6.00
32.00	REMATE CURVO RET 5/16	PIEZA	12.00
33.00	REMATE RECTO RET 5/16	PIEZA	4.00
34.00	REMATE PARA CAL- 2	PIEZA	4.00
35.00	GUARDACABO G2	PIEZA	2.00
36.00	TORNILLO MAQUINA 16X76	PIEZA	4.00

  
ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
SUPERVISOR DE LA DOOTSM

# BITACORA DE OBRA

JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO A 08 DE AGOSTO DE 2021

## NOTA No: 04

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS REALIZADOS CON PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: OPH-031.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ENTRADA SELVAN.

SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE:INSTALACION DE TRANSFORMADOR HERRAJES Y LUMINARIAS

37.00	TRANSFORMADOR DE 75 KVA 3B 13200 V	PIEZA	1.00
		PIEZA	5.00
38.00	BRAZO PARA LUMINARIO DE Foco DE 1.20 M CEDULA 30	PIEZA	5.00
39.00	FOCO LED DE 50 WATTS	M	20.00
40.00	CABLE THW CAL 10	PIEZA	5.00
41.00	CARCAZA SUBURBANA PARA ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	5.00
42.00	FOTOCELDA 120-240 V MARCA TORK	M	300.00
43.00	CABLE 2+1 CAL 6		

CON ESTA MISMA FECHA SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS FISICOS AL 100%

  
ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
SUPERVISOR DE LA DOOTSM
