




**INFORME RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025**

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

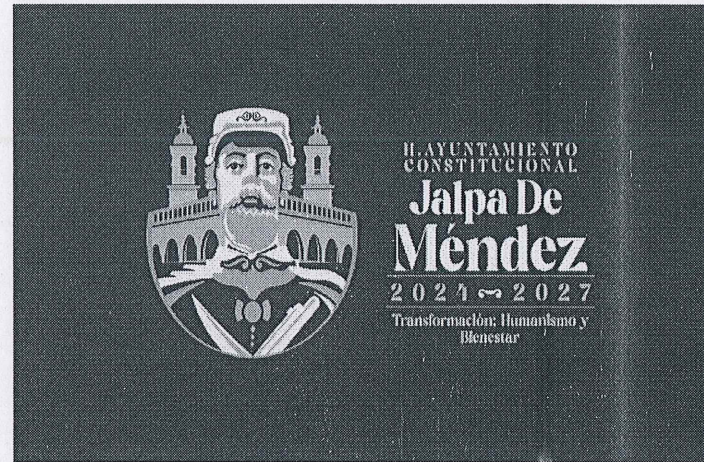

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F11_CICLO DE RECURSO	F11_RAMO	F11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F12_CICLO DE RECURSO	F12_RAMO	F12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402460938	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,413,484.41	3,380,847.54	(f11: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3413484.41, modificado:3380847.54))	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL POBLADO AYAPA - 377075	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	377075	5	400	400	0	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada: 510.0))
2025	1	TAB240402460962	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,556,571.33	1,539,493.99	(f11: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1556571.33, modificado:1539493.99))	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL AREA DE PORTALES MEDIANTE ACABADOS BARRIO LA GUADALUPE - 377177	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	377177	5	8,618	8,061	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada: 1500.0))
2025	1	TAB240402460980	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,665,546.61	1,567,209.57	(f11: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1665546.61, modificado:1567209.57))	REHABILITACION DE CÁRCAMO DEL BARRIO LA CANDELARIA - 377219	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	377219	5	203	204	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))
2025	1	TAB240402461018	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				908,820.43	899,731.07	(f11: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:908820.43, modificado:899731.07))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VILLA JALUPA - 377303	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	377303	5	200	200	0	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada: 80.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402460938	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:EJE VIAL AYAPA PUEBLO AYAPA, 86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA AMATITAN Y CARRETERA GREGORIO MENDEZ, CARRETERA CUPILCO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO LLAMADO LA ZANJA DEL POBLADO AYAPA CERCA DE LAS CALLES S, lon:-93.10721194, lat:18.22854894}}	01-12-2024	31-12-2024	3,380,847.54	3,380,847.54	3,380,847.54	3,380,847.54	3,380,847.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-004/2024, contratista:JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:3413484.41, Importe_modificado:3380847.54}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:510.0)}	{2460938/proyecto_INICIO, 2460938/proyecto_FIN, 2460938/proyecto_PROCESO, 2460938/proyecto_FIN, 2460938/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402460962	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:EJE VIAL BARRIO LA GUADALUPE BARRIO GUADALUPE, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y CALLE PRIMERA DE CONSTITUCION, CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA CIU, lon:-93.06179903, lat:18.17635081}}	01-12-2024	31-12-2024	1,639,493.99	1,639,493.99	1,639,493.99	1,639,493.99	1,639,493.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-002/2024, contratista:OSCAR ANTONIO CORONEL LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1656571.33, Importe_modificado:1639525.17}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0)}	{2460962/proyecto_PROCESO, 2460962/proyecto_INICIO, 2460962/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402460980	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:EJE VIAL BARRIO LA CANDELARIA BARRIO LA CANDELARIA, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE EDEL ORUETA, CARRETERA EL RIO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA CANDELARIA , lon:-93.062672, lat:18.167936}}	01-12-2024	31-12-2024	1,567,209.57	1,567,209.57	1,567,209.57	1,567,209.57	1,567,209.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-005/2024, contratista:ARISANDY SERAFIN LAY, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2318282.31, Importe_modificado:2341699.31}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}	{2460980/proyecto_INICIO, 2460980/proyecto_PROCESO, 2460980/proyecto_INICIO, 2460980/proyecto_PROCESO, 2460980/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402461018	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:EJE VIAL JALUPA VILLA JALUPA, 86203 JALUPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE SAN PEDRITO Y CALLE SAN ROMAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VILLA JALUPA EN LA CERRADA DE SAN PEDRITO POR LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 45 CE, lon:-93.05428129, lat:18.1447117}}	01-12-2024	31-12-2024	899,731.07	899,731.07	899,731.07	899,731.07	899,731.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-001/2024, contratista:CONSTRUAGREGADOS HOPELCHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:908520.43, Importe_modificado:899731.07}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0)}	{2461018/proyecto_PROCESO, 2461018/proyecto_INICIO, 2461018/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402461032	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				613,350.75	607,045.95	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:613350.75, modificado:607045.95))	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN EL POBLADO SOYATACO - 377387	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	377387	5	450	450	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada: 600.0))
2025	1	TAB240402461044	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				672,152.70	590,524.00	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:672152.7, modificado:590524.0))	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE LA RA RIBERA ALTA - 377424	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	377424	5	150	150	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificada: 2.0))
2025	1	TAB240402461068	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				291,284.26	432,274.97	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291284.26, modificado:432274.97))	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LAS CALLES GREGORIO MENDEZ Y JUSTO SIERRA BARRIO SAN LUIS - 377493	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	377493	5	100	100	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada: 405.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402461032	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:EJE VIAL SOYATACO PUEBLO SOYATACO, 89209 SOYATACO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA SOYATACO Y CARRETERA MECOACAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POBLADO SOYATACO ANTES DEL POBLADO MECOACAN CERCA DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-93.07658706, lat:18.20826602}}	01-12-2024	31-12-2024	607,045.95	607,045.95	607,045.95	607,045.95	607,045.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-003/2024, contratista:JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1039336.54, importe_modificado:1050374.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{2461032/proyecto_INICIO, 2461032/proyecto_PROCESO, 2461032/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402461044	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:EJE VIAL RIBERA ALTA RANCHERIA RIVERA ALTA, 86205 RIBERA ALTA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y BOULEVARD SALIDA A NACAJUCA, CARRETERA NACAJUCA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RIBERA ALTA ADELANTE DE LA CIUDAD DE, lon:-93.04545323, lat:18.17183242}}	01-12-2024	31-12-2024	590,524.00	590,524.00	590,524.00	590,524.00	590,524.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-005/2024, contratista:ARISANDY SERAFIN LAY, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2318282.31, importe_modificado:2341699.31}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{2461044/proyecto_INICIO, 2461044/proyecto_PROCESO, 2461044/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402461068	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GREGORIO MENDEZ BARRIO SAN LUIS, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE JUSTO SIERRA DEL B, lon:-93.06290498, lat:18.17840135}}	21-11-2024	20-12-2024	432,274.97	432,274.97	432,274.97	432,274.97	432,274.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-003/2024, contratista:JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1039336.54, importe_modificado:1050374.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}}	{2461068/proyecto_INICIO, 2461068/proyecto_PROCESO, 2461068/proyecto_INICIO, 2461068/proyecto_PROCESO, 2461068/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:ajustar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:ajustar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:ajustar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:ajustar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2025-04-15}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	PROYECTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
-------	-----------	----------	-------------------------	------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	--------	------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------	---------------	------------------	-----------------------	-----------------	------------------------	---------	---------	---------------	-------



ANDRÉS FERRA MONTERO LÓPEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. JOSÉ DEL CARMEN OLÁN OLÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR



LIC. ANDRÉS ESPERZA MONTERO LÓPEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. JOSÉ DEL CARMEN OLÁN OLÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL

