



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

“2021, Año de la Independencia”



DEPENDENCIA	: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
TIPO DE CONTRATO	: ESTATAL
ORIGEN DEL RECURSO	: RAMO 33 FONDO III 2021
PROG. PRESUPUESTARIO	: K005.- URBANIZACION
PROG. INSTITUCIONAL	: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
PARTIDA	: 61501.- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN
PROYECTO No.	: OP33-089
PROCED. DE CONTRATACIÓN	: ADJUDICACION DIRECTA
LICITACIÓN No.	: JM-DOOTSM-047-2021

CONTRATO NO.	: CONT-DOOTSM-JM-047/2021
FECHA	: 26 de mayo de 2021
OBRA	: OP33-089.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD REFORMA 1ra SECCIÓN (TRAMO TERESILA)
LOCALIDAD	: 028 R/A. REFORMA 1RA. SECCIÓN
MUNICIPIO	: JALPA DE MENDEZ
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 20 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO	: 1 de junio de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	: 20 de junio de 2021
IMPORTE CONT. C/IVA	: \$119,288.09
IMPORTE CONT. S/IVA	: \$102,834.56
IMPORTE AUT. C/IVA	: \$120,584.52
IMPORTE AUT. S/IVA	: \$103,952.17
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN	: ACTA DE CABILDO SESIÓN No. 50 EXTRAORDINARIA BIS DE FECHA 04/02/2021
IMPORTE ANTICIPO	: NO APLICA
META	: 172.50 M2

CONTRATISTA	: AULIS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO	: CALLE IGNACIO ZARAGOZA NO.36, COL. CENTRO C.P. 86780, JONUTA, TABASCO
REG. FED. DE CAUSANTES	: AAS130102F23
REG. I. M. S. S.	: Q0611429101
REG. INFONAVIT	: Q0611429101
ESPECIALIDAD	: 120

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, REPRESENTADA POR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

“2021, Año de la Independencia”



EL C. **PROFR. JOSE LUIS CORDOVA OVANDO**, EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “**EL AYUNTAMIENTO**” Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA **AULIS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL (LA) **LIC. SAUL JIMENEZ MENDEZ** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**EL CONTRATISTA**”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- “EL AYUNTAMIENTO” DECLARA:

QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 64 Y 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO 1, 16, 17, 42, 50 FRACCIÓN II Y 67 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, GOZA DE PERSONALIDAD JURÍDICA PARA TODO LOS EFECTOS LEGALES, POR LO QUE SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.

QUE EL C. **PROFR. JOSE LUIS CORDOVA OVANDO**, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL ACTA DE CABILDO DE LA SESION EXTRAORDINARIA No. 52 DE FECHA 5 DE MARZO DE 2021 Y SÍNDICO DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL **2018-2021**, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 23 PÁRRAFO SEGUNDO Y 26 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, POR LO QUE CUENTAN CON CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO

EL C. **ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA**, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO **DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**, CON SU NOMBRAMIENTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2018, OTORGADO POR EL C. **LIC. JESUS SELVAN GARCIA**, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA AL “**CONTRATISTA**” DENTRO DE LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON RECURSOS DE: **RAMO 33 FONDO III 2021**, AUTORIZADA POR LA ACTA DE CABILDO SESION No. 50 EXTRAORDINARIA BIS DE FECHA 04/02/2021.

QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A “**EL CONTRATISTA**”, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA CON LA INVERSIÓN AUTORIZADA QUE SE DESCRIBE EN LA DECLARACIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES QUE SE MARCARON AL “**CONTRATISTA**” PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

OP33-089.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD REFORMA 1ra SECCIÓN (TRAMO TERESILA), META: 172.50 M2, EN LA LOCALIDAD DE: 028 R/A. REFORMA 1RA. SECCIÓN.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: **CALLE PLAZA HIDALGO No. 1, COL. CENTRO, C.P.86200 JALPA DE MENDEZ, TABASCO**, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

QUE DESIGNA AL C. **PEDRO MAGAÑA CERINO** PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, EN BASE AL NOMBRAMIENTO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, QUE LE FUE OTORGADO POR EL C. **LIC. JESUS SELVAN GARCIA**, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, FACULTANDO PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

“2021, Año de la Independencia”



Gobierno de Unidad con Esfuerzos por el Futuro

CORRESPONDEN ORIGINALMENTE AL PRESIDENTE MUNICIPAL, EN CUANTO A LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

II.- EL CONTRATISTA DECLARA:

II.1.- QUE ACREDITA LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA EMPRESA MEDIANTE EL ACTA CONSTITUTIVA No. 14,890 (CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA), VOLUMEN: 440 (CUATROCIENTOS CUARENTA), DE FECHA: 02 DE ENERO DE 2013 ANTE EL LIC. AURA ESTELA NOVEROLA ALCOCER, NOTARIO ADSCRITO DE LA CUAL ES TITULAR EL C. LIC GUILLERMO NATVAEZ OSORIO DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 2, REGISTRÓ FEDERAL DE CONTRIBUYENTES AAS130102F23.

MANIFIESTA QUE CONOCE PLENAMENTE Y SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE LOS DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

II.2.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

II.3.- QUE CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

II.4.- DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y, A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE DOCUMENTO.

II.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLE IGNACIO ZARAGOZA NO.36, COL. CENTRO C.P. 86780, JONUTA, TABASCO, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

III.- LAS PARTES DECLARAN:

III.1.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS PLANOS, EL PROGRAMA, EL PRESUPUESTO, LA PROPUESTA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA”, LOS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

“2021, Año de la Independencia”



Gobierno de la Ciudad con Esfuerzos para Todos!

CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO

III.2.- QUE RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA:

OP33-089.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD REFORMA 1ra SECCIÓN (TRAMO TERESILA), META: 172.50 M2, EN LA LOCALIDAD DE: 028 R/A. REFORMA 1RA. SECCIÓN

UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, PLANOS DEL PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO Y DEMÁS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: **\$119,288.09 (CIENTO DIECINUEVE MIL DOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N.); INCLUYENDO EL 16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).**

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE **20 DÍAS NATURALES**, SIENDO LA FECHA DE INICIO EL DÍA **1 de junio de 2021** Y LA TERMINACIÓN EL DÍA **20 de junio de 2021**.

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.


EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACION DIRECTA** NUMERO **JM-DOOTSM-047-2021** LO ANTERIOR EN BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, CUYO FALLO FUE EMITIDO MEDIANTE EL ACTA DE FECHA **21 de mayo de 2021**.

QUINTA.- AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO.

EL COSTO DE LOS TRABAJOS SERÁ CUBIERTO CON RECURSOS DEL RAMO **33 FONDO III 2021**, MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION N°. ACTA DE CABILDO SESION No. **50 EXTRAORDINARIA BIS** DE FECHA: **04/02/2021**.

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA.

LAS OBRAS DEBERÁN SER EJECUTADAS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTÓ EN SU PROPUESTA DE LICITACIÓN, EL CUAL APROBARA “EL AYUNTAMIENTO” SI LO ENCUENTRA SATISFACTORIO, PERO EN CASO CONTRARIO TENDRÁ DERECHO A MODIFICARLO. EL PROGRAMA APROBADO SE CONSIDERARA INCORPORADO AL PRESENTE



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

“2021, Año de la Independencia”



Gobierno de Jalisco con Bonifacio por todos!

CONTRATO Y FIRMADO POR LAS PARTES, SERÁ EL QUE RIJA PARA TODOS LOS EFECTOS DE LAS ESTIPULACIONES DEL MISMO.

SÉPTIMA.- ANTICIPO.

“EL AYUNTAMIENTO” OTORGARÁ A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO DEL 0 % DEL MONTO PACTADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, LO CUAL IMPORTA LA CANTIDAD NO APLICA; INCLUYENDO EL 16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS: ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.

EL ANTICIPO SERÁ ENTREGADO A “EL CONTRATISTA” EN UNA EXHIBICIÓN Y DEBERÁ SER AMORTIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 110 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

EL ANTICIPO SE ENTREGARÁ A “EL CONTRATISTA” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, DE ACUERDO A LA FRACCIÓN I DEL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.


OCTAVA.- GARANTÍAS.

PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE CONSTITUIRÁ POR LA TOTALIDAD DEL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE CONSTITUIRÁ POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO, LA CUAL SERA DE NATURALEZA INDIVISIBLE Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRA DISMINUIRSE EN PROPORCION A LOS AVANCES DE LA OBRA, POR LO QUE DEBERA CUBRIRSE EN SU TOTALIDAD, TOMANDO COMO BASE EL MONTO TOTAL CONTRATADO Y EN SU CASO LOS CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO QUE SE HUBIERE GENERADO.

LAS FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, POR UNA INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA DIRECCION DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, ENTREGADAS DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFIQUE EL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

LAS PÓLIZAS EN QUE SEAN EXPEDIDAS LAS FIANZAS DEBERÁN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUEN:



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

“2021, Año de la Independencia”



Gobierno de Unidad con base en la ley para todos

I.- QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

II.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”.

III.- QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

IV.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

V.- EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA”, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES A LA NOTIFICACIÓN A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO”

VI.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, POR LO TANTO NO SERA APLICABLE LA FIGURA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTICULO 120 DE LA CITADA LEY.


PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER, DURANTE UN PLAZO DE 365 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LO QUE, A SU ELECCIÓN, DEBERÁN CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” OPTE POR CONSTITUIR UNA POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO POR LA RELACION DE LOS MISMOS, DICHA POLIZA DE FIANZA CONTENDRÁ LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

1.-VIGENCIA DE 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

2.-LA FIANZA SE TORNARA EXIGIBLE A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DEL PLAZO FIJADO A “EL CONTRATISTA” PARA CORREGIR LOS DEFECTOS EN LA OBRA.

PARA EFECTOS DE LAS ANTERIORES ESPECIFICACIONES, “EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN LA VIGENCIA DE LA POLIZA DE FIANZA, NOTIFICARA LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

“2021, Año de la Independencia”



“Gobierno de Unidad con Borrónes por el Bien”

O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, SEÑALÁNDOLE UN PLAZO ESPECIFICO PARA CORREGIR LAS IRREGULARIDADES.

UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA CORRECCION DE LOS DEFECTO DE LA OBRA, LA POLIZA DE FIANZA SE TORNARA EXIGIBLE Y SU COBRO SE SUJETARA AL PROCEDIMIENTO DE LA FIANZA, PREVISTO EN EL ART. 279 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, POR LO QUE NO LE SERA APLICABLE LA FIGURA JURÍDICA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTICULO 174 DE LA CITADA LEY.

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO DE “EL AYUNTAMIENTO” PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, LA ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, LICENCIAS, Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

“EL CONTRATISTA” DEBERÁ TENER SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER CONOCIMIENTO AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASIMISMO “EL AYUNTAMIENTO” ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA POR ESCRITO CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA MISMA, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DÉCIMA PRIMERA.- FORMA DE PAGO.

LA FORMA DE PAGO SERÁ MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE 30 DÍAS NATURALES, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTARLAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LAS CUALES DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO”, BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA; PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

PARA EL PAGO DE FINIQUITO EN EL CASO DE LAS OBRAS AGRUPADAS POR UN CONTRATO Y QUE SE ENCUENTREN OBRAS CON UN PLAZO MENOR A LA VIGENCIA DEL MISMO, SE EFECTUARÁ LA RECEPCIÓN FÍSICA DE CADA OBRA Y SE TRAMITARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE PARA SU PROCESO DE PAGO, SIN EMBARGO, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS SE PRESENTARA HASTA EL FINAL DEL PLAZO CONTRATADO O CONVENIDO, QUEDANDO CADA OBRA RECEPCIONADA Y FINIQUITADA, AMPARADA BAJO LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO VIGENTE, Y HASTA QUE PRESENTE AL FINAL DE LA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

“2021, Año de la Independencia”



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

VIGENCIA DEL CONTRATO, LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS POR EL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DEL CONTRATO.

LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SERÁN FIN DE MES Y AL TERMINO DE PROGRAMA CONTRATADO.

LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES SE EFECTUARÁN EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, UBICADA EN CALLE PLAZO HIDALGO No. 1, COL. CENTRO, C.P.86200 DE ESTE MUNICIPIO.

DÉCIMA SEGUNDA.- DEDUCCIONES.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE DEDUZCAN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LO SIGUIENTE:

EL 0.5 % (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) COMO DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, ENCOMENDADAS A LA CONTRALORÍA.

EL 0.2 % (CERO PUNTO DOS POR CIENTO) DESTINADOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" ASENTARÁ EN BITÁCORA Y COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL AYUNTAMIENTO", LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ÉSTA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE DIEZ DÍAS NATURALES, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD; EN EL SUPUESTO QUE "EL AYUNTAMIENTO" NO REALIZARE LA RECEPCIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, ÉSTAS, SE DARÁN POR RECEPCIONADAS.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, "EL CONTRATISTA" NO ACUDA CON "EL AYUNTAMIENTO" PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ÉSTA PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO "EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO "EL CONTRATISTA", ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL AYUNTAMIENTO" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

“2021, Año de la Independencia”



¡Gobierno de Unidad con Base en lo que todos!

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO”, PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASAN EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁ CELEBRAR UN CONVENIO ÚNICO ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIÓN EN MONTO, PLAZO DE EJECUCIÓN O METAS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO, EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O LA META, EL AYUNTAMIENTO PROCEDERÁ A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS DEL 68 AL 79 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS, SE CONSIDERARÁN PARTE DEL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, SE DEBERÁ DE NOTIFICAR POR ESCRITO A “EL AYUNTAMIENTO”, PARA QUE ESTA RESUELVA LO CONDUCENTE; “EL CONTRATISTA” SÓLO PODRÁ EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACIÓN “EL AYUNTAMIENTO” DEBERÁ ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, POR SU PARTE EL CONTRATISTA AMPLIARA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCIÓN SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDENE SU EJECUCIÓN DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISIÓN; SU CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN.

PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, “EL AYUNTAMIENTO”, JUNTO CON “EL CONTRATISTA”, PROCEDERÁN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez. Tabasco.

2018 – 2021

“2021, Año de la Independencia”



Gobierno de Unidad con Esfuerzo para Todos

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”.

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARA A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTICULO 60 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUE CONSISTIRÁ EN LA REVISIÓN DE CADA UNOS DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁN PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, ANEXANDO EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE, A “EL AYUNTAMIENTO”. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO.

“EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, DEBERÁ EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA.

LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE SUJETARÁ A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.

“EL AYUNTAMIENTO” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO” COMPARARÁ MENSUALMENTE EL IMPORTE ACUMULADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONTRA LOS QUE DEBIERON REALIZARSE DE ACUERDO AL PROGRAMA AUTORIZADO, Y SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN, EL IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA ES MENOR DE LA QUE DEBIÓ REALIZAR “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” APLICARÁ UNA RETENCIÓN ECONOMICA PROVISIONAL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO PORCIENTO) SIN INCLUIR EL I.V.A DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE DE LOS IMPORTES ACUMULADOS DE LA OBRA QUE DEBIÓ EJECUTARSE, IMPORTE PROGRAMADO (I.P.) MENOS EL IMPORTE REALMENTE EJECUTADO CONFORME AL PROGRAMA (I.R.E.) MULTIPLICADO POR EL FACTOR DE ATRASO (F.A.) RESULTANTE DE LA DIVISIÓN DE LOS DÍAS DE ATRASO ENTRE 30 (TREINTA), COMO SE EXPRESA EN LA SIGUIENTE FORMULA:

$(IP-IRE)(0.05XFA)$.

ESTA PENALIZACIÓN SE APLICARÁ COMO UNA RETENCIÓN ECONÓMICA A LA ESTIMACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE EL CONTRATISTA PODRÁ RECUPERAR, EN LAS PRÓXIMAS ESTIMACIONES SI EL ATRASO ES RECUPERADO. LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA ESTOS TRABAJOS NO SE HAN CONCLUIDO, AL REALIZAR EL CALCULO DE LA RETENCIÓN SE TOMARAN EN CUENTA LOS AJUSTES Y PRORROGAS ACORDADOS POR LAS PARTES.

CONTRATO No. CONT-DOOTSM-JM-047/2021

HOJA 10 DE 15



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

“2021, Año de la Independencia”



LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, DETERMINADAS EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL DIEZ POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO.

EN CASO DE QUE EL PORCENTAJE DEL PÁRRAFO ANTERIOR SEA REBASADO, SE TENDRÁ QUE REALIZAR EN FORMA INMEDIATA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN ESTA CLÁUSULA, Y AUN CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LIMITE MENCIONADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR “EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO.

VIGÉSIMA.- REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL AYUNTAMIENTO”.

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.

PARA LA RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVOS, QUE DE NINGUNA MANERA IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN; SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA; A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, SE SEÑALARÁ FECHA PARA LLEVAR A EFECTO UNA AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES, LA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN EL LUGAR QUE INDIQUE “EL AYUNTAMIENTO”, Y DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, EL ACUERDO TOMADO DEBERÁ CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE SERÁ FIRMADA POR LAS PARTES.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

“EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, LA CUAL NO PODRÁN SER MAYOR DE 20 DÍAS NATURALES. ASIMISMO, PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE EL CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez. Tabasco.

2018 – 2021

“2021, Año de la Independencia”



Gobierno de Unidad con Borrón de Cuentas

- I. SI “EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA.
- II. CUANDO DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS PACTADOS, LOS TRABAJOS CONTRATADOS REPRESENTEN UN ATRASO DEL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO CONTRATADO, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.
- III. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR LA “EL AYUNTAMIENTO” .
- IV. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR;
- V. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE “EL AYUNTAMIENTO” , EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.
- VI. SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES;
- VII. SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO” .
- VIII. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO” .
- IX. SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL AYUNTAMIENTO” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;
- X. SI “EL CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;
- XI. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO, Y
- XII. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMÁS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS, O BIEN DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

CUANDO EXISTA RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A “EL AYUNTAMIENTO” EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO A “EL CONTRATISTA” LA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

“2021, Año de la Independencia”



¡Gobierno de Unidad con Esperanza por todos!

DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO Y QUE EN SU CASO, SE HAYAN AGOTADO POR “EL CONTRATISTA” LAS INSTANCIAS DE INCONFORMIDAD AL ACTO SEÑALADO.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS EN EL PLAZO SEÑALADO CUBRIRÁ LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE A “EL CONTRATISTA” LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE VEINTE DÍAS NATURALES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS MISMOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE “EL AYUNTAMIENTO”. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A COADYUVAR EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN; IGUALMENTE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DAR AVISO AL RESIDENTE DE OBRA DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACIÓN Y MAGNITUD.

“EL CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA APARICIÓN DE CUALQUIER BROTE EPIDÉMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA. TAMBIÉN ENTERARÁ AL RESIDENTE DE OBRA CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS.

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SU SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE EN RESPONDER



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN.


LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, UBICADOS EN ESTA CIUDAD, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO EXISTE DOLO, LESIÓN, MALA FE, ERROR, NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA DERIVADA DE LO ANTERIOR.

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL DE ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES, LO FIRMAN EN DOS TANTOS EN ORIGINAL DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE SUS CLÁUSULAS, EN MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, ESTADO DE TABASCO, A LAS 13:00 HRS DEL DÍA 26 de mayo de 2021.

CONTRATISTA
AULIS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

LIC. SAUL JIMENEZ MENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

C. PEDRO MAGAÑA CERINO
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

“2021, Año de la Independencia”



¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!



ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES


LIC. LOYDA MAGAÑA RUIZ
DIRECTOR DE FINANZAS

ESTA ES LA ULTIMA HOJA DEL CONTRATO No. CONT-DOOTSM-JM-047/2021, PROYECTO OP33-089.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD REFORMA 1ra SECCIÓN (TRAMO TERESILA), CELEBRADO POR LAS PERSONAS NOMBRADAS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



DEPENDENCIA
OFICIO No.

OBRAS PÚBLICAS.
DOOTSM/DL/231/21

Jalpa de Méndez, Tabasco a 26 de abril de 2021.

AULIS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
CALLE IGNACIO ZARAGOZA NO.36
COL. CENTRO C.P. 86780
JONUTA, TABASCO

AT'N: LIC. SAUL JIMENEZ MENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL.

El H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, a través del comité de obra pública municipal, conforme a lo establecido en el **Art. 44** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco **Y 45** de su Reglamento se invita a participar en el procedimiento de contratación por la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA de carácter estatal sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se celebrarán en las oficinas del Departamento de Licitaciones de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en la Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACION DIRECTA No.: JM-DOOTSM-047-2021

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
OP33-089.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD REFORMA 1ra SECCIÓN (TRAMO TERESILA)

UBICACIÓN:
028 R/A. REFORMA 1RA. SECCIÓN

Licitación No.	Limite para aceptar o declinar invitación	Visita al sitio de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación y apertura de propuesta	Plazo de Ejecución 20 DÍAS		Capital contable mínimo acreditado
					Inicio	Terminación	
JM-DOOTSM-047-2021	3 de mayo de 2021	3 de mayo de 2021 12:00 HRS	4 de mayo de 2021 12:00 HRS	13 de mayo de 2021 12:00 HRS	1 de junio de 2021	20 de junio de 2021	\$ 72,350.71

Contar con registro vigente el Padrón de contratista del Estado de Tabasco; la especialidad solicitada será: **120**

Recepción de Propuestas y Apertura de Sobres: La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la oficina que ocupa el área de licitaciones de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en la Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco.

Visita de Obra: Los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el lugar que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de ejecución de los trabajos.

Junta de Aclaraciones: Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Recibido Documento:
26 / Abril de 2021 Saul Jimenez Mendez

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez. Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



¡Gobierno de Unidad con Base para todos!

Los recursos para la celebración de los trabajos descritos corresponden al **RAMO 33 FONDO III 2021**

De acuerdo al artículo 47 fracción IV de la ley, en caso de aceptar participar se deberá manifestar por escrito a la persona que signa la presente invitación a más tardar el día señalado y quedará obligado a presentar propuesta, en el entendido que si no lo hace, la contraloría inhabilitará por noventa días naturales para participar en procesos de contratación por invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, a contratista que habiendo aceptado participar por escrito no presenten propuesta, lo anterior en concordancia con lo asentado en el artículo 47 fracción IV de la ley. La fecha de inicio de inhabilitación, será la de la presentación y entrega de propuestas.

Se le solicita acudir de 08:00 a.m. a 15:00 p.m. de lunes a viernes en el área de licitaciones de la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales en Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, de este municipio, con su carta de aceptación para que le sean proporcionados las bases de la licitación y sus anexos.

Las bases tendrán un costo de **\$0.00**

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrá ser negociada.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

No podrá participar persona física o jurídico colectiva que no se encuentre inscrita o en proceso de inscripción en el Padrón de Contratista del Estado de Tabasco.

Al licitante ganador se le otorgará anticipo del 0%.

El acto de apertura de propuesta se llevará a cabo de manera, interna, por lo cual deberá entregar su propuesta en un sobre cerrado de manera inviolable que contendrá por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica,

El Fallo: Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día 21 de mayo de 2021 a las 12:00 HRS

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C. Pedro Magaña Cerino
Presidente del Comité de Obra

c.c.p. Archivo.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



DEPENDENCIA
OFICIO No.

OBRAS PÚBLICAS.
DOOTSM/DL/227/21

Jalpa de Méndez, Tabasco a 26 de abril de 2021.

JORGE CORDOVA GONZALEZ
ANDADOR EUCALIPTO MANZANA.11 LOTE 22
COL. FOVISSSTE C.P. 86599
CARDENAS, TABASCO

AT'N: JORGE CORDOVA GONZALEZ
ADMINISTRADOR UNICO

El H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, a través del comité de obra pública municipal, conforme a lo establecido en el **Art. 44** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco **Y 45** de su Reglamento se invita a participar en el procedimiento de contratación por la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA de carácter estatal sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se celebrarán en las oficinas del Departamento de Licitaciones de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en la Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACION DIRECTA No.: JM-DOOTSM-047-2021

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
OP33-089.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD REFORMA 1ra SECCIÓN (TRAMO TERESILA)

UBICACIÓN:
028 R/A. REFORMA 1RA. SECCIÓN

Licitación No.	Limite para aceptar o declinar invitación	Visita al sitio de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación y apertura de propuesta	Plazo de Ejecución 20 DÍAS		Capital contable mínimo acreditado
					Inicio	Terminación	
JM-DOOTSM-047-2021	3 de mayo de 2021	3 de mayo de 2021 12:00 HRS	4 de mayo de 2021 12:00 HRS	13 de mayo de 2021 12:00 HRS	1 de junio de 2021	20 de junio de 2021	\$ 72,350.71

Contar con registro vigente el Padrón de contratista del Estado de Tabasco; la especialidad solicitada será: **120**

Recepción de Propuestas y Apertura de Sobres: La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la oficina que ocupa el área de licitaciones de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en la Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco.

Visita de Obra: Los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el lugar que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de ejecución de los trabajos.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez. Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



Junta de Aclaraciones: Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Los recursos para la celebración de los trabajos descritos corresponden al **RAMO 33 FONDO III 2021**

De acuerdo al artículo 47 fracción IV de la ley, en caso de aceptar participar se deberá manifestar por escrito a la persona que signa la presente invitación a más tardar el día señalado y quedará obligado a presentar propuesta, en el entendido que si no lo hace, la contraloría inhabilitará por noventa días naturales para participar en procesos de contratación por invitación a cuando menos cinco personas y adjudicación directa, a contratista que habiendo aceptado participar por escrito no presenten propuesta, no anterior en concordancia con lo asentado en el artículo 47 fracción IV de la ley. La fecha de inicio de inhabilitación, será la de la presentación y entrega de propuestas.

Se le solicita acudir de 08:00 a.m. a 15:00 p.m. de lunes a viernes en el área de licitaciones de la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales en Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, de este municipio, con su carta de aceptación para que le sean proporcionados las bases de la licitación y sus anexos.

Las bases tendrán un costo de **\$0.00**

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrá ser negociada.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

No podrá participar persona física o jurídico colectiva que no se encuentre inscrita o en proceso de inscripción en el Padrón de Contratista del Estado de Tabasco.

Al licitante ganador se le otorgará anticipo 0%.

El acto de apertura de propuesta se llevará a cabo de manera, interna, por lo cual deberá entregar su propuesta en un sobre cerrado de manera inviolable que contendrá por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica,

El Fallo: Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día 21 de mayo de 2021 a las 12:00 HRS

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

C. Pedro Magaña Cerino
Presidente del Comité de Obra

c.c.p. Archivo.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018-2021

"2021, Año de la Independencia"



DEPENDENCIA
OFICIO No.

OBRAS PÚBLICAS.
DOOTSM/DL/233/21

Jalpa de Méndez, Tabasco a 26 de abril de 2021.

CESAR GERARDO BURELO BURELO
CALLE PRINCIPAL MANZANA 7, LT 5, CASA 01 COL. GOBERNADORES (FRACC. LA QUINTA)
COMALCALCO, TABASCO

AT'N: ING. CESAR GERARDO BURELO BURELO
ADMINISTRADOR UNICO

El H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, a través del comité de obra pública municipal, conforme a lo establecido en el **Art. 44** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco **Y 45** de su Reglamento se invita a participar en el procedimiento de contratación por la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA de carácter estatal sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se celebrarán en las oficinas del Departamento de Licitaciones de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en la Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACION DIRECTA No.: JM-DOOTSM-047-2021

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

OP33-089.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD REFORMA 1ra SECCIÓN (TRAMO TERESILA)

UBICACIÓN:

028 R/A. REFORMA 1RA. SECCIÓN

Licitación No.	Limite para aceptar o declinar invitación	Visita al sitio de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación y apertura de propuesta	Plazo de Ejecución 20 DÍAS		Capital contable mínimo acreditado
					Inicio	Terminación	
JM-DOOTSM-047-2021	3 de mayo de 2021	3 de mayo de 2021 12:00 HRS	4 de mayo de 2021 12:00 HRS	13 de mayo de 2021 12:00 HRS	1 de junio de 2021	20 de junio de 2021	\$ 72,350.71

Contar con registro vigente el Padrón de contratista del Estado de Tabasco; la especialidad solicitada será: **120**

Recepción de Propuestas y Apertura de Sobres: La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la oficina que ocupa el área de licitaciones de la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales con dirección en la Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, C. P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco.

Visita de Obra: Los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el lugar que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de ejecución de los trabajos.

Junta de Aclaraciones: Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Los recursos para la celebración de los trabajos descritos corresponden al **RAMO 33 FONDO III 2021**

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



De acuerdo al artículo 47 fracción IV de la ley, en caso de aceptar participar se deberá manifestar por escrito a la persona que signa la presente invitación a más tardar el día señalado y quedará obligado a presentar propuesta, en el entendido que si no lo hace, la contraloría inhabilitará por noventa días naturales para participar en procesos de contratación por invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, a contratista que habiendo aceptado participar por escrito no presenten propuesta, lo anterior en concordancia con lo asentado en el artículo 47 fracción IV de la ley. La fecha de inicio de inhabilitación, será la de la presentación y entrega de propuestas.

Se le solicita acudir de 08:00 a.m. a 15:00 p.m. de lunes a viernes en el área de licitaciones de la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales en Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, de este municipio, con su carta de aceptación para que le sean proporcionados las bases de la licitación y sus anexos.

Las bases tendrán un costo de **\$0.00**

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrá ser negociada.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

No podrá participar persona física o jurídica colectiva que no se encuentre inscrita o en proceso de inscripción en el Padrón de Contratista del Estado de Tabasco.

Al licitante ganador se le otorgará anticipo 0%.

El acto de apertura de propuesta se llevará a cabo de manera interna, por lo cual deberá entregar su propuesta en un sobre cerrado de manera inviolable que contendrá por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica,

El Fallo: Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día 21 de mayo de 2021 a las 12:00 HRS

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C. Pedro Magaña Cerino.
Presidente del Comité de Obra

c.c.p. Archivo.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

CESAR GERARDO BURELO BURELO

CARTA DE ACEPTACION A LA LICITACION

JALPA DE MENDEZ, TAB. A 28 DE ABRIL DE 2021

**C. PEDRO CERINO MAGAÑA
PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA
MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
P R E S E N T E.**


A TRAVES DE LA PRESENTE LE MANIFIESTO QUE ACEPTAMOS LA INVITACION REFERENTE A LA LICITACION No JM-DOOTSM-047-2021 Y QUE ESTAREMOS A LA FECHA Y HORA CITADAS PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR NOS DESPEDIMOS DE USTED, QUEDANDO A SUS APRECIABLES ORDENES.


OBRA: OP33-089.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD REFORMA 1RA SECCIÓN (TRAMO TERESILA)
UBICACIÓN: 028 REFORMA 1RA. SECCIÓN

ATENTAMENTE


C. CESAR GERARDO BURELO BURELO
ADMINISTRADOR UNICO



CALLE PRINCIPAL MANZANA 7, LT 5, CASA 01, COL. GOBERNADORES (FRACC. LA QUINTA)
COMALCALCO, TABASCO. C.P.86670. CEL.: 914-1252786 OFICINA: 933-3342986,
R.F.C.: BUBC740819BKA



JORGE CORDOVA GONZALEZ

RFC. COGJ841210CL6

INGENIERIA & CONSTRUCCION

CARTA DE ACEPTACION

JALPA DE MENEZ, TAB. A 29 DE ABRIL DE 2021.

Licitación No.: JM-DOOTSM-047-2021

Obra: OP33-089.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD REFORMA 1RA SECCIÓN (TRAMO TERESILA)

Ubicación: 028 REFORMA 1RA. SECCIÓN

POR MEDIO DEL PRESENTE COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **JORGE CORDOVA GONZALEZ** LE COMUNICAMOS QUE ACEPTAMOS PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN JM-DOOTSM-047-2021.

SIN MAS POR EL MOMENTO, NOS DESPEDIMOS DE USTED, QUEDANDO A SUS APRECIABLES ORDENES.


ATENTAMENTE



C. JORGE CORDOVA GONZALEZ
ADMINISTRACION UNICO

Recibi 29/04/21

[Signature]



AULIS Y ASOCIADOS S.A DE C.V
RFC. AAS130102F23

Construcción de Obra Civil, Renta de Maquinaria Pesada
Autotransporte de Carga, Compra y Venta de Materiales para Construcción

JALPA DE MENDEZ, TABASCO A 28 DE ABRIL DE 2021

C. PEDRO MAGAÑA CERINO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA
P R E S E N T E

POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFESTAMOS A USTED NUESTRA PARTICIPACION A LA LICITACION No. JM-
DOOTSM-047-2021 REFERENTE A LA OBRA:


OP33-089.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD REFORMA
1ra SECCIÓN (TRAMO TERESILA)


UBICADO EN:

028 REFORMA 1RA. SECCIÓN

SIN MAS POR EL MOMENTO, ME DESPIDO DE USTED, ENVIANDOLE UN CARDIAL SALUDO.

Atentamente


LIC. SAUL JIMENEZ MENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



ACTA DE VISITA AL SITIO DE OBRA

LICITACION No.: JM-DOOTSM-047-2021

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

OP33-089.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD REFORMA 1ra SECCIÓN (TRAMO TERESILA).

UBICACIÓN:

028 R/A. REFORMA 1RA. SECCIÓN

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 3 de mayo de 2021, HORA Y DIA FIJADOS PARA LLEVAR ACABO LA VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS INHERENTES A LA OBRA CUYOS DATOS SE ASIENTAN EN EL ENCABEZADO, SE REUNIERON EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, UBICADO EN LA CALLE PLAZA HIDALGO No. 1, COL. CENTRO, C.P.86200, JALPA DE MENDEZ, TABASCO: LOS CONTRATISTAS Y REPRESENTANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE.

ACTO SEGUIDO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 37 FRACC. XVI DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y ARTICULO 22 DE SU REGLAMENTO, EL SUPERVISOR ING. ISIDRO JIMENEZ MENDEZ, REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA, MOSTRO A LOS PARTICIPANTES EL LUGAR, EXPLICANDO LA FORMA EN QUE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS Y EXPONINDO LOS DETALLES, CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES, QUE LOS LICITANTES DEBERÁN TOMAR EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS.

A CONTINUACIÓN DECLARAN LOS LICITANTES QUE VERIFICARON LAS CONDICIONES TOPOGRÁFICAS, GENERALES Y ESPECIALES DEL LUGAR, LAS CUALES REGISTRÁN EN LOS CRITERIOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA VISITA DE OBRA, EL DIA 3 de mayo de 2021, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ESTA INTERVIENEN PARA SU CONSTANCIA.

POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS E INVITADOS.

ING. ISIDRO JIMENEZ MENDEZ
SUPERVISOR DE OBRAS DE LA DOOTSM

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE



Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



CONTRATISTAS PRESENTES EN EL ACTO

EMPRESA CONTRATISTA	REPRESENTANTE	FIRMA
AULIS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	LIC. SAUL JIMENEZ MENDEZ	
JORGE CORDOVA GONZALEZ	JORGE CORDOVA GONZALEZ	
CESAR GERARDO BURELO BURELO	ING. CESAR GERARDO BURELO BURELO	

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION No.: JM-DOOTSM-047-2021

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

DP33-089.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD REFORMA 1ra SECCIÓN (TRAMO TERESILA).

UBICACIÓN:

028 R/A. REFORMA 1RA. SECCIÓN

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 4 de mayo de 2021, HORA Y DIA FIJADOS PARA ACLARACIONES DE DUDAS INHERENTES A LA OBRA CUYOS DATOS SE ASIENTAN EN EL ENCABEZADO, SE REUNIERON EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, UBICADO EN LA CALLE PLAZA HIDALGO No. 1, COL. CENTRO, C.P. 86200, JALPA DE MENDEZ, TABASCO; LOS CONTRATISTAS Y REPRESENTANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE.

DANDO RESPUESTAS A LAS DUDAS PLANTEADAS POR LAS EMPRESAS CONCURSANTES, PARA CONSTANCIA Y FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE COMPETEN, EN LA CUAL SEGUIDAMENTE SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y RESPUESTAS.

NO SE REALIZARON PREGUNTAS

EL AYUNTAMIENTO DECLARA QUE EL TABLERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, DEBERAN SER CONSIDERADOS DENTRO DE LOS COSTOS INDIRECTOS

NO HABIENDO MAS PREGUNTAS INHERENTES A LA OBRA EN CUESTIÓN, SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS SIENDO LAS 13:00 HRS DEL DIA 4 de mayo de 2021, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ESTA INTERVIENEN PARA SU CONSTANCIA.

REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO.

ING. ISIDRO JIMÉNEZ MENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE




Jalpa de Méndez, Tabasco.


2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



CONTRATISTAS PRESENTES EN EL ACTO

EMPRESA CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
AULIS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	LIC. SAUL JIMENEZ MENDEZ	
JORGE CORDOVA GONZALEZ	JORGE CORDOVA GONZALEZ	
CESAR GERARDO BURELO BURELO	ING. CESAR GERARDO BURELO BURELO	



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS

LICITACION No. JM-DOOTSM-047-2021

OBRA:

OP33-089.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD REFORMA 1ra SECCIÓN (TRAMO TERESILA).

UBICACION.-

028 R/A. REFORMA 1RA. SECCIÓN

En la ciudad de Jalpa de Méndez del Municipio de Jalpa de Méndez, Estado de Tabasco, siendo **12:00 HRS** Del día **13 de mayo de 2021** de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 Y 41 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, se reunieron en: Las oficinas de Licitaciones de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, cita en: en la calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco; los servidores publicos, los representantes de las dependencias invitadas, así como los representantes de los licitantes, cuyos nombres figuran al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo la apertura de proposiciones técnica y económicas relativa a la licitación arriba indicada, presidiendo este acto el C. ING. JOSE CONCEPCION VAZQUEZ VENTURA. Encargado del área de licitaciones en representación del ING. SERGIO A. HERNANDEZ PORTILLA, Director de obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, el cual presidió a la recepción de las proposiciones de las siguientes empresas:

- 1.- AULIS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**
- 2.- JORGE CORDOVA GONZALEZ**
- 3.- CESAR GERARDO BURELO BURELO**

Acto seguido se dio lectura al dictamen técnico cuyo resultado consiste en lo siguiente:

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



De acuerdo al artículo 41 de la ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco se establece que:

- A).- Se reviso primeramente la propuesta Tecnica
- b).- Se desecho las propuestas que omitieron alguna documentación solicitada en el pliego de requisitos exigidos en las bases de licitación.
- c).- Se devolverá al licitante las propuestas desechadas en un plazo de 15 dias.
- d).- Toda la documentación será recibida para su revisión detallada.

Observaciones: NINGUNA

Todas las propuestas restantes cumplieron con los requisitos solicitados en las bases, por lo que son legal y tecnicamente solventes.

Una vez concluida la lectura del dictamen tecnico, se procedio a la apertura de los sobres que contienen las propuestas economicas de los licitantes que resultaron solventes legal y tecnicamente, y se verifico cuantitativamente que las mismas contuvieran los documentos solicitados

Propuestas economicas desechadas en la revision cuantitativa:

Licitante: NINGUNO

Causas:

Propuestas economicas aceptadas para su analisis cualitativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 40 y 41 De La Ley De Obras Publicas Y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco:

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez. Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



Gobierno de Unidad con Esperanza por todos!

EMPRESAS:	PROPUESTAS SIN INC. I.V.A.
1. AULIS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$102,834.56
2. JORGE CORDOVA GONZALEZ	\$102,937.44
3. CESAR GERARDO BURELO BURELO	\$103,939.96

Acto seguido el Coordinador de licitaciones procedio a dar lectura en voz alta a los montos totales de cada una de las proposiciones admitidas, los servidores publicos y representantes de los proponentes rubricaron el catalogo de conceptos en el que se consignan los precios y el importe total de los trabajos objeto de esta licitacion, en cumplimiento al articulo 41 y 42 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, se informa a los presentes que el día **21 de mayo de 2021** a las **12:00 HRS** se dara a conocer en este mismo lugar el fallo de esta licitacion.

No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminado el acto a las **13:00 HRS**, del mismo día de su inicio, del cual se levanta la presente acta, que fue leida a los presentes, quienes proceden a firmar de conformidad, al calce y al margen de la misma, para dar fe de su legalidad conforme a lo establecido en el articulo 41 Y 42 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



POR LOS SERVIDORES PUBLICOS

ING. JOSE CONCEPCION VAZQUEZ VENTURA
ENCARGADO DEL AREA DE LICITACIONES

POR LOS LICITANTES:

EMPRESAS:	FIRMA:
AULIS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	LIC. SAUL JIMENEZ MENDEZ
JORGE CORDOVA GONZALEZ	JORGE CORDOVA GONZALEZ
CESAR GERARDO BURELO BURELO	ING. CESAR GERARDO BURELO BURELO

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.




LICITACION: JM-DOOTSM-047-2021
 OBRA: OP93-089.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 1ra SECCION (TRAMO TERESILA)
 UBICACIÓN: 028 R/A. REFORMA 1RA. SECCION

Carretera de Unidad con Ejecución de Obras Locales

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				AULSY Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.				JORGE CORDOVA GONZALEZ				CESAR GERARDO BURELO BURELO			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
A	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN REFORMA 1RA TRAMO TERESILA																	
1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJS, NIVELES, REFERENCIAS, INC., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	M2	210	\$ 4.80	\$ 1,008.00	0.970%	\$ 4.77	\$ 1,001.70	-1%	\$ 4.70	\$ 987.00	-2%	\$ 4.99	\$ 1,047.90	4%			1.098%
1.2	EXCAVACION EN CORTE DE MATERIAL TIPO B CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA 2 KM, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M3	42	\$ 193.96	\$ 8,146.32	7.837%	\$ 194.09	\$ 8,151.78	0%	\$ 185.25	\$ 7,780.50	-4%	\$ 192.56	\$ 8,097.52	-1%			7.781%
1.3	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, COMPACTADO, CON MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 10 CM, INCLUYE AGUA, ACARREO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M3	79.5	\$ 271.56	\$ 21,600.16	19.413%	\$ 271.25	\$ 19,906.88	-1%	\$ 270.21	\$ 20,980.94	0%	\$ 275.36	\$ 20,230.96	0%			19.417%
1.4	RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIAL DE DESCHO CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DEL MATERIAL FUERA HASTA 2 KM	M3	0	\$ 65.48	\$ -	0.000%	\$ 65.33	\$ -	0%	\$ 61.50	\$ -	-6%	\$ 62.36	\$ -	-5%			0.000%
1.5	CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15/20/40 CM ARMADO CON CADEVA TIPO ARHEX 15/20/4 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=200KG/M2, INCLUYE: CUBIERTA METALICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	150	\$ 277.25	\$ 41,587.50	40.066%	\$ 274.11	\$ 41,116.50	-1%	\$ 275.87	\$ 41,380.50	0%	\$ 273.26	\$ 40,989.00	-1%			39.435%
1.5	ELABORACION DE RAMPA PARA PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=150KG/M2 DE 3 CM DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDAD 6X6-10/10, CON ACABADO INTEGRAL ESCOBILLADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	5.2	\$ 245.63	\$ 1,282.48	1.224%	\$ 243.55	\$ 1,266.46	-1%	\$ 247.23	\$ 1,295.60	0%	\$ 239.41	\$ 1,244.93	-3%			1.196%
1.7	BANQUETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=200KG/M2 DE 10 CM DE ESPESOR COLADO EN PLACAS DE 1.5X3.00 MTS CON ACABADO INTEGRAL ESCOBILLADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	172.5	\$ 175.04	\$ 30,194.40	28.046%	\$ 172.81	\$ 29,809.73	-1%	\$ 173.21	\$ 29,975.73	-1%	\$ 173.33	\$ 29,992.43	-1%			28.766%
1.8	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DEBIDO A LA CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	5	\$ 156.00	\$ 784.65	0.756%	\$ 156.49	\$ 782.45	0%	\$ 157.01	\$ 785.05	0%	\$ 152.36	\$ 761.80	-3%			0.763%
1.9	DEVOLUCION DE BANQUETAS EXISTENTES EN EL AREA CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, REZAGO DE PRODUCTO DE DEMOLICION.	M2	0	\$ 18.00	\$ -	0.000%	\$ 18.04	\$ -	0%	\$ 18.95	\$ -	5%	\$ 17.95	\$ -	0%			0.000%

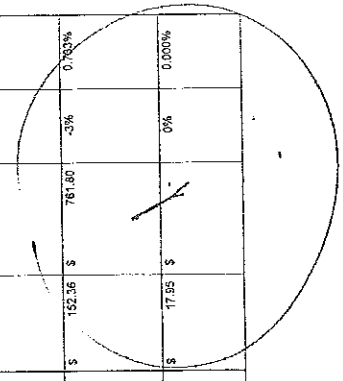

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TAMBASCO.



LICITACION: JM-DOOTSM-047-2021
 OBRA: 0F33-089.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 1ra SECCION (TRAMO TERESILA)
 UBICACION: 028 R/A. REFORMA 1RA. SECCION

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			AULYS Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.			JORGE CORDOVA GONZALEZ			CESAR GERARDO BURELO BURELO				
			CANTIDAD	P.U	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE
1.1	PERSONAS EN RAMPA PARA ROTULO EN RAMPA PARA PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES SEGUN DIBERNO AUTORIZADO EN LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA HABITAT. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. MEDIDA APROXIMADA DE 1.00 M. DE ALTO.	PZA	2	\$ 384.33	\$ 768.66	0.739%	\$ 364.53	\$ 729.06	0%	\$ 379.55	\$ 759.12	-1%	\$ 835.21	\$ 1,670.42	117%	1,507%

SUB-TOTAL: \$ 103,952.17
 IVA: \$ 16,632.35
 TOTAL: \$ 120,584.52

\$ 102,937.44
 \$ 16,469.99
 \$ 119,407.43

\$ 103,939.99
 \$ 16,630.39
 \$ 120,570.38

DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA

ING. JOSE CONCEPCION VAZQUEZ VENTURA

Trámites de Unidad con Español y en Español

**DICTAMEN TÉCNICO
PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE LA OBRA PÚBLICA**

LICITACION No. JM-DOOTSM-047-2021

OP33-089.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD REFORMA 1ra SECCIÓN (TRAMO TERESILA).

LOCALIDAD:

028 R/A. REFORMA 1RA. SECCIÓN.

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, siendo las **12:00 HRS** del día **17 de mayo de 2021**, y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 39, de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y, 37 y 38 de su Reglamento, el C. **ING. JOSE CONCEPCION VAZQUEZ VENTURA**, con Ced. Prof. **7370581**, proporciona el dictamen correspondiente en base a lo siguiente.

I).- Los criterios utilizados para la evaluación de las propuestas fueron los siguientes:

a).- El día 26 de abril de 2021, se enviaron Invitaciones a Concurso para participar en este acto a las siguientes empresas:

1. AULIS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
2. JORGE CORDOVA GONZALEZ
3. CESAR GERARDO BURELO BURELO

b).- Aceptando su participación las siguientes empresas:

1. AULIS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	28/04/2021
2. JORGE CORDOVA GONZALEZ	29/04/2021
3. CESAR GERARDO BURELO BURELO	28/04/2021

c).- Se llevó a cabo la Visita de Obra el día 3 de mayo de 2021 a las 12:00 HRS y la Junta de Aclaraciones a las 12:00 HRS Del mismo día, a las cuales asistieron las siguientes empresas:

1. AULIS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	3 DE MAYO DE 2021
2. JORGE CORDOVA GONZALEZ	3 DE MAYO DE 2021
3. CESAR GERARDO BURELO BURELO	3 DE MAYO DE 2021

II).- Las propuestas se analizaron en forma cuantitativa el día 13 de mayo de 2021, día de la recepción, Apertura Técnica y Económica de las propuestas en la cual solo basto

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez. Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



con la presentación de los documentos solicitados en las bases de licitación de acuerdo al Artículo 29 del Reglamento.

No.	Nombre de la empresa.	Monto Ofertado Sin Inc. IVA	Situación de la Propuesta
1	AULIS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$102,834.56	ACEPTADA
2	JORGE CORDOVA GONZALEZ	\$102,937.44	ACEPTADA
3	CESAR GERARDO BURELO BURELO	\$103,939.96	ACEPTADA

III).- Razones Legales, Técnicas y Económicas por las cuales se desechan las propuestas presentadas por los licitantes de acuerdo a los artículos 34 y 35 del Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No.	Nombre de la empresa.	Monto Ofertado Sin Inc. IVA	Situación de la Propuesta
1	AULIS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$102,834.56	ACEPTADA
2	JORGE CORDOVA GONZALEZ	\$102,937.44	ACEPTADA
3	CESAR GERARDO BURELO BURELO	\$103,939.96	ACEPTADA

IV).- Relación de los licitantes cuyas propuestas cumplieron con los requerimientos exigidos por la evaluación ubicados del mayor al menor de acuerdo a los montos revisados y corregidos, de acuerdo al artículo 36 del Reglamento.

No.	Nombre de la empresa.	Monto Ofertado Sin Inc. IVA	Situación de la Propuesta
1.	AULIS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$102,834.56	SE CONSIDERA SOLVENTE
2.	JORGE CORDOVA GONZALEZ	\$102,937.44	SE CONSIDERA SOLVENTE
3.	CESAR GERARDO BURELO BURELO	\$103,939.96	SE CONSIDERA SOLVENTE

PRESUPUESTO BASE: \$103,952.17 SIN I. V. A.

RANGO DE EVALUACIÓN:

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez. Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



a).- Propuesta Mayor	\$	103,939.96
b).- Propuesta Menor	\$	102,834.56
Diferencia	\$	1,105.40

De donde (1) *(\$ 103,939.96)/10= \$ 10,394.00

De donde: \$ 1,105.40 < \$ 10,394.00

Cumplíndose la condición


CONDICIÓN: SE CUMPLE CONDICIÓN I (Del artículo 36 del RLOPSRM del Estado de Tabasco)

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

Nombre de la empresa.	Monto ofertado: Sin Inc. IVA	Situación de la Propuesta
AULIS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$102,834.56	Se Adjudica ya que esta es la propuesta solvente cuyo monto es el más bajo.
JORGE CORDOVA GONZALEZ	\$102,937.44	Se considera solvente.
CESAR GERARDO BURELO BURELO	\$103,939.96	Se considera solvente.

Siendo las 13:00 HRS del mismo día de su inicio se da por terminada la presente firmando en ella los que intervinieron.

DICTAMINO:


ING. JOSE CONCEPCION VAZQUEZ VENTURA
CED. PROF. 7370581

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION

LICITACION No.: JM-DOOTSM-047-2021.

OBRA:

OP33-089.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD REFORMA 1RA SECCIÓN (TRAMO TERESILA).

LOCALIDAD:

028 R/A. REFORMA 1RA. SECCIÓN

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TAB., SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 21 de mayo de 2021, DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO DE APERTURA ECONOMICA CELEBRADO EL DIA 13 de mayo de 2021, PARA CONOCER EL FALLO QUE EMITE EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TAB., SE REUNIERON EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL AREA DE LICITACIONES DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES CITO EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ S/N, BARRIO SAN LUIS DE ESTE MUNICIPIO, LOS SERVIDORES PUBLICOS Y LICITANTES, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA Y EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 42 JUNTO CON TODOS SUS PÁRRAFOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

ACTO SEGUIDO SE DIO LECTURA AL DICTAMEN ECONÓMICO, CUYO RESULTADO CONSISTE EN LO SIGUIENTE:

LAS PROPUESTAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES, POR LO QUE SON LEGAL, TECNICA Y ECONOMICAMENTE SOLVENTES.

UNA VEZ CONCLUÍDA LA LECTURA DEL DICTAMEN ANTES CITADO, EL C. **ING. JOSE CONCEPCION VAZQUEZ VENTURA**, EN PRESENCIA DE LOS DEMAS SERVIDORES PUBLICOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA, LICITANTES E INVITADOS, COMUNICA EL FALLO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE LA OBRA DE REFERENCIA MOTIVO DE ESTA LICITACION A FAVOR DE LA EMPRESA

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



CONTRATISTA: AULIS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., CON UN IMPORTE DE: \$119,288.09 (CIENTO DIECINUEVE MIL DOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N.)

INCLUYE EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A), CON FECHA DE INICIO **1 de junio de 2021** Y UN PLAZO DE EJECUCION DE **20 DIAS CALENDARIO**, YA QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS DE LAS BASES DE ESTA LICITACION, Y EN CONSECUENCIA SE LE ADJUDICA EL CONTRATO RELATIVO A LA OBRA ANTES MENCIONADA.


LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTO DE NOTIFICACION PARA EL LICITANTE ADJUDICADO, COMUNICANDOLE QUE LA FIRMA DEL CONTRATO No. **CONT-DOOTSM-JM-047/2021** QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA **26 de mayo de 2021 A LAS 12:00 HRS** EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES Y QUE DEBERA PRESENTAR EN EL MISMO LUGAR LA GARANTIA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RESPECTIVAMENTE, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE ESTE FALLO.

EL ANTICIPO SERA ENTREGADO EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES.

SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA A LAS 13:00 HRS DEL MISMO DIA DE SU INICIO PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, FIRMAN DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

POR LA DEPENDENCIA:

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**


**ING. SERGIO A. HERNANDEZ PORTILLA
DIR. DE OBRAS, ORD. TERR.
Y SERV. MPALES.**


**ING. JOSE C. VAZQUEZ VENTIRA
ENCARGADO DE LICITACIONES**

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE




Jalpa de Méndez, Tabasco.


2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



POR LOS LICITANTES:

EMPRESAS:	FIRMA:
AULIS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	
JORGE CORDOVA GONZALEZ	
CESAR GERARDO BURELO BURELO	



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JALPA DE MENDEZ TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez, Tabasco 2018-2021

"2021: Año de la Independencia"



JALPA de Méndez H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: OP33-089.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD REFORMA 1ra SECCIÓN (TRAMO TERESILA)
REHABILITACION: 169.-CONSTRUCCIÓN Y CONSERV. DE CARRETERAS, CAMINOS VECINALES Y DEMÁS VÍAS DE COMUNICACIÓN. K005.- URBANIZACION

LOCALIZACION: 028 R/A. REFORMA 1RA. SECCIÓN
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 028 R/A. REFORMA 1RA. SECCIÓN
BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: (X) EN PROCESO: () AMPLIACION: ()
REHABILITACION: () COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA SE INICIA CON LA LIMPIEZA , TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EXISTENTE PARA LUEGO REALIZAR EXCAVACIONES PARA ALOJAR ESTRUCTURA DE CIMENTACIONES COMO GUARNICIONES DE TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM ARMADA, BANQUETA DE CONCRETO CON ESPESOR DE 8 CM. Y ACABADADO ESCOBILLADO, FINALMENTE SE DEJARAN RAMPAS PARA DISCAPACIDAD ROTULANDO EL AREA CONSTRUIDA.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 406 HABITANTES

FECHA DE ELABORACION: 1 de febrero de 2021

PROYECTO: OP33-089.-



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez, Tabasco
2018-2021

"2021: Año de la Independencia"

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales



JALPA
de Méndez
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: _____

OP33-089.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD REFORMA 1ra SECCIÓN (TRAMO TERESILA)

PROYECTOS DE INVERSION

169.-CONSTRUCCIÓN Y CONSERV. DE CARRETERAS, CAMINOS VECINALES Y DEMÁS VÍAS DE COMUNICACIÓN

K005.- URBANIZACION

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA SE INICIA CON LA LIMPIEZA , TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EXISTENTE PARA LUEGO REALIZAR EXCAVACIONES PARA ALOJAR ESTRUCTURA DE CIMENTACIONES COMO GUARNICIONES DE TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM ARMADA, BANQUETA DE CONCRETO CON ESPESOR DE 8 CM. Y ACABADADO ESCOBILLADO, FINALMENTE SE DEJARAN RAMPAS PARA DISCAPACIDAD ROTULANDO EL AREA CONSTRUIDA.

028 R/A. REFORMA 1RA. SECCIÓN

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


POR LA DEPENDENCIA ENTIDAD EJECUTORA

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 1 de febrero de 2021

INFORMACION ADICIONAL: _____



Jalpa de Méndez, Tabasco, a; 01 de febrero de 2021

Folio No.: DPADS/220/2021

Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental.

Ing. Sergio Alberto Hernández Portilla.

Director de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales.

H. Ayuntamiento De Jalpa de Méndez, Tab.

Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 113,114,115,116 del capítulo 12 de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 22 de diciembre de 2012 y artículos 32,33, inciso A,B,C,D,K,L, artículo 34 y 35 del reglamento de protección ambiental y desarrollo sustentable del municipio de Jalpa de Méndez del 26 de octubre de 2019 Se concede ejecutar la obra **OP33-089 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 1RA SECCION (TRAMO TERESILA)**, a ejecutarse en: **028 R/A. REFORMA 1RA SECCION**, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversión Autorizada
OP33-089	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 1RA SECCION (TRAMO TERESILA)	028 R/A. REFORMA 1RA SECCION	172.50M2	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 120,584.52

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. LUISA MERCEDES VERA LAZARO
DIRECTORA DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE

C.C.P. ARCHIVO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ , TABASCO
2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA

ESTANDO REUNIDOS EN LA LOCALIDAD: 028 R/A. REFORMA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO Y SIENDO LAS 09:00 HRS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021, SE ENCUENTRAN EL ING. HERNAN FRIAS OLAN, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO; EL C. LIC. SAUL JIMENEZ MENDEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA; AULIS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., PARA RECEPCIONAR LOS TRABAJOS FISICOS DE LA OBRA DENOMINADA: OP33-089.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 1ra SECCION (TRAMO TERESILA), DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS:

Código	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad
A	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN REFORMA 1RA. TRAMO (TERESILA)		
CLAVE	GUARNICIONES Y BANQUETAS		
1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES, NIVELES Y REFERENCIAS, INCL: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	210.00
1.2	EXCAVACION EN CORTE DE MATERIAL TIPO B CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA 2 KM, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	M3	42.00
1.3	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 10 CM, INCLUYE AGUA, ACARREO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HARRAMIENTAS.	M3	73.50
1.4	RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIAL DE DESECHO CON MEDIOS MECANICOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M3	
1.5	CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM ARMADO CON CADENA TIPO ARMEX 15X30-4 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=200KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA METALICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	150.00
1.6	ELABORACION DE RAMPA PARA PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=150KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDAD 6X6-10/10, CON ACABADO INTEGRAL ESCOBILLADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	3.84
1.7	BANQUETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=200KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR COLADO EN PLACAS DE 1.15x3.00 MTS CON ACABADO INTEGRAL ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	172.50
1.8	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARAS DE AGUA POTABLE, DEBIDO A LA CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	5.00
1.9	DEMOLICION DE BANQUETAS EXISTENTES EN EL AREA, CON MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, REZAGO DE PRODUCTO DE DEMOLICION.	M2	
1.10	ROTULO EN RAMPA PARA PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES, SEGUN DISEÑO AUTORIZADO EN LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA HABITAT, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIDA APROXIMADA DE 1.00 M. DE ALTO.	PZA	2.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ , TABASCO
2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA

DATOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	CONT-DOOTSM-JM-047/2021
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	01 DE JUNIO DEL 2021
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO:	20 DE JUNIO DEL 2021
FECHA DE TERMINACION DE AMPLIACION:	
PLAZO DE EJECUCION :	20 DIAS NATURALES
IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 120,584.52
IMPORTE CONTRATADO:	\$ 119,288.09
IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	\$ 118,903.86
FIANZAS	
No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	6378-01833-7
EMPRESA AFIANZADORA:	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA:	26 DE MAYO DE 2021
No. DE FIANZA DE ANTICIPO:	NA
EMPRESA AFIANZADORA:	NA
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA:	NA
No. DE FIANZA DE VICOS OCULTOS:	6378-01846-9
EMPRESA AFIANZADORA:	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA:	07 DE JULIO DE 2021
PERIODO DE EJECUCION	
FECHA REAL DE INICIO:	01 DE JUNIO DEL 2021
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	20 DE JUNIO DEL 2021
FECHA DE TERMINACION REAL:	20 DE JUNIO DEL 2021

RELACION DE ESTIMACIONES


ESTIMACIONES	IMPORTE CON IVA	AMORT. DEL ANTICIPO
ESTIMACION: 01 (UNO) UNICA DE TRABAJOS EJECUTADOS (FINIQUITO)	\$ 118,903.86	\$ -
	\$ 118,903.86	\$ -

LA CONTRATISTA ENTREGA A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ LO SIGUIENTE:

SE REALIZO EL RECORRIDO VERIFICANDO EL ESTADO FISICO DE LA OBRA MENCIONADA CONSTATANDOSE QUE TIENE UN AVANCE FISICO DE UN 100% POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA OBRA ESTA TERMINADA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MANIFIESTAN QUE EN LA ELABORACION DE LA MISMA NO EXISTE DOLO, LESION, MALA FE, ERROR NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCION QUE SEAN DERIVADA DE LO ANTERIOR Y QUE EL OBJETO DE LA MISMA, ES PARA DEJAR CONSTANCIA DE QUE LA OBRA ESTA TERMINADA CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

LEIDA QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO COMO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE TABASCO, Y SE FIRMAN EN ORIGINAL EN LA LOCALIDAD DE LA CIUDAD , COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, DEL ESTADO DE TABASCO A LOS 25 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIUNO.


 ING. HERNAN FRIAS OLAN
 RESIDENTE DE OBRA


 LIC. SAUL JIMENEZ MENDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

FONDO : RAMO 33 FONDO III 2021

RECURSOS: RAMO 33 FONDO III 2021

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD "CONTRATO"

26 DE JUNIO DEL 2021
 Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

PROYECTO: OP33-089 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 1ra SECCION (TRAMO TERESILA)

LOCALIDAD: 028.-R/A. REFORMA 1RA SECCION MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA: K005.- URBANIZACION SUB-PROGRAMA: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION.

MODALIDAD: CONTRATO INVERSIÓN PROGRAMADA (\$) : \$ 120,584.52

META: 172.50 PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 DIAS NATURALES
 INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 01 DE JUNIO DEL 2021

UNIDAD: M2 TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 20 DE JUNIO DEL 2021

POBLACIÓN BENEFICIADA: 300 Habitantes

DATOS DEL CONTRATO

LICITANTE: AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

R.F.C.: AAS-130102F23

DOMICILIO FISCAL: CALLE IGNACIO ZARAGOZA NO. 36 COL. CENTRO, JONUTA, TABASCO. C.P. 86780

CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-047/2021

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. SAUL JIMENEZ MENDEZ

SUPERINTENDENTE:

RESIDENTE DE OBRA

ING. JUAN CARLOS MORALES HERNANDEZ

ING. HERNAN FRIAS OLAM

FECHA DE CONTRATO: 26-may-2021

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 119,288.09

ANTICIPO: \$ -

IMPORTE DE AMPLIACION: _____

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 119,903.86

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 21-may-2021

INICIO DE OBRA (CONTRATO): 01 DE JUNIO DEL 2021

TERMINO DE OBRA (CONTRATO): 20 DE JUNIO DEL 2021

TERMINO DE OBRA REAL 20 DE JUNIO DEL 2021

(Handwritten signatures and stamps)



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ, TABASCO
2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

GARANTÍAS

FIANZA (ANTICIPO): NA IMPORTE: NA FECHA DE EXPEDICIÓN: NA
 AFIANZADORA: NA VIGENCIA: NA

FIANZA (CUMPLIMIENTO): 6378-01833-7 IMPORTE: \$ 11,928.81 FECHA DE EXPEDICIÓN: 26/05/2021
 AFIANZADORA: ASEGURDORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 1 AÑO 07/07/2021

FIANZA (VICIOS OCULTOS): 6378-01846-9 IMPORTE: \$ 11,890.39 FECHA DE EXPEDICIÓN:
 AFIANZADORA: ASEGURDORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 1 AÑO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

PROYECTO: OP33-089 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 1ra SECCION (TRAMO TERESILA)

LOCALIDAD: 028.-R/A. REFORMA 1RA SECCION

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

METAS ALCANZADAS: CANTIDAD: 172.50 UNIDAD: M2

PERIODO DE EJECUCION REAL: INICIO DE OBRA REAL: 01 DE JUNIO DEL 2021 TERMINO DE OBRA REAL: 20 DE JUNIO DEL 2021

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio	Fecha	Inversión (\$)
ACTA DE CABILDO No. 50, EXTRAORDINARIA BIS	4-feb-2021	\$ 120,584.52

MODIFICACION DE METAS

No. DE OFICIO	FECHA	METAS
---------------	-------	-------

INVERSIÓN EJERCIDA

ESTIMACIÓN No.	DE FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO	TOTAL DE DEDUCCIONES
ESTIMACIÓN: 1(UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS	24-jun-21	DEL	01 DE JUNIO DEL 2021	AL	20 DE JUNIO DEL 2021	\$ 118,903.86	\$ 118,903.86	\$ 717.53
TOTAL						\$ 118,903.86	TOTAL	\$ 717.53

IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$) : \$ 118,903.86
 IMPORTE DE DEDUCCIONES (\$) : \$ 717.53
 SALDO POR CANCELAR : \$ 384.23

[Handwritten signatures and stamps]

0-933-059



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ, TABASCO
2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE: QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDAS POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA CONTRATISTA EJECUTORA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA CON LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR MEDIO DE ESTA ACTA: LIC. SAUL JIMENEZ MENDEZ

HACE ENTREGA A: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

EN SERÁ EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA: [Signature]
EL CONTRATISTA: LIC. SAUL JIMENEZ MENDEZ

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
SUPERINTENDENTE [Signature]
ING. JUAN CARLOS MORALES HERNÁNDEZ

POR DEPENDENCIA (RECIBE DE CONFORMIDAD)

POR LA DOOTSM
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA
CARGO: RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA: ING. HERNAN FRIAS OLAN

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS:

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL
NOMBRE Y FIRMA: LIC. ROMEO LUGO DE LA FUENTE

POR LA COMUNIDAD
CARGO: DELEGADO MUNICIPAL
NOMBRE Y FIRMA: C. ARNULFO OLAN CHABLE

[Large handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

RECIBE DE CONFORMIDAD COMITÉ (X)

Presidente

Teresita Olan G.
TERESILA OLAN GARCIA

Secretario

Fredy Contreras Frias
FREDY CONTRERAS FRIAS

Tesorero

Vocal AUX 1

Mateo de la Cruz Garcia
MATEO DE LA CRUZ GARCIA

Vocal AUX 2

Janeth del Carmen May Badal
JANETH DEL CARMEN MAY BADAL

Vocal AUX 3

Manuela Contreras Olan
MANUELA CONTRERAS OLAN

POR LA COORDINACION DEL RAMO 33

Felipe Garcia Olan
LIC. FELIPE GARCIA OLAN



QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LA MISMA DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar:


Dependencia: _____
Cargo: _____
Razones: _____
Nombre y firma: _____

[Handwritten signatures]



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CONT-DOOTSM-JM-047/2021

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2021, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE JALPA DE MENDEZ, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO; ING. HERNAN FRIAS OLAN, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO, POR LA CONTRATISTA EL C. LIC. SAUL JIMENEZ MENDEZ REPRESENTANTE LEGAL DE AULIS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 138 DE SU REGLAMENTO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:


I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

No. DE CONTRATO:	CONT-DOOTSM-JM-047/2021
FECHA DE FORMALIZACION:	26-may-2021
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 1ra SECCION (TRAMO TERESILA)
MONTO AUTORIZADO:	\$ 120,584.52
MONTO CONTRATADO:	\$ 119,288.09
MONTO TOTAL EJERCIDO:	\$ 119,288.09
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	20 DIAS NATURALES
FECHA DE INCIO SEGÚN CONTRATO:	01 DE JUNIO DEL 2021
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	20 DE JUNIO DEL 2021
FECHA DE TERMINACION POR AMPLIACION:	

II.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ESTIMACIONES	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
		DEL		AL			
ESTIMACIÓN: 1(UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS	24-jun-21	DEL	01 DE JUNIO DEL 2021	AL	20 DE JUNIO DEL 2021	\$ 118,903.86	\$ 118,903.86





Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ, TABASCO
2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
CONT-DOOTSM-JM-047/2021

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO ESTE AYUNTAMIENTO Y EL CONTRATISTA DETERMINARON QUE EXISTEN:

I.- SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA Y PARA LIQUIDARLOS ELABORARON LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, MISMA QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLAUSULA RESPECTIVA DEL CONTRATO;

III.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. 6378-01846-9, EXPEDIDA POR AFIANZADORA AFIANZADORA INSURGENTE S.A. de C.V. PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRASCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL AYUNTAMIENTO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DEL PAGO.

POR SU PARTE LA EL C. LIC. SAUL JIMENEZ MENDEZ REPRESENTANTE LEGAL DE AULIS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL AYUNTAMIENTO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO CONT-DOOTSM-JM-047/2021, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ.

EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA
 DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

POR EL CONTRATISTA

ING. HERNAN FRIAS OLAN
 RESIDENTE DE OBRA

C. LIC. SAUL JIMENEZ MENDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL DE
 AULIS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No.
CONT-DOOTSM-JM-047/2021

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2021, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ UBICADAS PLAZA HIDALGO No.01 COL. CENTRO, JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO; **ING. HERNAN FRIAS OLAN**, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO, POR LA CONTRATISTA EL **C. LIC. SAUL JIMENEZ MENDEZ**, REPRESENTANTE LEGAL DE **AULIS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCOY 142 DE SU REGLAMENTO, PARA DAR POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACIÓN:

No. CONTRATO:	CONT-DOOTSM-JM-047/2021
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 1ra SECCION (TRAMO TERESILA)

LAS ESTIMACIONES DE LOS CONCEPTOS QUE ESTABAN PENDIENTES DE PAGO, MISMAS QUE YA FUERON APROBADAS Y PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

ESTIMACIONES	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACIÓN: 1 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS	24-jun-21	DEL	01 DE JUNIO DEL 2021	AL	20 DE JUNIO DEL 2021	\$ 118,903.86	\$ 118,903.86

ASI MISMO, AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS NI RECLAMACIONES QUE HACER, POR LO TANTO, SE DAN POR EXTINGUIDAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO **CONT-DOOTSM-JM-047/2021** ASÍ COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 14:45 HORAS DEL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2021, EN LA CD. DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

ING. HERNAN FRIAS OLAN
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

C. LIC. SAUL JIMENEZ MENDEZ
(PERSONA FÍSICA) REPRESENTANTE LEGAL
DE AULIS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ , TABASCO.

2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y

SERVICIOS MUNICIPALES



(Gobierno de Unidad con Esperanza para todos)



ALBÚM FOTOGRÁFICO

PROYECTO:OP33-089.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 1ra SECCION (TRAMO TERESILA)

LOCALIDAD:028.-R/A. REFORMA 1RA SECCION

NÚMERO DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-047/2021

ANTES

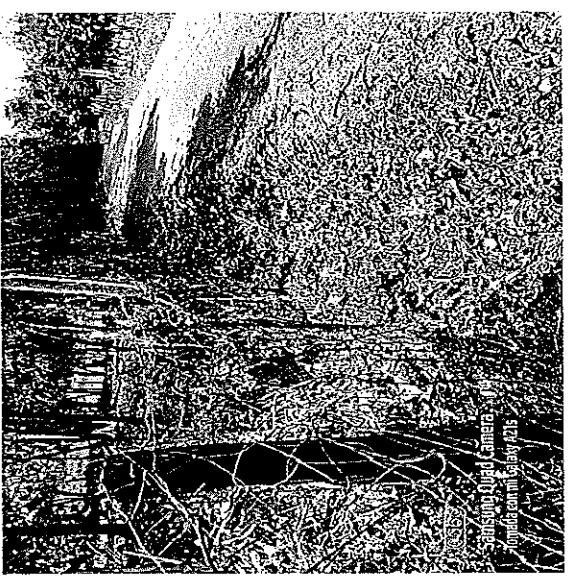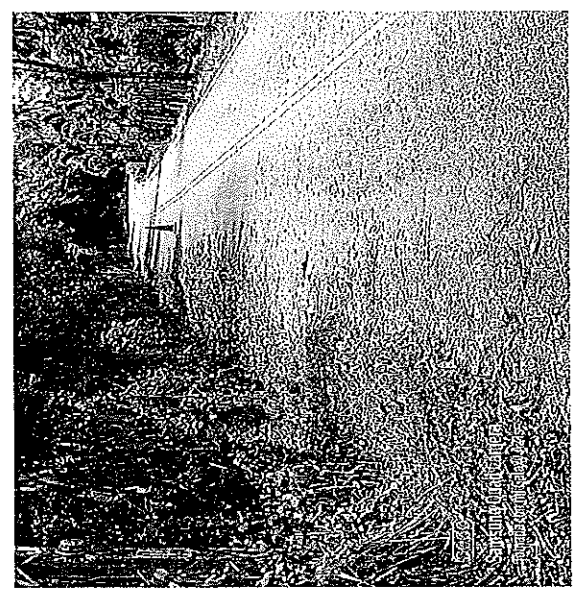

FORMULO
ING. JUAN CARLOS MORALES HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. HERNANFRÍAS OLAN
RESIDENTE



JALPA
de Méndez
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

(Gobierno de Unidad con Esperanza para todos)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ , TABASCO.

2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y

SERVICIOS MUNICIPALES




ALBÚM FOTOGRÁFICO

PROYECTO:OP33-089.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 1ra SECCION (TRAMO TERESILA)

LOCALIDAD:028.-R/A. REFORMA 1RA SECCION

DURANTE

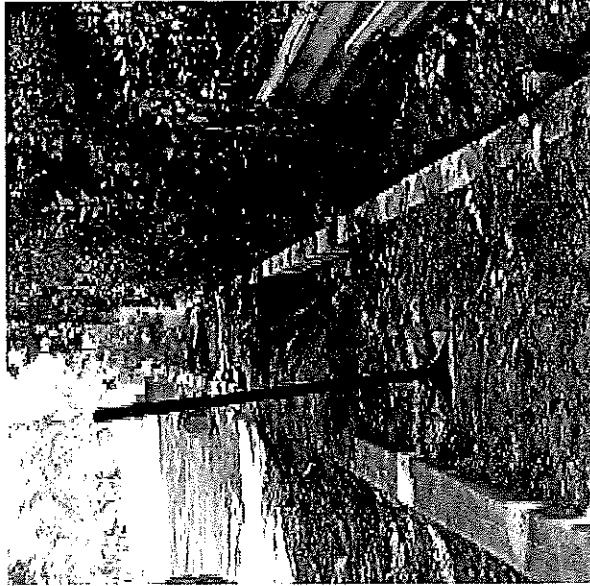

FORMULO
ING. JUAN CARLOS MORALES HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

REVISO
ING. HERNANDEZ OLAN
RESIDENTE



JALPA
de Méndez
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y

SERVICIOS MUNICIPALES




ALBÚM FOTOGRÁFICO

PROYECTO: OP33-089. -CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 1ra SECCION (TRAMO TERESILA)

LOCALIDAD: 028.-R/A. REFORMA 1RA SECCION

DESPUÉS

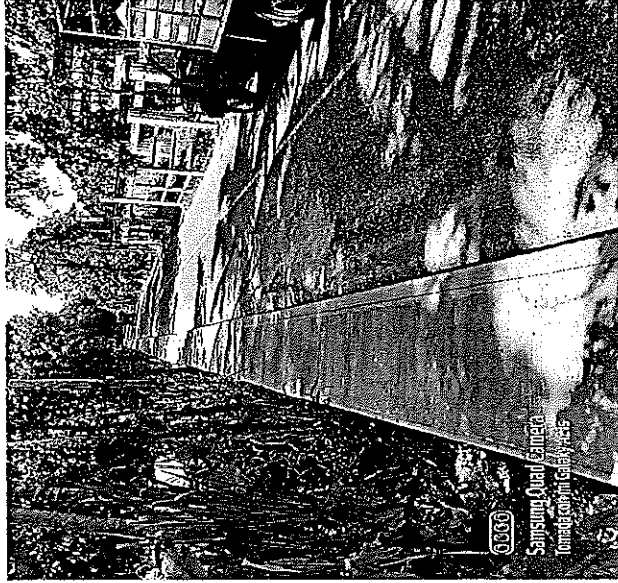

FORMULO
ING. JUAN CARLOS MORALES HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

REVISO
ING. HERNAN FRIAS OLAY
RESIDENTE

Fecha 01 / Jun / 2021

Folio N° 01 / Anexo N°

Nota de Apertura:

Con esta fecha y en cumplimiento al Inicio de Apertura de la presente Bitácora con fundamento al inciso I de Art. 95 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Relaciones con las Mismas se apertura el Tomo I (único) de la Bitácora de la obra relativa al contrato No. CONT-0003M-JM-047/2021, referente al proyecto No. OP33-089.- Construcción de Guarniciones y Banquetas en Jalpa de Méndez Localidad Reforma tra. Sección (Fundo Teresita) Relacionando la siguiente Información.

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato No.: CONT-0003M-JM-047/2021
Obra: OP33-089.- Construcción de Guarniciones y Banquetas en Jalpa de Méndez (Localidad Reforma tra. Sección (Fundo Teresita))

Fecha de Inicio: 01 de Junio de 2021
Fecha de Terminación: 20 de Junio de 2021
Localidad: 02.8 R/A Reforma tra. Sección.
Metr: 172.50 M²
Contratista: Aulis y Asociados, S.A. de C.V.
Domicilio fiscal: Calle Ignacio Zaragoza No 36 Col. centro c.p. 86780 Jantla, Tabasco.
Representante Legal: Lic. Saul Jiménez Méndez
Superintendente de Construcción: Juan Carlos Morales Hernández
Cédula Profesional: 4173139
Oficio de Asignación del Superintendente: s/n.

Contratante: H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez
Domicilio: Calle plaza Hidalgo No 1 Col. Centro de Jalpa de Méndez.
Residente de obra: Ing. Hernán Frías Olan
Cédula profesional: 12155173
Oficio de Asignación del Residente de Obra:

Nombre y Cargo del designante: Ing. Sergio Alberto Hernández Portilla
A continuación se Asientan con punto y letra los nombres y firmas de las personas autorizadas para asentar registros en esta bitácora:

Lic. Saul Jiménez Méndez
Representante Legal.

Ing. Sergio Alberto Hernández Portilla
Residente de Obra

Ing. Juan Carlos Morales Hernández
Superintendente de Construcción

ING. HERNÁN FRIAS OLAN
Residente de Obra.

Elaborado por:


Recibido por:


Fecha 03 / Jun / 2021

Folio N° 02 / Anexo N°

Obra: OP33-089 - Construcción de Guarniciones y Banquetas en Jalpa de Méndez Localidad Reforma 1ra. Sección (Tramo Teresita)
Contrato: CONT. D005M-114047/2021

Con esta fecha se hace recorrido al tramo empresa contratista y residente de obra por parte de la dependencia para darle a conocer al comité de obra por parte de la comunidad que se iniciaran los trabajos referente arriba descritos y que ellos seran los principales Utilizantes de los trabajos a realizar para llevarse a cabo el proyecto en comento, se observa que la contratista empieza con los trabajos de limpieza, Trazo y Nivelacion del terreno para desplante de estructuras, estableciendo Niveles y referencia referente a la Continuation de la banquetta y guarnición existente.


MSc. HERNAN FERRIS OLIVERA
Residente de Obra.


Ing. Juan Carlos Morales Hernández
Superintendente de Construcción

Entendido por:


Recibido por:

Fecha 03/ Jun/ 2021

Folio N° 3 / Anexo N°

Obra: OP33-089.- Construcción de Compuerciones + Parquetos
 en Jalpa de Méndez Localidad Reforma 1ra. Sección
 (Tramo Teresita).
 Contrato No: CONT-DOOP-4-14-047/2021

Con esta fecha se observa que se trabaja en
 excavación de material tipo B con medios
 manuales así como su refiro de material fuera
 de la obra hasta 2 km de distancia.
 Según lo marca el proyecto. Así como en la
 reparación de tomas domiciliarias de Agua
 potable para recibir cimbra metálica.



ING. HERIBERTO FERNÁNDEZ
 Residente de Obra.



Ing. Juan Carlos Morales Hernández
 Superintendente de Construcción


Fecha 5 / Jun / 2021


Folio N° 4 / Anexo N°

Obra: DP33-089.- Construcción de Guarniciones y Banquetos en Jalpa de Méndez Localidad Reforma Tr. Sección (Tramo Teresita)

Contrato No. CONT-D00TSM-54-047/2021

Con esta fecha se trabaja en el tendido y compactado de Material de Banco para relleno con material de la Región, compactado con medios mecánicos en capas de 10 cms y se observa que se le hecha agua para su correcta conformación y tendido del material en el área de banquetas.


Ing. Juan Carlos Morales Hernández
Superintendente de Construcción


Ing. Hernán Ferras
Res. ante de Obra.


Fecha 8 Jun/2021

Folio N° 5 / Anexo N°


Obra: OP33-089 - Construcción de Guarniciones y Banquetas en Jalpa de Méndez Localidad Reforma Tra. Sección (Tramo Teresita)

Contrato No: CONT-000734-JM-047/2021

Con esta fecha se observa que se cimbra con cimbra metálica de madera trapezoidal de $15 \times 20 \times 40$ cm armado con cadena tipo Armex de $15 \times 30 \times 40$ para recibir concreto premezclado $P_c = 150 \text{ kg/cm}^2$ según lo marca el proyecto.



Ing. Hernán Zúñiga Cruz
Residente de Obra.



Ing. Juan Carlos Morales Hernández
Superintendente de Construcción

Fecha 14 JUNI 2021

Folio N° 6 / Anexo N°

Obra: OP33-089 - Construcción de Guarniciones y banquetas en Jalpa de Méndez Localidad Reforjato Sección (Tramo Teresita).

Contacto No: CONT-DUOTSM-JN-047/2021

Con esta fecha se observa que se trabaja en el cimbrado de banqueta para recibir Concreto premezclado de $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$ con espesor de 8cm colado en placas de $1.15 \times 3.00 \text{ cms}$. con acabado escobillado.



Ingeniero HERNÁN FERNÁNDEZ
Residente de Obra



Ingeniero Juan Carlos Morales Hernández
Superintendente de Construcción

Fecha 15 JUN 2021

Folio N° 7 / Anexo N°

Obra: OP33-089 - Construcción de Guarniciones y lan-
guetas en Jalpa de Méndez Localidad Reforma
Ma. sección (Tramo Teresa).

Contratos: CONADOCIM-IM-047/2021

Con esta fecha se trabaja en la elaboración
de rampa para personas discapacitadas o
de capacidades diferentes armada con malla
electrosoldada GA6-16/10, con acabe integral
estribillado con concreto premezclado de
resistencia $f_c = 150 \frac{kgf}{cm^2}$ con espesor de
8 cms.

Eng. Juan Carlos Morales
Hernández
Superintendente de Construcción

ING. HERNÁN FÉLIX OLÁN
Residente de Obra


Fecha 18 JUN 2021

Folio N° 8 / Anexo N°

Obra DP33-089 - Construcción de Guarniciones y banquetas
 en Jalpa de Méndez localidad Reforma tra.
 Sección (Tramo Teresita).

Contrato No: CONT-DOOTSM-JM-047/2021

Con esta fecha se observa que se trabaja
 en el rótulo en rampa para personas de
 capacidades diferentes, según diseño Avanzado
 en lineamientos específicos del programa
 HABITAT.



ING. HERNÁN FAJÓ CRUZ
 Residente de Obra



Ing. Juan Carlos Morales Hernández
 Superintendente de Construcción

Fecha 20 JUN / 2021

Folio N° 7 / Anexo N°

Obra: OP33-089 - Construcción de Guarniciones y Banquetas en Jalpa de Méndez localidad. Reforma tra. Sección (Tramo Teresita).

Contrato NO. CONT-00093M-SM-047/2021

Con esta fecha se observa que se realiza los trabajos de trabajo de pintura en guarniciones con pintura de tráfico pesado base Agua color Amarillo, por lo que se concluyen los trabajos al 100% de dicho Contrato con fecha 20 de Junio de 2021.

Ing. HELMAN FRIAS OLÁN
Presidente de obra.

Ing. Juan Carlos Morales
Hernández
Superintendente de Construcción


Fecha 26 Jun / 2021


Folio N° 10 / Anexo N°

Obra: DP33-089 - Construcción de guarderías y banquetas en Jalpa de Méndez, Localidad: Reforma tra. Sección (Tramo Teresita)

Contrato con CONTRA-000954-UM-047/2021

Con esta fecha se hace entrega de la Estimación No 1 (Riniquita) Trabajos Ejecutados a la residencia de obra con los siguientes documentos: Oficio de entrega de estimación, boletín factura, Resumen de estimación, número de generadores y arregios, álbum fotográfico y bitácora convencional, para su revisión y trámite correspondiente.



 Ing. Juan Carlos Morales Hernández
 Superintendente de Obra de Construcción



 Ing. Hernan Frias Ulan
 Residente de Obra

28 / Junio / 2021

Folio No. 11

La estimación No 1 (Riniquita) trabajos Ejecutados de la obra DP33-089 - Construcción de guarderías y banquetas en Jalpa de Méndez, Localidad: Reforma tra. Sección (Tramo Teresita) Se presenta con un importe de \$118,903.86 IVA incluido, un avance físico y financiero del 100% de acuerdo a la revisión presentada por la contratista se avanza la presente estimación.


 Ing. Hernan Frias Ulan
 Residente de Obra


 Ing. Juan Carlos Morales Hernández
 Superintendente de Obra


Fecha 29 / Jun / 2021


Folio N° 12 / Anexo N°

Obra: Op33-089 - Construcción de Guarniciones y banquetas en Talpa de Méndez, localid. Reform. Mz. Sección (Cramo de visita)

Contrato: COM - DICT-54 - JM - 047/2021

Con esta fecha se realiza el cierre de la presente bitácora de la obra arriba señalada; habiendo terminado los trabajos el día que señala el contrato 20 de Junio de 2021, recepcionado físicamente el 25 de Junio de 2021 y entregado -Recepcionado el día 26 de Junio del presente año; así como finiquitado el 28 de Junio del año 2021.


 Ing. Juan Carlos Flores
 Hernández
 Superintendente de Construcción


 Ing. Hernán Frías Blán
 Residente de obra
