



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la independencia"



Gobierno de Unidad con Esfuerzo por todos!

DEPENDENCIA	: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
TIPO DE CONTRATO	: ESTATAL
ORIGEN DEL RECURSO	: RAMO 33 FONDO III 2021
PROG. PRESUPUESTARIO	: K005.- URBANIZACION
PROG. INSTITUCIONAL	: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
PARTIDA	: 61501.- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN
PROYECTO No.	: OP33-109
PROCED. DE CONTRATACIÓN	: ADJUDICACION DIRECTA
LICITACIÓN No.	: JM-DOOTSM-034-2021

CONTRATO NO.	: CONT-DOOTSM-JM-034/2021
FECHA	: 17 de mayo de 2021
OBRA	: OP33-109.- CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSE)
LOCALIDAD	: 021.- VILLA JALUPA
MUNICIPIO	: JALPA DE MENDEZ
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 30 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO	: 18 de mayo de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	: 16 de junio de 2021
IMPORTE CONT. C/IVA	: \$1,647,366.22
IMPORTE CONT. S/IVA	: \$1,420,143.29
IMPORTE AUT. C/IVA	: \$1,658,572.83
IMPORTE AUT. S/IVA	: \$1,429,804.16
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN	: ACTA DE CABILDO SESION No. 53 ORDINARIA DE FECHA 02/04/2021
IMPORTE ANTICIPO	:
META	: 556.00 ML

CONTRATISTA	: MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES
DOMICILIO	: PROLONGACION DE GUADALUPE VICTORIA S/M, COL. CENTRO, C. P. 86500, CARDENAS, TABASCO
REG. FED. DE CAUSANTES	: RIAM7710068R4
REG. I. M. S. S.	: E7422499102
REG. INFONAVIT	: E7422499102
ESPECIALIDAD	: 220

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, REPRESENTADA POR EL C. PROFR. JOSE LUIS CORDOVA OVANDO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO" Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS, REPRESENTADA POR EL (LA) C. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 64 Y 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO 1, 16, 17, 42, 50 FRACCIÓN II Y 67 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, GOZA DE PERSONALIDAD JURÍDICA PARA TODO LOS EFECTOS LEGALES, POR LO QUE SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.

QUE EL C. **PROFR. JOSE LUIS CORDOVA OVANDO**, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL ACTA DE CABILDO DE LA SESION EXTRAORDINARIA No. 52 DE FECHA 5 DE MARZO DE 2021 Y SÍNDICO DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2018-2021, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 23 PÁRRAFO SEGUNDO Y 26 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, POR LO QUE CUENTAN CON CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO

EL C. **ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA**, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CON SU NOMBRAMIENTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2018, OTORGADO POR EL C. LIC. JESUS SELVAN GARCIA, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA AL "CONTRATISTA" DENTRO DE LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON RECURSOS DE: **RAMO 33 FONDO III 2021, AUTORIZADA POR LA ACTA DE CABILDO SESION No. 53 ORDINARIA DE FECHA 02/04/2021.**

QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A "EL CONTRATISTA", PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA CON LA INVERSIÓN AUTORIZADA QUE SE DESCRIBE EN LA DECLARACIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES QUE SE MARCARON AL "CONTRATISTA" PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

OP33-109.- CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSE), META: 556.00 ML, EN LA LOCALIDAD DE: 021.- VILLA JALUPA.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: **CALLE PLAZA HIDALGO No. 1, COL. CENTRO, C.P.86200 JALPA DE MENDEZ, TABASCO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.**

QUE DESIGNA AL C. **PEDRO MAGAÑA CERINO**, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, EN BASE AL NOMBRAMIENTO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, QUE LE FUE OTORGADO POR EL C. LIC. JESUS SELVAN GARCIA, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, FACULTANDO PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE EJERCICIO DE LAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la independencia"



FACULTADES QUE CORRESPONDEN ORIGINALMENTE AL PRESIDENTE MUNICIPAL, EN CUANTO A LA SUSCRIPCION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

II.- EL CONTRATISTA DECLARA:

II.1.- QUE ES UNA PERSONA FÍSICA CONSTITUIDA, POR MEDIO DEL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES NÚMERO **RIAM7710068R4** EMITIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, MANIFIESTA QUE CONOCE PLENAMENTE Y SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION E INTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE LOS DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

SE PRESENTA LA CREDENCIAL DE ELECTOR EMITIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE) CON CLAVE DE ELECTOR **0055087787445** Y DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE QUE AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD SE SEGUIRÁ CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE DOCUMENTO.

II.2.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

II.3.- QUE CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

II.4.- DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE DOCUMENTO.

II.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: **PROLONGACION DE GUADALUPE VICTORIA S/N, COL. CENTRO, C. P. 86500, CARDENAS, TABASCO**, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



GOBIERNO DE UNIDAD CON ESPERANZA PARA TODOS

III.- LAS PARTES DECLARAN:

III.1.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS PLANOS, EL PROGRAMA, EL PRESUPUESTO, LA PROPUESTA PRESENTADA POR "EL CONTRATISTA", LOS CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO

III.2.- QUE RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA:

OP33-109.- CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSE), META: 556.00 ML, EN LA LOCALIDAD DE: 021.- VILLA JALUPA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, PLANOS DEL PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO Y DEMÁS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: \$1,647,366.68 ---(UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N.)---; INCLUYENDO EL 16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES, SIENDO LA FECHA DE INICIO EL DÍA 18 de mayo de 2021 Y LA TERMINACIÓN EL DÍA 16 de junio de 2021.

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUMERO JM-DOOTSM-034-2021 LO ANTERIOR EN BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, CUYO FALLO FUE EMITIDO MEDIANTE EL ACTA DE FECHA 12 de mayo de 2021.

QUINTA.- AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la independencia"



(Gobierno de Unidad con Esperanza por todos!)

EL COSTO DE LOS TRABAJOS SERÁ CUBIERTO CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III 2021. MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION N°. ACTA DE CABILDO SESION No. 53 ORDINARIA DE FECHA: 02/04/2021.

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA.

LAS OBRAS DEBERÁN SER EJECUTADAS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO QUE "EL CONTRATISTA" PRESENTÓ EN SU PROPUESTA DE LICITACIÓN, EL CUAL APROBARA "EL AYUNTAMIENTO" SI LO ENCUENTRA SATISFACTORIO, PERO EN CASO CONTRARIO TENDRÁ DERECHO A MODIFICARLO. EL PROGRAMA APROBADO SE CONSIDERARA INCORPORADO AL PRESENTE CONTRATO Y FIRMADO POR LAS PARTES, SERÁ EL QUE RIJA PARA TODOS LOS EFECTOS DE LAS ESTIPULACIONES DEL MISMO.

SÉPTIMA.- ANTICIPO.

"EL AYUNTAMIENTO" OTORGARÁ A "EL CONTRATISTA" UN ANTICIPO DEL 0% DEL MONTO PACTADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO,

LO CUAL IMPORTA LA CANTIDAD ; INCLUYENDO EL 16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), PARA QUE "EL CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS: ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.

EL ANTICIPO SERÁ ENTREGADO A "EL CONTRATISTA" EN UNA EXHIBICIÓN Y DEBERÁ SER AMORTIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 110 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

EL ANTICIPO SE ENTREGARÁ A "EL CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, DE ACUERDO A LA FRACCIÓN I DEL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

CUANDO "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

OCTAVA.- GARANTÍAS.

PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE CONSTITUIRÁ POR LA TOTALIDAD DEL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE CONSTITUIRÁ POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO, LA CUAL SERA DE NATURALEZA INDIVISIBLE Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRA DISMINUIRSE EN PROPORCION A LOS AVANCES DE LA OBRA, POR LO QUE DEBERA CUBRIRSE EN SU TOTALIDAD, TOMANDO COMO BASE EL MONTO TOTAL CONTRATADO Y EN SU CASO LOS CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO QUE SE HUBIERE GENERADO.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



Gobierno de Unidad con Esfuerzos por Todos!

LAS FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, POR UNA INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA DIRECCION DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, ENTREGADAS DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFIQUE EL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

LAS PÓLIZAS EN QUE SEAN EXPEDIDAS LAS FIANZAS DEBERÁN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUEN:

I.- QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

II.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".

III.- QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

IV.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

V.- EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A "EL CONTRATISTA", DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES A LA NOTIFICACIÓN A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO"

VI.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, POR LO TANTO NO SERA APLICABLE LA FIGURA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTICULO 120 DE LA CITADA LEY.

PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER, DURANTE UN PLAZO DE 365 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LO QUE, A SU ELECCIÓN, DEBERÁN CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.

EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" OPTE POR CONSTITUIR UNA POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO POR LA RELACION DE LOS MISMOS, DICHA POLIZA DE FIANZA CONTENDRA LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la independencia"



Gobierno de Unidad con Esperanza por todas

1.-VIGENCIA DE 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

2.-LA FIANZA SE TORNARA EXIGIBLE A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DEL PLAZO FIJADO A "EL CONTRATISTA" PARA CORREGIR LOS DEFECTOS EN LA OBRA.

PARA EFECTOS DE LAS ANTERIORES ESPECIFICACIONES, "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN LA VIGENCIA DE LA POLIZA DE FIANZA, NOTIFICARA LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", SEÑALÁNDOLE UN PLAZO ESPECIFICO PARA CORREGIR LAS IRREGULARIDADES.

UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA CORRECCION DE LOS DEFECTO DE LA OBRA, LA POLIZA DE FIANZA SE TORNARA EXIGIBLE Y SU COBRO SE SUJETARA AL PROCEDIMIENTO DE LA FIANZA, PREVISTO EN EL ART. 279 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, POR LO QUE NO LE SERA APLICABLE LA FIGURA JURÍDICA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTICULO 174 DE LA CITADA LEY.

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO DE "EL AYUNTAMIENTO" PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, LA ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, LICENCIAS, Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ TENER SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER CONOCIMIENTO AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASIMISMO "EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA POR ESCRITO CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA MISMA, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE "EL CONTRATISTA" Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA". LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DÉCIMA PRIMERA.- FORMA DE PAGO.

LA FORMA DE PAGO SERÁ MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE 30 DÍAS NATURALES, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTARLAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LAS CUALES DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA; PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la independencia"



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

PARA EL PAGO DE FINIQUITO EN EL CASO DE LAS OBRAS AGRUPADAS POR UN CONTRATO Y QUE SE ENCUENTREN OBRAS CON UN PLAZO MENOR A LA VIGENCIA DEL MISMO, SE EFECTUARÁ LA RECEPCIÓN FÍSICA DE CADA OBRA Y SE TRAMITARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE PARA SU PROCESO DE PAGO, SIN EMBARGO, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS SE PRESENTARÁ HASTA EL FINAL DEL PLAZO CONTRATADO O CONVENIDO, QUEDANDO CADA OBRA RECEPCIONADA Y FINIQUITADA, AMPARADA BAJO LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO VIGENTE, Y HASTA QUE PRESENTE AL FINAL DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS POR EL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DEL CONTRATO.

LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SERÁN FIN DE MES Y AL TÉRMINO DE PROGRAMA CONTRATADO.

LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES SE EFECTUARÁN EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, UBICADA EN CALLE PLAZO HIDALGO No. 1, COL. CENTRO, C.P.86200 DE ESTE MUNICIPIO.

DÉCIMA SEGUNDA.- DEDUCCIONES.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE DEDUZCAN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LO SIGUIENTE:

EL 0.5 % (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) COMO DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, ENCOMENDADAS A LA CONTRALORÍA.

EL 0.2 % (CERO PUNTO DOS POR CIENTO) DESTINADOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" ASENTARÁ EN BITÁCORA Y COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL AYUNTAMIENTO", LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ÉSTA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE DIEZ DÍAS NATURALES, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD; EN EL SUPUESTO QUE "EL AYUNTAMIENTO" NO REALIZARE LA RECEPCIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, ÉSTAS, SE DARÁN POR RECEPCIONADAS.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, "EL CONTRATISTA" NO ACUDA CON "EL AYUNTAMIENTO" PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ÉSTA PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO "EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la independencia"



Gobierno de Unidad con Esfuerzo por todos!

EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO "EL CONTRATISTA", ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL AYUNTAMIENTO" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPÓRTE RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" , PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASAN EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁ CELEBRAR UN CONVENIO ÚNICO ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIÓN EN MONTO, PLAZO DE EJECUCIÓN O METAS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO, EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O LA META, EL AYUNTAMIENTO PROCEDERÁ A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS DEL 68 AL 79 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS, SE CONSIDERARÁN PARTE DEL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, SE DEBERÁ DE NOTIFICAR POR ESCRITO A "EL AYUNTAMIENTO" , PARA QUE ESTA RESUELVA LO CONDUENTE; "EL CONTRATISTA" SÓLO PODRÁ EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACIÓN "EL AYUNTAMIENTO" DEBERÁ ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA AMPLIARA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCIÓN SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDENE SU EJECUCIÓN DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



Gobierno de Unidad con Espanto por todos

SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISIÓN; SU CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN.

PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, "EL AYUNTAMIENTO", JUNTO CON "EL CONTRATISTA", PROCEDERÁN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARA A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTICULO 60 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUE CONSISTIRÁ EN LA REVISIÓN DE CADA UNOS DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁN PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, ANEXANDO EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE, A "EL AYUNTAMIENTO". TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE "EL CONTRATISTA" PARA RECLAMAR EL PAGO.

"EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, DEBERÁ EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA.

LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE SUJETARÁ A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.

"EL AYUNTAMIENTO" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA, PARA LO CUAL " EL AYUNTAMIENTO " COMPARARÁ MENSUALMENTE EL IMPORTE ACUMULADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONTRA LOS QUE DEBIERON REALIZARSE DE ACUERDO AL PROGRAMA AUTORIZADO, Y SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN, EL IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA ES MENOR DE LA QUE DEBIÓ REALIZAR "EL CONTRATISTA", "EL AYUNTAMIENTO" RETENDRÁ PROVISIONALMENTE EL 5% SIN INCLUIR EL I.V.A DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE DE LOS IMPORTES ACUMULADOS DE LA OBRA QUE DEBIÓ EJECUTARSE, IMPORTE PROGRAMADO (I.P.) MENOS EL IMPORTE REALMENTE EJECUTADO CONFORME AL PROGRAMA (I.R.E.) MULTIPLICADO POR EL FACTOR DE ATRASO (F.A.) RESULTANTE DE LA DIVISIÓN DE LOS DÍAS DE ATRASO ENTRE 30 (TREINTA), COMO SE EXPRESA EN LA SIGUIENTE FORMULA:

$(IP-IRE)(0.05XFA)$.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la independencia"



Gobierno de Unidad con Esperanza para Todos!

ESTA PENALIZACIÓN SE APLICARÁ COMO UNA RETENCIÓN ECONÓMICA A LA ESTIMACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE EL CONTRATISTA PODRÁ RECUPERAR, EN LAS PRÓXIMAS ESTIMACIONES SI EL ATRASO ES RECUPERADO. LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA ESTOS TRABAJOS NO SE HAN CONCLUIDO, AL REALIZAR EL CALCULO DE LA RETENCIÓN SE TOMARAN EN CUENTA LOS AJUSTES Y PRORROGAS ACORDADOS POR LAS PARTES.

LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", DETERMINADAS EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL DIEZ POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO.

EN CASO DE QUE EL PORCENTAJE DEL PÁRRAFO ANTERIOR SEA REBASADO, SE TENDRÁ QUE REALIZAR EN FORMA INMEDIATA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

INDEPENDIEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN ESTA CLÁUSULA, Y AUN CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LIMITE MENCIONADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO.

VIGÉSIMA.- REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO".

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.

PARA LA RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVOS, QUE DE NINGUNA MANERA IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN; SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA; A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", SE SEÑALARÁ FECHA PARA LLEVAR A EFECTO UNA AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES, LA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN EL LUGAR QUE INDIQUE "EL AYUNTAMIENTO", Y DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", EL ACUERDO TOMADO DEBERÁ CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE SERÁ FIRMADA POR LAS PARTES.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, LA CUAL NO PODRÁN SER MAYOR DE 20 DÍAS NATURALES. ASIMISMO, PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE EL CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la independencia"



Gobierno de Unidad con Esfuerzos para Todos

SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA", POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN.

I. SI "EL CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA.

II. CUANDO DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS PACTADOS, LOS TRABAJOS CONTRATADOS REPRESENTEN UN ATRASO DEL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO CONTRATADO, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

III. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR LA "EL AYUNTAMIENTO".

IV. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR;

V. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO", EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

VI. SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES;

VII. SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".

VIII. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".

IX. SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL AYUNTAMIENTO" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

X. SI "EL CONTRATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;

XI. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO, Y

XII. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMÁS APLICABLES.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la independencia"



Gobierno de Unidad con Esfuerzo para Todos!

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS, O BIEN DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

CUANDO EXISTA RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A "EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO A "EL CONTRATISTA" LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO Y QUE EN SU CASO, SE HAYAN AGOTADO POR "EL CONTRATISTA" LAS INSTANCIA DE INCONFORMIDAD AL ACTO SEÑALADO.

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS EN EL PLAZO SEÑALADO CUBRIRÁ LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE A "EL CONTRATISTA" LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE VEINTE DÍAS NATURALES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS MISMOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE "EL AYUNTAMIENTO". LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A COADYUVAR EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN; IGUALMENTE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DAR AVISO AL RESIDENTE DE OBRA DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACIÓN Y MAGNITUD.

"EL CONTRATISTA" TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA APARICIÓN DE CUALQUIER BROTE EPIDÉMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA. TAMBIÉN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la independencia"



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

ENTERARÁ AL RESIDENTE DE OBRA CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS.

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SU SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN.


LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, UBICADOS EN ESTA CIUDAD, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO EXISTE DOLO, LESIÓN, MALA FE, ERROR, NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA DERIVADA DE LO ANTERIOR.

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL DE ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES, LO FIRMAN EN DOS TANTOS EN ORIGINAL DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE SUS CLÁUSULAS, EN MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, ESTADO DE TABASCO, A LAS 15:00 HRS DEL DIA 17 de mayo de 2021.



Handwritten signature



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la independencia"



Gobierno de Unidad con Esfuerzo por todos!

CONTRATISTA
MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS

[Signature]
C. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS
ADMINISTRADOR UNICO

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

[Signature]
C. PEDRO MAGAÑA CERINO
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

[Signature]
TESTIGO

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

[Signature]
LIC. LOYDA MAGAÑA RUIZ
DIRECTOR DE FINANZAS

ESTA ES LA ULTIMA HOJA DEL CONTRATO No. CONT-DOOTSM-JM-034/2021, PROYECTO OP33-109.-
CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN
ISIDRO TRAMO SAN JOSE), CELEBRADO POR LAS PERSONAS NOMBRADAS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



DEPENDENCIA
OFICIO No.

OBRAS PÚBLICAS.
DOOTSM/DL/165/21

Jalpa de Méndez, Tabasco a 19 de abril de 2021.

MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES
PROLONGACION DE GUADALUPE VICTORIA S/N
COL. CENTRO
CARDENAS, TABASCO

AT'N:C. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES
ADMINISTRADOR UNICO.

El H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, a través del comité de obra pública municipal, conforme a lo establecido en el **Art. 44** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco **Y 45** de su Reglamento se invita a participar en el procedimiento de contratación por la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA de carácter estatal sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se celebrarán en las oficinas del Departamento de Licitaciones de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en la Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACION DIRECTA No.: JM-DOOTSM-034-2021

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
**OP33-109.- CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ
LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSE)**

UBICACIÓN:
021.- VILLA JALUPA

Licitacion No.	Limite para aceptar o declinar invitacion	Visita al sitio de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentacion y apertura de propuesta	Plazo de Ejecución 30 DIAS		Capital contable minimo acreditado
					Inicio	Terminacion	
JM-DOOTSM-034-2021	26 de abril de 2021	26 de abril de 2021 14:00 HRS	27 de abril de 2021 14:00 HRS	6 de mayo de 2021 14:00 HRS	18 de mayo de 2021	16 de junio de 2021	\$ 995,143.70

Contar con registro vigente el Padrón de contratista del Estado de Tabasco; la especialidad solicitada será: **220**

Recepción de Propuestas y Apertura de Sobres: La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la oficina que ocupa el área de licitaciones de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en la Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco.

Visita de Obra: Los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el lugar que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de ejecución de los trabajos.

Junta de Aclaraciones: Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

Recibido 19/04/21

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



Los recursos para la celebración de los trabajos descritos corresponden al **RAMO 33 FONDO III 2021**

De acuerdo al artículo 47 fracción IV de la ley, en caso de aceptar participar se deberá manifestar por escrito a la persona que signa la presente invitación a más tardar el día señalado y quedará obligado a presentar propuesta, en el entendido que si no lo hace, la contraloría inhabilitará por noventa días naturales para participar en procesos de contratación por invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, a contratista que habiendo aceptado participar por escrito no presenten propuesta, lo anterior en concordancia con lo asentado en el artículo 47 fracción IV de la ley. La fecha de inicio de inhabilitación, será la de la presentación y entrega de propuestas.

Se le solicita acudir de 08:00 a.m. a 15:00 p.m. de lunes a viernes en el área de licitaciones de la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales en Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, de este municipio, con su carta de aceptación para que le sean proporcionados las bases de la licitación y sus anexos.

Las bases tendrán un costo de **\$0.00**

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrá ser negociada.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

No podrá participar persona física o jurídico colectiva que no se encuentre inscrita o en proceso de inscripción en el Padrón de Contratista del Estado de Tabasco.

Al licitante ganador se le otorgará anticipo del 0%.

El acto de apertura de propuesta se llevará a cabo de manera interna, por lo cual deberá entregar su propuesta en un sobre cerrado de manera inviolable que contendrá por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica,

El Fallo: Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día 12 de mayo de 2021 a las 14:00 HRS

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C. Pedro Magaña Cerino
Presidente del Comité de Obra



c.c.p. Archivo.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



DEPENDENCIA
OFICIO No.

OBRAS PÚBLICAS.
DOOTSM/DL/167/21

Jalpa de Méndez, Tabasco a 19 de abril de 2021.

NAPOLEON, S.A. DE C.V.
CARRETERA A REFORMA KM 1SN
COL. RA. RIO VIEJO 1RA. SECCION
CENTRO, TABASCO

AT'N: ADRIAN LOPEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

El H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, a través del comité de obra pública municipal, conforme a lo establecido en el **Art. 44** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco **Y 45** de su Reglamento se invita a participar en el procedimiento de contratación por la modalidad de **ADJUDICACION DIRECTA** de carácter estatal sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se celebrarán en las oficinas del Departamento de Licitaciones de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en la Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACION DIRECTA No.: JM-DOOTSM-034-2021

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
OP33-109.- CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ
LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSE)

UBICACIÓN:
021.- VILLA JALUPA

Licitacion No.	Limite para aceptar o declinar invitacion	Visita al sitio de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentacion y apertura de propuesta	Plazo de Ejecución 30 DIAS		Capital contable minimo acreditado
					Inicio	Terminacion	
JM-DOOTSM-034-2021	26 de abril de 2021	26 de abril de 2021 14:00 HRS	27 de abril de 2021 14:00 HRS	6 de mayo de 2021 14:00 HRS	18 de mayo de 2021	16 de junio de 2021	\$ 995,143.70

Contar con registro vigente el Padrón de contratista del Estado de Tabasco; la especialidad solicitada será: **220**

Recepción de Propuestas y Apertura de Sobres: La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la oficina que ocupa el área de licitaciones de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en la Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco.

Visita de Obra: Los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el lugar que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de ejecución de los trabajos.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



Junta de Aclaraciones: Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Los recursos para la celebración de los trabajos descritos corresponden al **RAMO 33 FONDO III 2021**

De acuerdo al artículo 47 fracción IV de la ley, en caso de aceptar participar se deberá manifestar por escrito a la persona que signa la presente invitación a más tardar el día señalado y quedará obligado a presentar propuesta, en el entendido que si no lo hace, la contraloría inhabilitará por noventa días naturales para participar en procesos de contratación por invitación a cuando menos cinco personas y adjudicación directa, a contratista que habiendo aceptado participar por escrito no presenten propuesta, lo anterior en concordancia con lo asentado en el artículo 47 fracción IV de la ley. La fecha de inicio de inhabilitación, será la de la presentación y entrega de propuestas.

Se le solicita acudir de 08:00 a.m. a 15:00 p.m. de lunes a viernes en el área de licitaciones de la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales en Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, de este municipio, con su carta de aceptación para que le sean proporcionados las bases de la licitación y sus anexos.

Las bases tendrán un costo de **\$0.00**

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrá ser negociada.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

No podrá participar persona física o jurídico colectiva que no se encuentre inscrita o en proceso de inscripción en el Padrón de Contratista del Estado de Tabasco.

Al licitante ganador se le otorgará anticipo 0%.

El acto de apertura de propuesta se llevará a cabo de manera interna, por lo cual deberá entregar su propuesta en un sobre cerrado de manera inviolable que contendrá por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica,

El Fallo: Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día 12 de mayo de 2021 a las 14:00 HRS

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C. Pedro Magaña Cejino
Presidente del Comité de Obra



c.c.p. Archivo.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



DEPENDENCIA
OFICIO No.

OBRAS PÚBLICAS.
DOOTSM/DL/168/21

Jalpa de Méndez, Tabasco a 19 de abril de 2021.

**CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S. A. DE C. V.
LAGUNA LA POLVORA MANZANA 6A LOTE 5 COL. LAGUNAS 3RA ETAPA
VILLAHERMOSA, TABASCO**

**AT'N:C. AIDA IRACEMA DE LA CRUZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL**

H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, a través del comité de obra pública municipal, conforme a lo establecido en el **Art. 44** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco **Y 45** de su Reglamento se invita a participar en el procedimiento de contratación por la modalidad de **ADJUDICACION DIRECTA** de carácter estatal sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se celebrarán en las oficinas del Departamento de Licitaciones de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en la Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACION DIRECTA No.: JM-DOOTSM-034-2021

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

**OP33-109.- CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ
LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSE)**

UBICACIÓN:

021.- VILLA JALUPA

Licitación No.	Limite para aceptar o declinar invitación	Visita al sitio de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación y apertura de propuesta	Plazo de Ejecución 30 DIAS		Capital contable mínimo acreditado
					Inicio	Terminación	
JM-DOOTSM-034-2021	26 de abril de 2021	26 de abril de 2021 14:00 HRS	27 de abril de 2021 14:00 HRS	6 de mayo de 2021 14:00 HRS	18 de mayo de 2021	16 de junio de 2021	\$ 995,143.70

Contar con registro vigente el Padrón de contratista del Estado de Tabasco; la especialidad solicitada será: **220**

Recepción de Propuestas y Apertura de Sobres: La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la oficina que ocupa el área de licitaciones de la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales con dirección en la Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, C. P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco.

Visita de Obra: Los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el lugar que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de ejecución de los trabajos.

Junta de Aclaraciones: Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Los recursos para la celebración de los trabajos descritos corresponden al **RAMO 33 FONDO III 2021**

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018-2021

"2021, Año de la Independencia"



De acuerdo al artículo 47 fracción IV de la ley, en caso de aceptar participar se deberá manifestar por escrito a la persona que signa la presente invitación a más tardar el día señalado y quedará obligado a presentar propuesta, en el entendido que si no lo hace, la contraloría inhabilitará por noventa días naturales para participar en procesos de contratación por invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, a contratista que habiendo aceptado participar por escrito no presenten propuesta, lo anterior en concordancia con lo asentado en el artículo 47 fracción IV de la ley. La fecha de inicio de inhabilitación, será la de la presentación y entrega de propuestas.

Se le solicita acudir de 08:00 a.m. a 15:00 p.m. de lunes a viernes en el área de licitaciones de la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales en Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, de este municipio, con su carta de aceptación para que le sean proporcionados las bases de la licitación y sus anexos.

Las bases tendrán un costo de **\$0.00**

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrá ser negociada.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

No podrá participar persona física o jurídico colectiva que no se encuentre inscrita o en proceso de inscripción en el Padrón de Contratista del Estado de Tabasco.

Al licitante ganador se le otorgará anticipo 0%.


El acto de apertura de propuesta se llevará a cabo de manera interna, por lo cual deberá entregar su propuesta en un sobre cerrado de manera inviolable que contendrá por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica,

El Fallo: Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día 12 de mayo de 2021 a las 14:00 HRS

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C. Pedro Magaña Cerino.
Presidente del Comité de Obras



c.c.p. Archivo.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jaipa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



ACTA DE VISITA AL SITIO DE OBRA

LICITACION No.: JM-DOOTSM-034-2021

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

OP33-109.- CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSE).

UBICACIÓN:

021.- VILLA JALUPA

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO SIENDO LAS 14:00 HRS DEL DIA 26 de abril de 2021, HORA Y DIA FIJADOS PARA LLEVAR ACABO LA VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS INHERENTES A LA OBRA CUYOS DATOS SE ASIENTAN EN EL ENCABEZADO, SE REUNIERON EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, UBICADO EN LA CALLE PLAZA HIDALGO No. 1, COL. CENTRO, C.P.86200, JALPA DE MENDEZ, TABASCO: LOS CONTRATISTAS Y REPRESENTANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE.

ACTO SEGUIDO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 37 FRACC. XVI DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y ARTICULO 22 DE SU REGLAMENTO, EL SUPERVISOR ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA, REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA, MOSTRO A LOS PARTICIPANTES EL LUGAR, EXPLICANDO LA FORMA EN QUE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS Y EXPONRIENDO LOS DETALLES, CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES, QUE LOS LICITANTES DEBERÁN TOMAR EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS.


A CONTINUACIÓN DECLARAN LOS LICITANTES QUE VERIFICARON LAS CONDICIONES TOPOGRÁFICAS, GENERALES Y ESPECIALES DEL LUGAR, LAS CUALES REGISTRARÁN EN LOS CRITERIOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES.


NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA VISITA DE OBRA, EL DIA 26 de abril de 2021, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ESTA INTERVIENEN PARA SU CONSTANCIA.

POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS E INVITADOS.


ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA
SUPERVISOR DE OBRAS DE LA DOOTSM







DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE


Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



CONTRATISTAS PRESENTES EN EL ACTO

EMPRESA CONTRATISTA	REPRESENTANTE	FIRMA
MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES	C. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES	
NAPOLEON, S.A. DE C.V.	ADRIAN LOPEZ TORRES	
CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S. A. DE C. V.	C. AIDA IRACEMA DE LA CRUZ PEREZ	



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION No.: JM-DOOTSM-034-2021

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

DP33-109.- CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSE).

UBICACIÓN:

021.- VILLA JALUPA

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO SIENDO LAS 14:00 HRS DEL DIA 27 de abril de 2021, HORA Y DIA FIJADOS PARA ACLARACIONES DE DUDAS INHERENTES A LA OBRA CUYOS DATOS SE ASIENTAN EN EL ENCABEZADO, SE REUNIERON EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, UBICADO EN LA CALLE PLAZA HIDALGO No. 1, COL. CENTRO, C.P. 86200, JALPA DE MENDEZ, TABASCO; LOS CONTRATISTAS Y REPRESENTANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE.

DANDO RESPUESTAS A LAS DUDAS PLANTEADAS POR LAS EMPRESAS CONCURSANTES, PARA CONSTANCIA Y FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE COMPETEN, EN LA CUAL SEGUIDAMENTE SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y RESPUESTAS.

NO SE REALIZARON PREGUNTAS

EL AYUNTAMIENTO DECLARA QUE EL TABLERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, DEBERAN SER CONSIDERADOS DENTRO DE LOS COSTOS INDIRECTOS

NO HABIENDO MAS PREGUNTAS INHERENTES A LA OBRA EN CUESTIÓN, SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS SIENDO LAS 15:00 HRS DEL DIA 27 de abril de 2021, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ESTA INTERVIENEN PARA SU CONSTANCIA.

REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO.


ING. FABIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE


Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



CONTRATISTAS PRESENTES EN EL ACTO

EMPRESA CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES	C. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES	
NAPOLEON, S.A. DE C.V.	ADRIAN LOPEZ TORRES	
CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S. A. DE C. V.	C. AIDA IRACEMA DE LA CRUZ PEREZ	

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS

LICITACION No. JM-DOOTSM-034-2021

OBRA:

OP33-109.- CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSE).

UBICACION.-

021.- VILLA JALUPA

En la ciudad de Jalpa de Méndez del Municipio de Jalpa de Méndez, Estado de Tabasco, siendo **14:00 HRS** Del día **6 de mayo de 2021** de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 Y 41 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, se reunieron en: Las oficinas de Licitaciones de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, cita en: en la calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco; los servidores publicos, los representantes de las dependencias invitadas, así como los representantes de los licitantes, cuyos nombres figuran al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo la apertura de proposiciones técnica y económicas relativa a la licitación arriba indicada, presidiendo este acto el C. ING. JOSE CONCEPCION VAZQUEZ VENTURA. Encargado del área de licitaciones en representación del ING. SERGIO A. HERNANDEZ PORTILLA, Director de obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, el cual presidió a la recepción de las proposiciones de las siguientes empresas:

- 1.- MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES**
- 2.- NAPOLEON, S.A. DE C.V.**
- 3.- CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S. A. DE C. V.**

Acto seguido se dio lectura al dictamen técnico cuyo resultado consiste en lo siguiente:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



De acuerdo al artículo 41 de la ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco se establece que:

- A).- Se reviso primeramente la propuesta Tecnica
- b).- Se desecho las propuestas que omitieron alguna documentación solicitada en el pliego de requisitos exigidos en las bases de licitación.
- c).- Se devolverá al licitante las propuestas desechadas en un plazo de 15 dias.
- d).- Toda la documentación será recibida para su revisión detallada.

Observaciones: NINGUNA

Todas las propuestas restantes cumplieron con los requisitos solicitados en las bases, por lo que son legal y tecnicamente solventes.

Una vez concluida la lectura del dictamen tecnico, se procedio a la apertura de los sobres que contienen las propuestas economicas de los licitantes que resultaron solventes legal y tecnicamente, y se verifico cuantitativamente que las mismas contuvieran los documentos solicitados

Propuestas economicas desechadas en la revision cuantitativa:

Licitante: NINGUNO

Causas:

Propuestas economicas aceptadas para su analisis cualitativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 40 y 41 De La Ley De Obras Publicas Y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



EMPRESAS:	PROPUESTAS SIN INC. I.V.A.
1. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES	\$1,420,143.69
2. NAPOLEON, S.A. DE C.V.	\$1,426,409.39
3. CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S. A. DE C. V.	\$1,423,088.46

Acto seguido el Coordinador de licitaciones procedio a dar lectura en voz alta a los montos totales de cada una de las proposiciones admitidas, los servidores publicos y representantes de los proponentes rubricaron el catalogo de conceptos en el que se consignan los precios y el importe total de los trabajos objeto de esta licitacion, en cumplimiento al articulo 41 y 42 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, se informa a los presentes que el día **12 de mayo de 2021** a las **14:00 HRS** se dara a conocer en este mismo lugar el fallo de esta licitacion.

No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminado el acto a las **15:00 HRS**, del mismo día de su inicio, del cual se levanta la presente acta, que fue leida a los presentes, quienes proceden a firmar de conformidad, al calce y al margen de la misma, para dar fe de su legalidad conforme a lo establecido en el articulo 41 Y 42 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



POR LOS SERVIDORES PUBLICOS

ING. JOSE CONCEPCION VAZQUEZ VENTURA
ENCARGADO DEL AREA DE LICITACIONES

POR LOS LICITANTES:

EMPRESAS:	FIRMA:
MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES	C. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES
NAPOLEON, S.A. DE C.V.	ADRIAN LOPEZ TORRES
CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S. A. DE C. V.	C. AIDA IRACEMA DE LA CRUZ PEREZ

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, BASCO.

LICITACION: JM-DOOTSM-034-2021
 OBRA: OP33-109.- CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSE)
 UBICACION: 021.- VILLA JALUPA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				MIGUEL ANGELO RIVERA ANGLES				NAPOLEON S. A. DE C. V.				CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S.A. DE C.V.								
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL					
TRAMO SAN JOSE																							
PRELIMINARES																							
1.1	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO ELES DE REFERENCIA, BANOS DE NIVEL Y NIVELACION DIFERENCIAL. INCLUYE PUENTES DE MADERA, CANTONEROS, TIEBERRAS, BANOS DE NIVEL, TUBOS Y LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA OBRA. HERRAMIENTAS, EQUIPO DE PRECISION Y PLANO DE PERFILES TOPOGRAFICOS	M2	2,878.00	\$	4.80	13,814.40	0.968%	\$	3.13	\$	9,008.14	-35%	\$	4.02	\$	11,569.55	-18%	\$	4.99	\$	14,381.22	4%	1.009%
1.2	DESORILLE DEL CAMINO EN AMBOS LADOS, CON MEDIO MECANICO, PARA DERNIR EL PERFIL LATERAL DEL CAMINO. INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KM	0.56	\$	2,472.83	1,364.78	0.097%	\$	3,874.92	\$	1,605.96	16%	\$	2,935.23	\$	1,643.73	19%	\$	2,543.55	\$	1,424.44	3%	0.100%
1.3	BACHEO PROFUNDO "CAJONES" EN ZONAS AISLADAS E INSTALES INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE DE 50 CM, RELLENO CON ARENA LIMPIA, PUESTA EN OBRA (HASTA 30 CM), REPOSICION DE LA BASE HIDRAULICA CON GRAVA DE 1 1/2" A FINOS (15CM), EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,173.84	\$	252.18	295,968.84	20.700%	\$	215.38	\$	252,755.11	-15%	\$	245.32	\$	287,817.36	-3%	\$	243.25	\$	285,687.83	-4%	20.851%
1.4	TERRACERIAS ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTADO AL NOVENTA POR CIENTO (90%). INCLUYE ADICIONAMIENTO DE AGUA, CONFORMACION NIVELACION, ARNE COMPACTADO Y EQUIPOS.	M3	158.30	\$	42.65	6,747.23	0.472%	\$	31.27	\$	4,948.51	-27%	\$	35.23	\$	5,573.39	-17%	\$	41.23	\$	6,522.89	-3%	0.486%
1.5	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS PUESTA EN BANCO. INCLUYE ADICIONAMIENTO DE AGUA.	M3	298.93	\$	13.38	3,972.82	0.278%	\$	12.85	\$	3,816.55	-4%	\$	13.02	\$	3,866.02	-3%	\$	13.09	\$	3,886.81	-2%	0.273%
1.7	ACARRIO DE CUALQUIER MATERIAL EN CAMION VOLTEO, DEL KM 2 AL KM 20 SOBRE PAVIMENTO.	M3/KM	5,641.87	\$	5.15	29,054.66	2.032%	\$	4.85	\$	27,926.27	-4%	\$	5.03	\$	28,377.60	-2%	\$	5.04	\$	28,434.02	-2%	1.998%
1.8	ACARRIO DE CUALQUIER MATERIAL EN CAMION VOLTEO, DEL KM 21 EN ADELANTE SOBRE PAVIMENTO.	M3/KM	17,221.94	\$	4.91	84,589.73	5.914%	\$	4.72	\$	81,287.55	-4%	\$	4.93	\$	84,504.16	0%	\$	4.98	\$	85,249.50	1%	5.930%

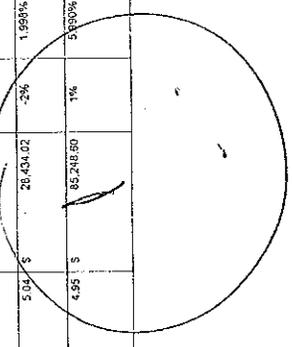




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, BASCO.

LICITACION: JM-DOOTSM-034-2021
 OBRA: OP33-109.- CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSE)
 UBICACIÓN: 021.- VILLA JALUPA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE					MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES					NAPOLEON S. A. DE C. V.					CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S.A. DE C.V.				
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
1.9	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION EN LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES O BASES CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETREO (REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS) Y COMPACTADO AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) (AASHTO ESTANDAR). INCLUYE: CONFORMACION, NIVELACION, ADICIONAMIENTO DE AGUA, APRE. COMPACTACION EXTERIOR POR TRAZOS POR MEDIOS MANUALES PARA RECIBIR RIEGOS DE IMPREGNACION CON CESPILLO DE CERDA DE RAZ, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, APLE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO FUERA DE LA OBRA.	M3	247.44	\$ 38.14	9,864.80	0.677%	\$ 34.88	\$ 8,625.76	-11%	\$ 34.88	\$ 8,625.76	-11%	0.807%	\$ 36.25	\$ 8,968.70	-7%	0.629%	\$ 35.58	\$ 8,828.66	-9%	0.620%	
1.10	TRAZOS POR MEDIOS MANUALES PARA RECIBIR RIEGOS DE IMPREGNACION CON CESPILLO DE CERDA DE RAZ, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, APLE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO FUERA DE LA OBRA.	HA.	0.21	\$ 3,957.08	785.99	0.0255%	\$ 3,472.28	\$ 728.80	-8%	\$ 3,472.28	\$ 728.80	-8%	0.051%	\$ 2,388.87	\$ 538.67	-32%	0.033%	\$ 3,542.28	\$ 744.51	-5%	0.052%	
1.11	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO MEDIO DE BAJA VISCOSIDAD (RM-20) A RAZON DE 1.5 LTM2 CON EQUIPO MECANICO. INCLUYE: ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, CALENTAMIENTO, EMISION, RIEGOS, COMBUSTIBLE, OPERACION Y EQUIPOS.	LT	3,093.00	\$ 10.01	30,960.93	2.165%	\$ 11.64	\$ 36,002.52	16%	\$ 11.36	\$ 35,136.40	13%	2.505%	\$ 10.99	\$ 33,992.07	10%	2.463%	\$ 10.99	\$ 33,992.07	10%	2.388%	
1.12	PROCESO DE POREO CON ARENA LIMPIA A RAZON DE 10 LTM2 EN ZONA IMPREGNADA. INCLUYE: ADQUISICION Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y REMOCION DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA.	M3	20.62	\$ 419.98	8,659.07	0.604%	\$ 471.02	\$ 9,712.43	13%	\$ 425.36	\$ 8,770.92	2%	0.684%	\$ 410.26	\$ 8,459.56	-2%	0.815%	\$ 410.26	\$ 8,459.56	-2%	0.894%	
1.13	CONSTRUCCION DE CARRETA ASFALTICA SOBRE UN MEDIO ASFALTICO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPOS Y EQUIPOS.	M3	153.92	\$ 2,850.34	434,443.73	30.365%	\$ 2,712.54	\$ 444,639.56	2%	\$ 2,682.55	\$ 437,739.98	1%	31.305%	\$ 2,674.28	\$ 436,526.52	1%	30.625%	\$ 2,674.28	\$ 436,526.52	1%	30.815%	
1.14	ACARREO DE CUALQUIER MATERIAL EN CAMION DE VOLTEO. PRIMER KILOMETRO SOBRE REVESTIMIENTO TERRACERA Y BRECHA.	M3	183.92	\$ 13.38	2,193.25	0.153%	\$ 12.85	\$ 2,108.37	-4%	\$ 13.02	\$ 2,134.24	-3%	0.146%	\$ 13.09	\$ 2,145.71	-2%	0.150%	\$ 13.09	\$ 2,145.71	-2%	0.151%	
1.15	ACARREO DE CUALQUIER MATERIAL EN CAMION VOLTEO. DEL KM 2 AL KM 20 SOBRE PAVIMENTO.	M3-KM	3,114.48	\$ 5.15	16,039.57	1.122%	\$ 4.95	\$ 15,416.68	-4%	\$ 5.03	\$ 15,665.83	-2%	1.086%	\$ 5.04	\$ 15,696.98	-2%	1.089%	\$ 5.04	\$ 15,696.98	-2%	1.103%	
1.16	ACARREO DE CUALQUIER MATERIAL EN CAMION VOLTEO. DEL KM 21 EN ADELANTE SOBRE PAVIMENTO.	M3/KM	5,245.44	\$ 4.91	25,755.11	1.801%	\$ 4.72	\$ 24,758.48	-4%	\$ 4.83	\$ 25,860.02	0%	1.743%	\$ 4.95	\$ 25,964.25	1%	1.813%	\$ 4.95	\$ 25,964.25	1%	1.825%	
1.17	RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO MEDIO (RM-20) A RAZON DE 1.20 LTM2, CON EQUIPO MECANICO. INCLUYE: ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, CALENTAMIENTO DE LA EMULSION, BOMBEO, COMBUSTIBLE, OPERACION Y EQUIPOS.	LT	3,378.40	\$ 10.01	33,816.78	2.285%	\$ 11.64	\$ 38,180.50	16%	\$ 11.36	\$ 37,242.82	13%	2.687%	\$ 10.99	\$ 36,026.82	10%	2.611%	\$ 10.99	\$ 36,026.82	10%	2.531%	

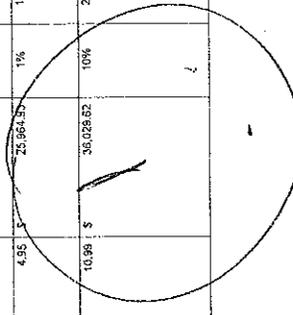

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

LICITACION: JM-DOOTSM-034-2021
 OBRA: OP83-109.- CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSE)
 UBICACION: 021.- VILLA JALUPA



El Gobierno de Jalpa de Méndez con el patrocinio de las autoridades municipales.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA


C.AVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES				NAPOLEON S. A. DE C. Y.				CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S.A. DE C.V.			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
1.18	CONSTRUCCION DE CARRETA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA CONCRETO EN CALIENTE A BASE DE GRAVA DE 1/2" A RINGOS CON ASFALTO PG 54-ZZ CON CONTENIDO OPTIMO DE MATERIALES ASFALTICOS, TENDIDOS MANOSAS INTERIORS, EQUIPO NIVELADO IN CON. EQUIPO PAVIMENTADORA Y COMPACTADO AL 95% (NOVENTA Y CINCO POR CIENTO)	M3	136.80	\$ 69.51	\$ 9,495.07	0.654%	\$ 125.24	\$ 17,107.72	1.209%	\$ 69.25	\$ 9,322.95	-2%	0.654%	\$ 69.89	\$ 9,371.17	-4%	0.642%	
1.19	OBRA DE DRENAJE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO PARA ALCANTARILLA DE 17" DE Ø SERIE 20. INCLUYE EXCAVACION PARA SU COLOCACION Y FLETE PUESTA EN OBRA.	ML	350.00	\$ 557.44	\$ 300,104.00	20.889%	\$ 915.19	\$ 320,316.50	7%	\$ 852.35	\$ 299,326.00	-1%	20.914%	\$ 845.35	\$ 295,076.00	-1%	20.791%	
1.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA DE CONCRETO PARA PASE DE AGUA DE 0.61 M. DE DIAMETRO CON EQUIPO MECANICO. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA. INCLUYE NIVELACION Y MANO DE OBRA.	ML	8.00	\$ 1,543.95	\$ 9,253.70	0.648%	\$ 1,457.81	\$ 8,746.86	-6%	\$ 1,495.65	\$ 8,975.90	-3%	0.629%	\$ 1,553.27	\$ 9,379.62	1%	0.659%	
1.21	CONSTRUCCION DE CABEZAL DE CONCRETO DE FC-150 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 30 CM. DE BASE, 20 CM DE CORONA Y 1.00 M. DE ALTURA ARMADA CON VAR. No. 3 EN AMBOS SENTIDOS @ 20 CM. SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. PARA COLOCAR EN SECCION 0.60X2.00X0.15 ARMADO CON VAR No. 3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS. PLANTILLA DE CONCRETO DE 6 CM. DE CONCRETO FC-100 KG/CM2. INCL. EXCAVACION SUM. DE MATERIAL. ELABORACION, ACARREO, VACIADO, VIBRADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, ACABADO RUSTICO.	PZA	2.00	\$ 4,802.45	\$ 9,604.90	0.689%	\$ 5,992.07	\$ 11,984.14	22%	\$ 5,652.35	\$ 10,104.72	3%	0.708%	\$ 4,953.32	\$ 9,906.64	1%	0.599%	
1.22	SEÑALIZACION PINTADO DE RAYA CENTRAL DE 10 CM DE ANCHO EN TRAMOS CONTINUOS EN BASE DE PINTURA EPOXICA COLOR BLANCA PARA TRAFICO PESADO Y MICROSEFERRAS INCLUYE SUMINISTROS DE LOS MATERIALES LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZOS, APLICACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	ML	459.00	\$ 12.41	\$ 5,696.19	0.398%	\$ 12.11	\$ 5,558.49	-2%	\$ 12.24	\$ 5,618.16	-1%	0.384%	\$ 12.35	\$ 5,668.55	0%	0.396%	
1.23	PINTADO DE RAYA LATERALES DE 10 CM DE ANCHO EN TRAMOS CONTINUOS A BASE DE PINTURA EPOXICA COLOR BLANCA PARA TRAFICO PESADO Y MICROSEFERRAS INCLUYE SUMINISTROS DE LOS MATERIALES LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZOS, APLICACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	ML	918.00	\$ 12.41	\$ 11,392.36	0.797%	\$ 12.11	\$ 11,115.99	-2%	\$ 12.24	\$ 11,236.32	-1%	0.786%	\$ 12.35	\$ 11,337.30	0%	0.791%	

\$	1,423,089.46
\$	227,694.15
\$	1,861,617.03

\$	1,423,408.30
\$	228,273.50
\$	1,654,554.83

\$	1,420,143.05
\$	221,222.95
\$	1,647,366.58

SUB-TOTAL	\$ 1,239,854.19
IVA	\$ 228,765.97
TOTAL	\$ 1,658,572.83





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ TABASCO.



LICITACION: JM-DOOTSM-034-2021
 OBRA: OP33-109.- CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSE)
 UBICACIÓN: 021.- VILLA JALUPA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			INRIQUEL ANGEL RIVERA ANGLES			NAPOLEON S. A. DE C. V.			CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUERO S.A. DE C.V.						
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
	<p style="text-align: center;">  DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA </p>																	
	<p style="text-align: center;">  ING. JOSE CONCEPCION AVAZQUEZ VENTURA </p>																	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE LA OBRA PÚBLICA

LICITACION No. JM-DOOTSM-034-2021

OP33-109.- CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSE).

LOCALIDAD:

021.- VILLA JALUPA.

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, siendo las **14:00 HRS** del día **8 de mayo de 2021**, y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 39, de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y, 37 y 38 de su Reglamento, el C. **ING. JOSE CONCEPCION VAZQUEZ VENTURA**, con Ced. Prof. **7370581**, proporciona el dictamen correspondiente en base a lo siguiente.

I).- Los criterios utilizados para la evaluación de las propuestas fueron los siguientes:

a).- El día 19 de abril de 2021, se enviaron Invitaciones a Concurso para participar en este acto a las siguientes empresas:

1. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES
2. NAPOLEON, S.A. DE C.V.
3. CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S. A. DE C. V.

b).- Aceptando su participación las siguientes empresas:

1. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES	20/04/2021
2. NAPOLEON, S.A. DE C.V.	22/04/2021
3. CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S. A. DE C. V.	21/04/2021

c).- Se llevó a cabo la Visita de Obra el día 26 de abril de 2021 a las 14:00 HRS y la Junta de Aclaraciones a las 14:00 HRS Del mismo día, a las cuales asistieron las siguientes empresas:

1. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES	26 DE ABRIL DE 2021
2. NAPOLEON, S.A. DE C.V.	26 DE ABRIL DE 2021
3. CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S. A. DE C. V.	26 DE ABRIL DE 2021

II).- Las propuestas se analizaron en forma cuantitativa el día 6 de mayo de 2021, día de la recepción, Apertura Técnica y Económica de las propuestas en la cual solo basto

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



con la presentación de los documentos solicitados en las bases de licitación de acuerdo al Artículo 29 del Reglamento.

No.	Nombre de la empresa.	Monto Ofertado Sin Inc. IVA	Situación de la Propuesta
1	MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES	\$1,420,143.69	ACEPTADA
2	NAPOLEON, S.A. DE C.V.	\$1,426,409.39	ACEPTADA
3	CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S. A. DE C. V.	\$1,423,088.46	ACEPTADA

III).- Razones Legales, Técnicas y Económicas por las cuales se desechan las propuestas presentadas por los licitantes de acuerdo a los artículos 34 y 35 del Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No.	Nombre de la empresa.	Monto Ofertado Sin Inc. IVA	Situación de la Propuesta
1	MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES	\$1,420,143.69	ACEPTADA
2	NAPOLEON, S.A. DE C.V.	\$1,426,409.39	ACEPTADA
3	CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S. A. DE C. V.	\$1,423,088.46	ACEPTADA

IV).- Relación de los licitantes cuyas propuestas cumplieron con los requerimientos exigidos por la evaluación ubicados del mayor al menor de acuerdo a los montos revisados y corregidos, de acuerdo al artículo 36 del Reglamento.

No.	Nombre de la empresa.	Monto Ofertado Sin Inc. IVA	Situación de la Propuesta
1.	MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES	\$1,420,143.69	SE CONSIDERA SOLVENTE
2.	NAPOLEON, S.A. DE C.V.	\$1,426,409.39	SE CONSIDERA SOLVENTE
3.	CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S. A. DE C. V.	\$1,423,088.46	SE CONSIDERA SOLVENTE

PRESUPUESTO BASE: \$1,429,804.16 SIN I. V. A.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



RANGO DE EVALUACIÓN:

a).- Propuesta Mayor	\$	1,426,409.39
b).- Propuesta Menor	\$	<u>1,420,143.69</u>
Diferencia	\$	6,265.70

De donde (1) *(\$ 1,426,409.39)/10= \$ 142,640.94

De donde: \$ 6,265.70 < \$ 142,640.94

Cumplíndose la condición

CONDICIÓN: SE CUMPLE CONDICIÓN I (Del artículo 36 del RLOPSRM del Estado de Tabasco)

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

Nombre de la empresa.	Monto ofertado: Sin Inc. IVA	Situación de la Propuesta
MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES	\$1,420,143.69	Se Adjudica ya que esta es la propuesta solvente cuyo monto es el más bajo.
NAPOLEON, S.A. DE C.V.	\$1,426,409.39	Se considera solvente.
CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S. A. DE C. V.	\$1,423,088.46	Se considera solvente.

Siendo las 15:00 HRS del mismo día de su inicio se da por terminada la presente firmando en ella los que intervinieron.

DICTAMINO:



ING. JOSE CONCEPCION VAZQUEZ VENTURA
CED. PROF. 7370581

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION

LICITACION No.: JM-DOOTSM-034-2021.

OBRA:

OP33-109.- CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSE).

LOCALIDAD:

021.- VILLA JALUPA

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TAB., SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA 12 de mayo de 2021, DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO DE APERTURA ECONOMICA CELEBRADO EL DIA 6 de mayo de 2021, PARA CONOCER EL FALLO QUE EMITE EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TAB., SE REUNIERON EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL AREA DE LICITACIONES DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES CITO EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ S/N, BARRIO SAN LUIS DE ESTE MUNICIPIO, LOS SERVIDORES PUBLICOS Y LICITANTES, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA Y EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 42 JUNTO CON TODOS SUS PÁRRAFOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

ACTO SEGUIDO SE DIO LECTURA AL DICTAMEN ECONÓMICO, CUYO RESULTADO CONSISTE EN LO SIGUIENTE:

LAS PROPUESTAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES, POR LO QUE SON LEGAL, TECNICA Y ECONOMICAMENTE SOLVENTES.

UNA VEZ CONCLUÍDA LA LECTURA DEL DICTAMEN ANTES CITADO, EL C. ING. JOSE CONCEPCION VAZQUEZ VENTURA, EN PRESENCIA DE LOS DEMAS SERVIDORES PUBLICOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA, LICITANTES E INVITADOS, COMUNICA EL FALLO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE LA OBRA DE REFERENCIA MOTIVO DE ESTA LICITACION A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLAS, CON UN IMPORTE DE: \$1,647,366.68---(UN

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N.)---


INCLUYE EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A), CON FECHA DE INICIO **18 de mayo de 2021** Y UN PLAZO DE EJECUCION DE **30 DIAS CALENDARIO**, YA QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS DE LAS BASES DE ESTA LICITACION, Y EN CONSECUENCIA SE LE ADJUDICA EL CONTRATO RELATIVO A LA OBRA ANTES MENCIONADA.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTO DE NOTIFICACION PARA EL LICITANTE ADJUDICADO, COMUNICANDOLE QUE LA FIRMA DEL CONTRATO No. **CONT-DOOTSM-JM-034/2021** QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA **17 de mayo de 2021** A LAS **14:00 HRS** EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES Y QUE DEBERA PRESENTAR EN EL MISMO LUGAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RESPECTIVAMENTE, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE ESTE FALLO.

SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA A LAS 15:00 HRS DEL MISMO DIA DE SU INICIO PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, FIRMAN DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

POR LA DEPENDENCIA:

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**


**ING. SERGIO A. HERNANDEZ PORTILLA
DIR. DE OBRAS, ORD. TERR.
Y SERV. MPALES.**


**ING. JOSÉ C. VAZQUEZ VENTURA
ENCARGADO DE LICITACIONES**

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"




JALPA
de Méndez


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021

"Gobierno de Unidad con Esperanza para todos"

POR LOS LICITANTES:

EMPRESAS:	FIRMA:
MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES	
NAPOLEON, S.A. DE C.V.	
CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S. A. DE C. V.	

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021

Dirección de Obras ordenamiento territorial y servicios Municipales
Departamento de Precios Unitarios y Presupuestos



JALPA
de Méndez
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

DATOS BASICOS GENERALES
DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: OP33-109.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSÉ)
006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
K005.- URBANIZACION

LOCALIZACION: 021.- VILLA JALUPA

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 021.- VILLA JALUPA

BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: (X)

EN PROCESO: ()

AMPLIACION: ()

REHABILITACION: ()

COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE MEJORAR LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA VILLA JALUPA DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, DEL ESTADO DE TABASCO, PARA LO CUAL SE LLEVARÁN A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES.
DESORILLE DEL CAMINO EN AMBOS LADOS DEL CAMINO, ESCARIFICADO Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA, RIEGOS DE EMULSION PARA IMPREGNACION, POREO CON ARENA LIMPIA, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE EMULSION PARA LIGA, TENDIDO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, Y PINTADO DE RAYAS LATERALES DE 10 CM DE ANCHO

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 4,800 HABITANTES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021

*Director de Obras ordenamiento territorial y servicios Municipales
Departamento de Estructuras Urbanas y Presupuestos*



JALPA
de Méndez
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: _____

OP33-109.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSÉ)

PROYECTOS DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.- URBANIZACION

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE MEJORAR LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA VILLA JALUPA DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, DEL ESTADO DE TABASCO, PARA LO CUAL SE LLEVARÁN A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES.

DESORILLE DEL CAMINO EN AMBOS LADOS DEL CAMINO, ESCARIFICADO Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA, RIEGOS DE EMULSION PARA IMPREGNACION, POREO CON ARENA LIMPIA, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE EMULSION PARA LIGA, TENDIDO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, Y PINTADO DE RAYAS LATERALES DE 10 CM DE ANCHO

021.- VILLA JALUPA

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. SERGIO ALBERTO HERNÁNDEZ PORTILLA
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 2 de febrero de 2021

INFORMACION ADICIONAL: _____



Jalpa de Méndez, Tabasco, a; 02 de febrero de 2021

Folio No.: DPADS/244/2021

Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental.

Ing. Sergio Alberto Hernández Portilla.

Director de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales.

H. Ayuntamiento De Jalpa de Méndez, Tab.

Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 113,114,115,116 del capítulo 12 de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 22 de diciembre de 2012 y artículos 32,33, inciso A,B,C,D,K,L, artículo 34 y 35 del reglamento de protección ambiental y desarrollo sustentable del municipio de Jalpa de Méndez del 26 de octubre de 2019 Se concede ejecutar la obra **OP33-109.- CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSE)**, a ejecutarse en: **021.- VILLA JALUPA**, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversión Autorizada
OP33-109.-	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSE)	021.- VILLA JALUPA	556 ML	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 1,658,572.83

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.







ATENTAMENTE
ING. LUISA MERCEDES VERA LAZARO
DIRECTORA DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE

C.C.P. ARCHIVO

CONTRATISTA		ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES		OP33-109.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSE)	
OBK		CONTRATO No:		CONT-DOOTSM-JM-03-4/2021	
MUNICIPIO:		LOCALIDAD:		JALPA DE MENDEZ 021.- VILLA JALUPA	
No. ESTIMACION:		PERIODO:		ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS DEL 18 AL 31 DE MAYO DE 2021	
FECHA:		RECURSOS:		04 DE JUNIO DE 2021 RAMO 33 FONDO III 2021	
RFC RIAM7710068R4		ALBUM FOTOGRÁFICO			
E-MAIL: mara771006@gmail.com					

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL Y NIVELACIÓN DIFERENCIAL, INCLUYE: PUENTES DE MADERA, CALEADO, REFERENCIAS, BANCOS DE NIVELES, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE PRECISIÓN Y PLANO DE PERFILES TOPOGRÁFICOS

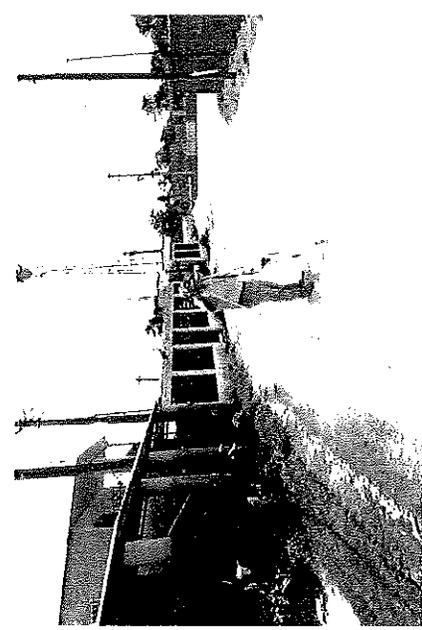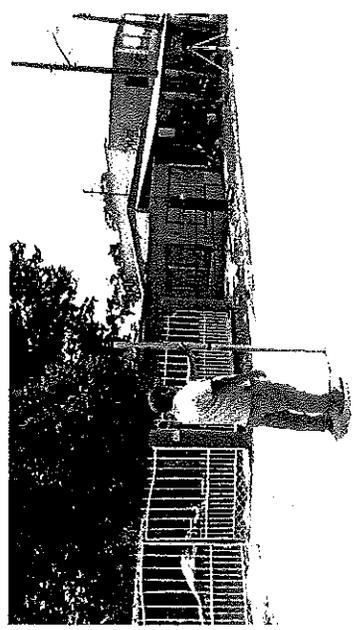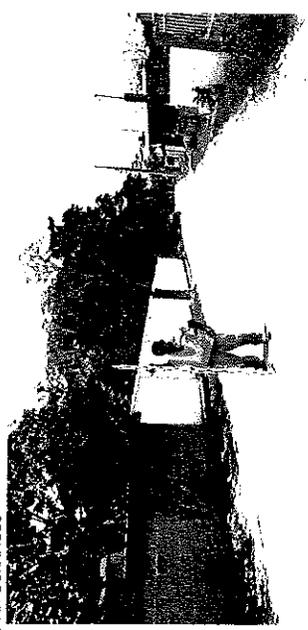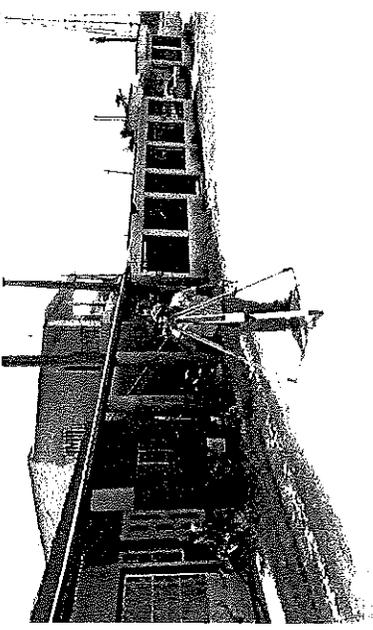

Elaboró:




 Ing. Miguel Angel Rivera Angles
 Superintendente de Construcción

Revisó:

 Ing. José Alberto Carrillo Ricárdez
 Residente de la DOOTSM

CONTRATISTA		ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES	
		RFC RIAM7710068R4 E-MAIL: mara771006@gmail.com	
OBRA:	OP33-109.- CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN	OP33-109.- CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN	PARTE DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSE)
CONTRATO No.:	CONT-DOOTSM-JM-034/2021	CONTRATO No.:	CONT-DOOTSM-JM-034/2021
MUNICIPIO:	JALPA DE MENDEZ	MUNICIPIO:	JALPA DE MENDEZ
LOCALIDAD:	021.- VILLA JALUPA	LOCALIDAD:	021.- VILLA JALUPA
No. ESTIMACION:	ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	No. ESTIMACION:	ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS
PERIODO:	DEL 18 AL 31 DE MAYO DE 2021	PERIODO:	DEL 18 AL 31 DE MAYO DE 2021
FECHA:	04 DE JUNIO DE 2021	FECHA:	04 DE JUNIO DE 2021
RECURSOS:	RAMO 33 FONDO III 2021	RECURSOS:	RAMO 33 FONDO III 2021
ALBUM FOTOGRAFICO			

DESORILLE DEL CAMINO EN AMBOS LADOS, CON MEDIO MECANICO, PARA DEFINIR EL PERFIL LATERAL DEL CAMINO: INCLUYE, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

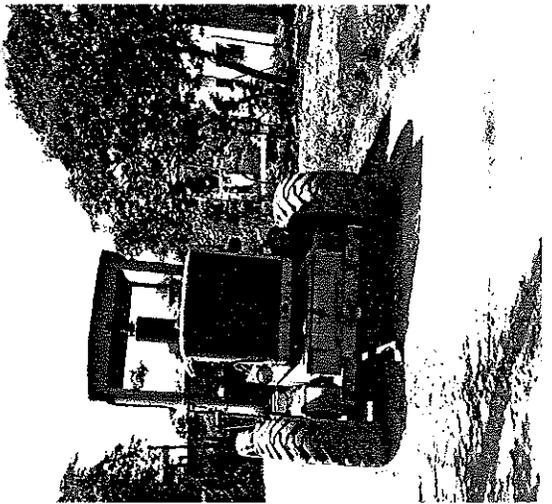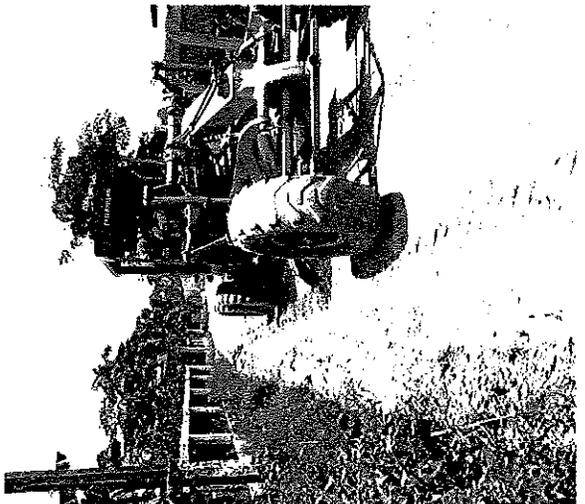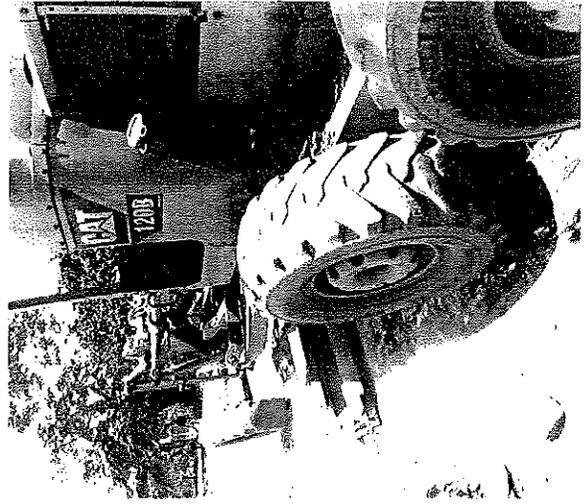



Elaboró: 
 Revisó: 
 Ing. José Alberto Carrillo Ricárdez
 Residente de la DOOTSM


Elaboró: 
 Ing. Miguel Ángel Rivera Angles
 Superintendente de Construcción

CONTRATISTA		ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES	
 RFC RIAM7710068R4 E-MAIL: maro771006@gmail.com		OP33-109.- CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN CONTRATO No: CONT-DOOTSM-JM-034/2021 MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD: 021.- VILLA JALUPA No. ESTIMACION: ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS PERIODO: DEL 18 AL 31 DE MAYO DE 2021 FECHA: 04 DE JUNIO DE 2021 RECURSOS: RAMO 33 FONDO III 2021	
ALBUM FOTOGRAFICO			

BACHEO PROFUNDO "CAIED" EN ZONAS AISLADAS E INESTABLES, INCLUYE: RETIRO DE LA MEZCLA EXISTENTE Y MATERIAL DE EXCAVACION DE 50 CM, RELLENO CON ARENA LIMPIA PUESTA EN OBRA (HASTA 30 CM), REPOSICION DE LA BASE HIDRAUJUCA CON GRAVA DE 1 1/2" A FINOS (15CM), EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

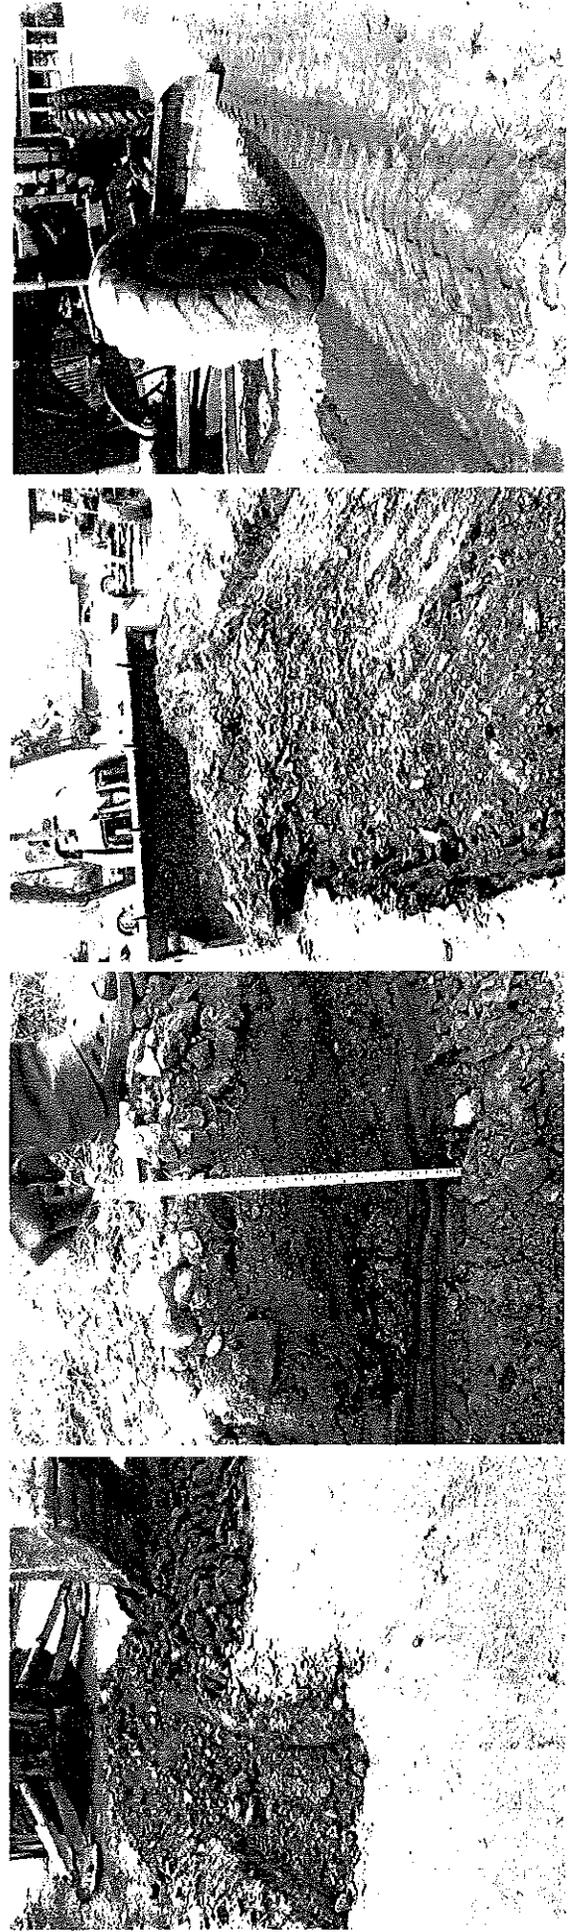


Elaboró: 


Revisó: 


Ing. José Alberto Carrillo Ricárdez
Residente de la DOOTSM

CONTRATISTA		ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES	
 RFC RIAM7710068R4 E-MAIL: mara771006@gmail.com		OBE: OP33-109.- CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN ... A DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSE) CONTRATO No.: CONT-DOOTSM-JM-034/2021 MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD: 021.- VILLA JALUPA No. ESTIMACION: ESTIMACION No. 1 (JUNO) TRABAJOS EJECUTADOS PERIODO: DEL 18 AL 31 DE MAYO DE 2021 FECHA: 04 DE JUNIO DE 2021 RECURSOS: RAMO 33 FONDO III 2021	
ALBUM FOTOGRAFICO			

ESCRIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTADO AL NOVENTA POR CIENTO (90%), INCLUYE: ADICIONAMIENTO DE AGUA, CONFORMACION, NIVELACION, ARINE, COMPACTACION Y EQUIPOS.


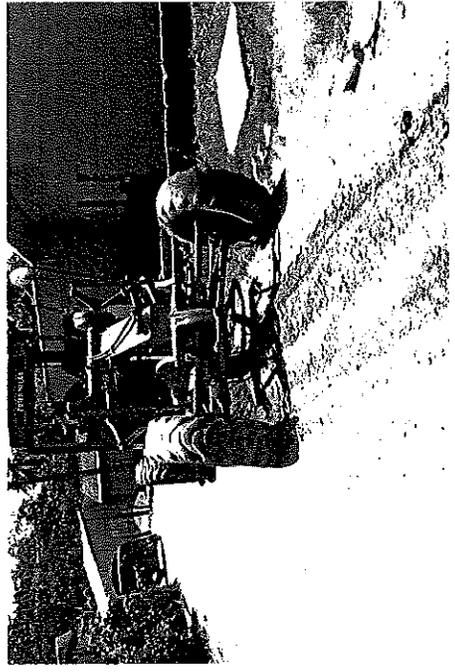


Elaboró: 
 Ing. Miguel Angel Rivera Angles
 Superintendente de Construcción

Revisó: 
 Ing. José Alberto Carrillo Rizardes
 Residente de la DOOTSM

CONTRATISTA		ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES		OP33-109.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSE)	
E-MAIL: mra771006@gmail.com		CONTRATO No:		CONT-DOOTSM-JM-034/2021	
RFC RIAM7710068R4		MUNICIPIO:		JALPA DE MENDEZ	
		LOCALIDAD:		021.- VILLA JALUPA	
		No. ESTIMACION:		ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	
		PERIODO:		DEL 18 AL 31 DE MAYO DE 2021	
		FECHA:		04 DE JUNIO DE 2021	
		RECURSOS:		RAMO 33 FONDO III 2021	
ALBUM FOTOGRAFICO					

OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION EN LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES O BASES CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETREO (REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS) Y COMPACTADO AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) (AASHTO ESTANDAR), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO "REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS" PUESTA EN BANCO, INCLUYE: ADQUISICIÓN Y CARGA, CONFORMACION, NIVELACION, ADICIONAMIENTO DE AGUA, AFINE, COMPACTACION Y EQUIPO.

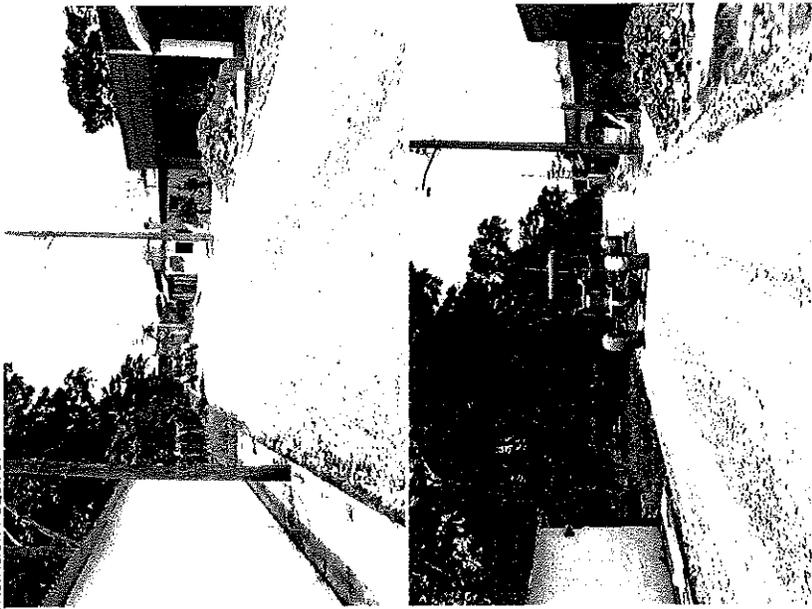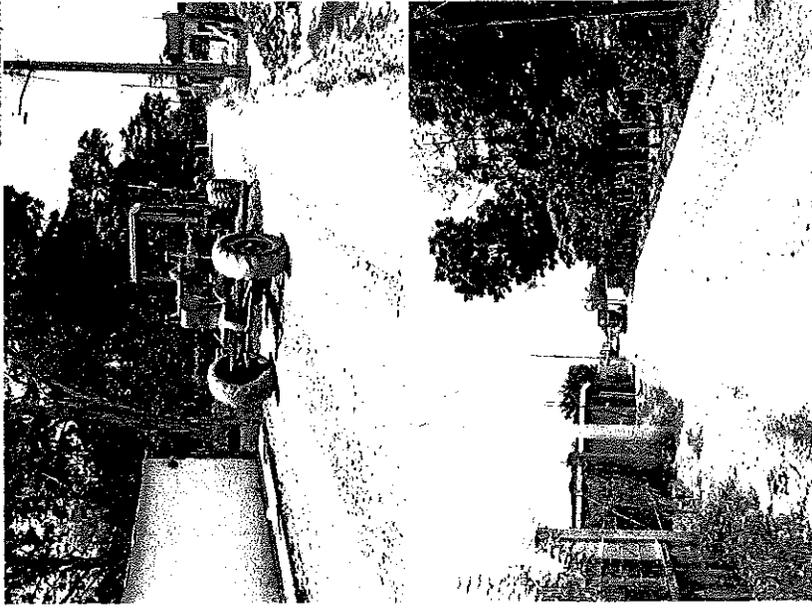

Elaboró:


Miguel Angel Rivera Angles
 Ing. Miguel Angel Rivera Angles
 Superintendente de Construcción


Revisó:


José Alberto Carriño Ricárdez
 Ing. José Alberto Carriño Ricárdez
 Residente de la DOOTSM

CONTRATISTA		ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES  RFC RIAM7710068R4 E-MAIL: mara771006@gmail.com	
OBF: _____ CONTRATO No: _____ MUNICIPIO: _____ LOCALIDAD: _____ No. ESTIMACION: _____ PERIODO: _____ FECHA: _____ RECURSOS: _____	OP33-109.- CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN _____ PA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSE) CONT.-DOOTSM-JM-034/2021 JALPA DE MENDEZ 021.- VILLA JALUPA ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS DEL 18 AL 31 DE MAYO DE 2021 04 DE JUNIO DE 2021 RAMO 33 FONDO III 2021		
ALBUM FOTOGRAFICO			

BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR POR MEDIOS MANUALES PARA RECIBIR RIEGOS DE IMPREGNACION CON CEPILLO DE CERDA DE RAIZ, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, APILE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO FUERA DE LA OBRA.

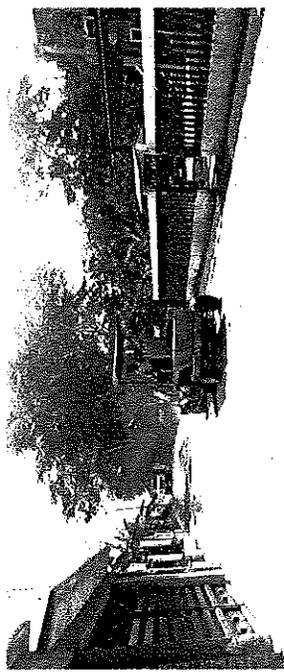

Elaboró:

 Ing. Miguel Angel Rivera Angles
 Superintendente de Construcción

Revisó:

 Ing. Jose Alberto Carrillo Ricardaz
 Residente de la DOOTSM

CONTRATISTA

ING. MIGUEL ANGEL RIVERA
ANGLES

RFC RIAM7710068R4
 E-MAIL: mra771006@gmail.com

OBR	OP33-109.- CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALAPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALAPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSE)
CONTRATO No:	CONT-DOOTSM-JM-03/2021
MUNICIPIO:	JALPA DE MENDEZ
LOCALIDAD:	021.- VILLA JALAPA
No. ESTIMACION:	ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS
PERIODO:	DEL 18 AL 31 DE MAYO DE 2021
FECHA:	04 DE JUNIO DE 2021
RECURSOS:	RAMO 33 FONDO III 2021

ALBUM FOTOGRAFICO

RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO MEDIO DE BAJA VISCOSIDAD (RM-2K) A RAZON DE 1.5 LT/M2 CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, CALENTAMIENTO DE LA EMULSION, BOMBEO, COMBUSTIBLE, OPERACION Y EQUIPOS.



Elaboró:


[Signature]
 Ing. Miguel Ángel Rivera Angles
 Superintendente de Construcción

Revisó:


[Signature]
 Ing. José Alberto Carrillo Ricárdez
 Residente de la DOOTSM

CONTRATISTA		ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES		OP33-109.- CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALAPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSE)	
 RFC RIAM7710068R4 E-MAIL: mara771006@gmail.com		OBF: _____ CONTRATO No: _____ MUNICIPIO: _____ LOCALIDAD: _____ No. ESTIMACION: _____ PERIODO: _____ FECHA: _____ RECURSOS: _____		CONT-DOOTSM-JM-034/2021 JALPA DE MENDEZ 021.- VILLA JALUPA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS DEL 18 AL 31 DE MAYO DE 2021 04 DE JUNIO DE 2021 RAMO 33 FONDO III 2021	
ALBUM FOTOGRAFICO					

PROCESO DE POREO CON ARENA LIMPIA A RAZÓN DE 10 LT/M2 EN ZONA IMPREGNADA, INCLUYE: ADQUISICIÓN Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y REMOCIÓN DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA

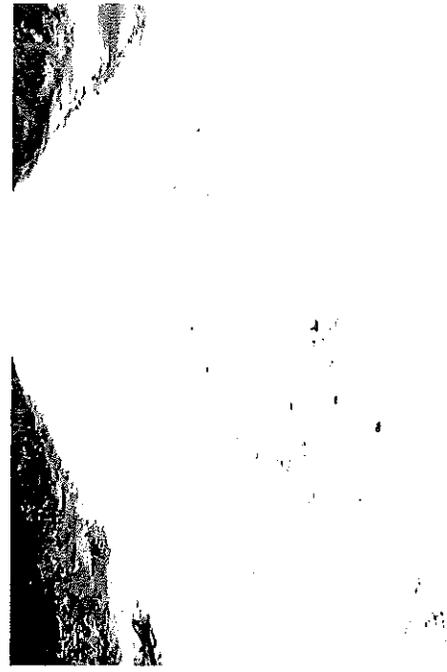

Elaboró:





 Ing. Miguel Angel Rivera Angles
 Superintendente de Construcción

Revisó:

 Ing. José Alberto Carrillo Ricárdez
 Residente de la DOOTSM

CONTRATISTA	ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES	OP33-109.- CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSE)
	RFC RIAM7710068R4 E-MAIL: mara771006@gmail.com	CONTRATO No: CONT-DOOTSM-JM-034/2021
	MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ	
	LOCALIDAD: 021.- VILLA JALUPA	
	No. ESTIMACION: ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	
	PERIODO: DEL 18 AL 31 DE MAYO DE 2021	
	FECHA: 04 DE JUNIO DE 2021	
	RECURSOS: RAMO 33 FONDO III 2021	
ALBUM FOTOGRAFICO		

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO PARA ALCANTARILLA DE 12" DE Ø SERIE 20, INCLUYE: EXCAVACION PARA SU COLOCACION Y FLETE PUESTA EN OBRA.

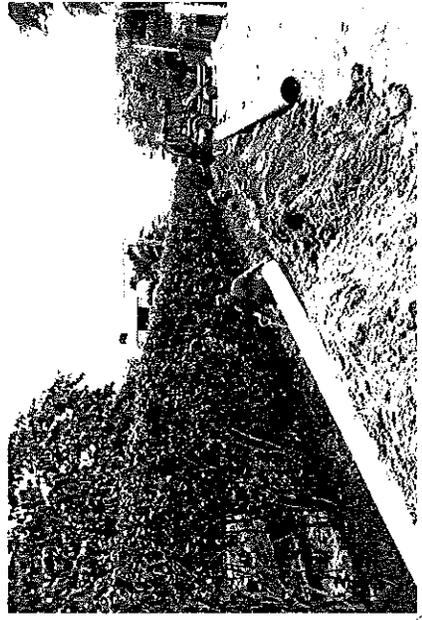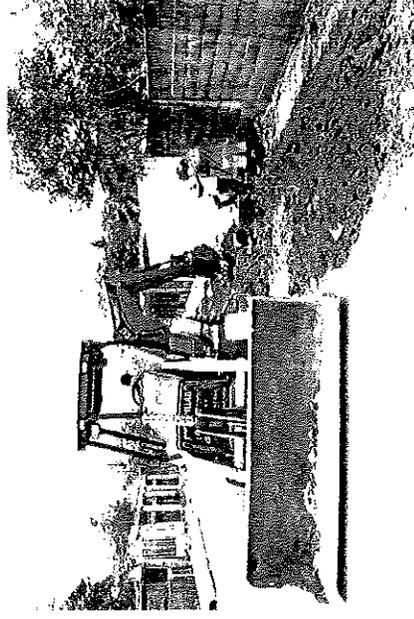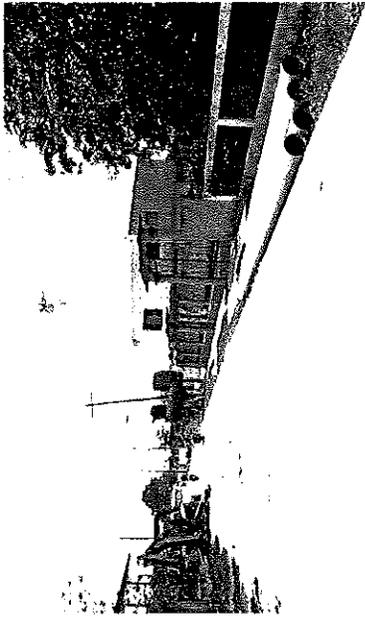

Elaboró:

Miguel Angel Rivera
Ing. Miguel Angel Rivera Angles
Superintendente de Construcción




Revisó:


Alberto Carrillo
Ing. José Alberto Carrillo Ricárdez
Residente de la DOOTSM

CONTRATISTA		ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES	
OBI		OP33-109.- CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EI	
CONTRATO No:		CONT-DOOTSM-JM-034/2021	
MUNICIPIO:		JALPA DE MENDEZ	
LOCALIDAD:		021.- VILLA JALUPA	
No. ESTIMACION:		ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	
PERIODO:		DEL 18 AL 31 DE MAYO DE 2021	
FECHA:		04 DE JUNIO DE 2021	
RECURSOS:		RAMO 33 FONDO III 2021	
ALBUM FOTOGRAFICO			

E-MAIL: mara771006@gmail.com

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA DE CONCRETO PARA PASE DE AGUA DE 0.61 M. DE DIAMETRO CON EQUIPO MECANICO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, INCLUYE NIVELACION Y MANO DE OBRA.

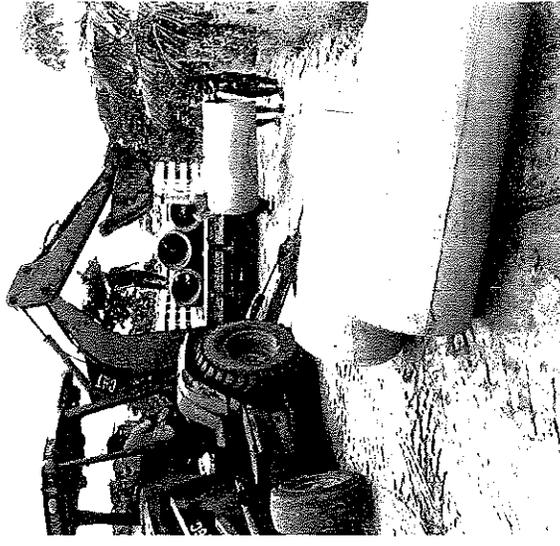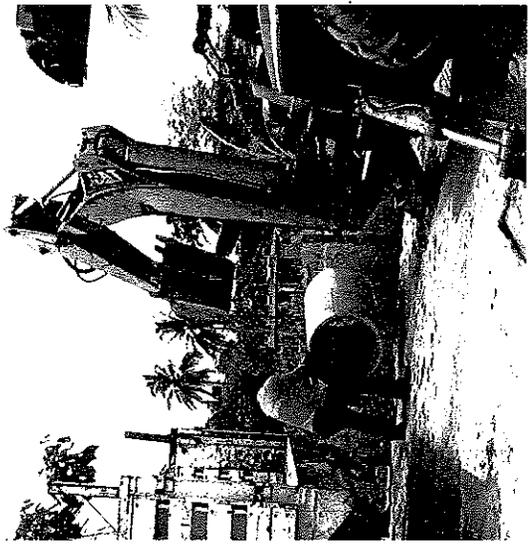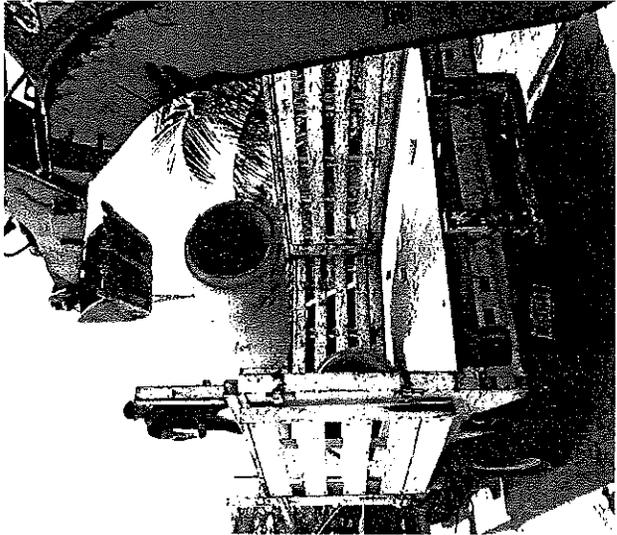

Elaboró:

 Ing. Miguel Ángel Rivera Angles
 Superintendente de Construcción


Revisó:


 Ing. José Alberto Cañillo Ricárdez
 Residente de la DOOTSM

CONTRATISTA		ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES	
		RFC RIAM7710068R4 E-MAIL: mara771006@gmail.com	
OB	OP33-109.- CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES E. JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSE)	CONTRATO No:	CONT-DOOTSM-JM-034/2021
MUNICIPIO:	JALPA DE MENDEZ	LOCALIDAD:	021.- VILLA JALUPA
No. ESTIMACION:	ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	PERIODO:	DEL 18 AL 31 DE MAYO DE 2021
FECHA:	04 DE JUNIO DE 2021	RECURSOS:	RAMO 33 FONDO III 2021
ALBUM FOTOGRAFICO			

CONSTRUCCION DE CABEZAL DE CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 30 CM. DE BASE, 20 CM DE CORONA Y 1.00 M. DE ALTURA ARMADA CON VAR. No. 3 EN AMBOS SENTIDOS @ 20 CM. SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE SECCION 0.60X2.00X0.15 ARMADAC CON VAR No. 3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS. PLANTILLA DE CONCRETO DE 6 CM. DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2, INCL. EXCAVACION SUM. DE MATERIAL, ELABORACION, ACARREO, VACIADO, VIBRADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, ACABADO RUSTICO.



Elaboró:

 Ing. Miguel Angel Rivera Angles
 Superintendente de Construcción

Revisó:

 Ing. José Alberto Cañilo Ricárdez
 Residente de la DOOTSM

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ
TABASCO

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENT
TO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNI
CIPALES

DOMICILIO ENTE PUBLICO: PLAZA HIDALGO NUM. 1
COL. CENTRO, JALPA DE MENDEZ
TABASCO

EMPRESA CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL RIVERA
ANGLES

DOMICILIO CONTRATISTA: PROLONGACIÓN DE GUADALUPE
VICTORIA S/N COL. CENTRO,
CARDENAS TABASCO

CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-034/2021

OBRA : OP33-109.- CONSTRUCCION DE CAMINOS
RURALES EN JALPA DE MENDEZ
LOCALIDAD JALUPA (BARRIO
SAN ISIDRO TRAMO SAN
JOSE)

FECHA: 17 DE MAYO DE 2021

FECHA 18/05/2021

N 01

DATOS PARTICULARES DE LA OBRA

ESTADO: TABASCO

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ

LOCALIDAD: 021.- VILLA JALUPA

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 18 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2021

MONTO DEL CONTRATO:


PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS NATURALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III 2021

META: 556.00 ML



ING. JOSÉ ALBERTO CARRILLO RICARDEZ
RESIDENTE DE LA DOOTSM



ING. MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLÉS
SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCIÓN

FECHA 18/05/2021

02

DATOS DEL SUPERINTENDENTE

NOMBRE: MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES

PROFESIÓN: INGENIERO CIVIL

CÉDULA PROFESIONAL: 3420248

IDENTIFICACIÓN OFICIAL: CREDENCIAL DE ELECTOR

DOMICILIO: CALLE DEGOLLADO COL. CENTRO, CÁRDENAS
TABASCO.

TEL: 9141357705

DATOS DEL RESIDENTE

NOMBRE: JOSÉ ALBERTO CARRILLO RICÁRDEZ

PROFESIÓN: INGENIERO CIVIL

CÉDULA PROFESIONAL: 2975207

IDENTIFICACIÓN OFICIAL: CREDENCIAL DE ELECTOR


DOMICILIO: R/A CHACALAPA 2DA SECC.

TEL: 9371045829



ING. JOSÉ ALBERTO CARRILLO RICÁRDEZ

RESIDENTE DE LA DOOTSM



ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

REGLAMENTO DEL USO DE LA BITÁCORA

- 1.- SE PODRAN ASENTAR NOTAS DE LUNES A DOMINGO EN UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M.
- 2.- LOS NUMEROS GENERADORES SERAN PRESENTADOS A LA RESIDENCIA DE OBRA CON UNA PERIODICIDAD QUINCENAL O MENSUAL, SEGUN SEA EL CASO.
- 3.- LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR LA ESTIMACION A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES AL 15 O AL 30 DE CADA MES, SEGUN LO ESTABLECIDO COMO FECHA DE CORTE EN EL CONTRATO. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA DE AUTORIZAR LA ESTIMACION EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ESTIMACION.
- 4.- LA CONTRATISTA DEBERA DE SOLICITAR LAS CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO A LA RESIDENCIA DE OBRA EN FORMA OPORTUNA.
- 5.- SE DEBEN ESCRIBIR LOS ASIENTOS CON LETRA DE MOLDE CLARA Y COMPRENSIBLE, SIN ABREVIATURAS, SIN BORRONES, TACHADURAS, O ENMENDADURA CUALQUIER NOTA CON ALGUNA DE ESTAS CARACTERISTICAS SE CONSIDERA NULA.
- 6.- SE DEBE ESCRIBIR CON BOLIGRAFO DE TINTA INDELEBLE.
- 7.- TODAS LAS NOTAS DEBEN IDENTIFICARSE POR UN NUMERO, EL CUAL DEBERA SEGUIR UN ORDEN CONSECUTIVO, NO ESTA PERMITIDO POSFECHAR NI ANTEFECHAR ASIENTOS.
- 8.- SE DEBERAN CANCELAR LOS ESPACIOS SOBREPANTES DE UNA HOJA AL COMPLETARSE EL LLENADO DE LAS MISMAS.
- 9.- QUEDA PROHIBIDO A CUALQUIER PERSONA QUE NO TENGA FIRMA AUTORIZADA EN LA MISMA BITÁCORA REALIZAR ASIENTOS; DADO EL CASO LA NOTA SERA NULA.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA...

18/05/2021


10.- LA BITÁCORA SIEMPRE DEBERÁ ESTAR EN LA OBRA, POR NINGÚN MOTIVO DEBE SALIR ANTES DE ASENTAR LA NOTA FINAL.



ING. JOSÉ ALBERTO CARRILLO RICÁRDEZ
RESIDENTE DE LA DOOTSM



ING. MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLÉS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



18-05/2021

04


SE ENTREGA AL CONTRATISTA LA DOCUMENTACIÓN TOTAL NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS LA CUAL CONSTA DE: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTRATO, ALCANCES Y ESPECIFICACIONES, MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS, NORMAS, PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES, PLANO INICIAL DEL PROYECTO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL CONTRATO.



ING. JOSÉ ALBERTO CARRILLO RICARDEZ
RESIDENTE DE LA DOOTSM



ING. MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLÉS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN




18 05 2021

05


EL RESIDENTE ING. JOSÉ ALBERTO CARRILLO RICÁRDEZ, REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, HACE LA ENTREGA FÍSICA DEL SITIO DE LA OBRA, UBICADO EN VILLA JALUPA, MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, ESTADO TABASCO, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE ING. MANUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS QUIEN RECIBE.



ING. JOSÉ ALBERTO CARRILLO RICÁRDEZ
RESIDENTE DE LA DOOTSM



ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN




FECHA 18/05/2021

06

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE DAN INICIO A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONTANDO EN EL LUGAR DE LA OBRA CON EL PERSONAL Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, ASI COMO LA LLEGADA AL LUGAR DE LA OBRA LOS EQUIPOS MECANICOS; MOTOCONFORMADORA, RETROEXCAVADORA, PIPA DE AGUA, VIBROCOMPACTADOR, PARA DAR INICIO CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN COMENTO.

~~ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES,
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION~~

~~ING. JOSÉ ALBERTO CARRILLO RICARDEZ
RESIDENTE DE LA DOOTSM~~




01/11/19 05/2021

07

SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE INICIAN CON LOS TRABAJOS DE DESORILLE DEL CAMINO, DEL CAD. 0+000.00 AL 0+424.00, RETIRANDO EL MATERIAL DE DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA. IGUALMENTE SE INICIAN CON LOS TRABAJOS DE BACHEO PROFUNDO "CAJEC" EN ZONAS AISLADAS E INESTABLES RETIRANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y DEPOSITÁNDOLO EN EL LUGAR DESIGNADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA. ASÍ MISMO LLEGAN A LA OBRA LAS TUBERIAS DE PVC DE 12" DE Ø PARA LOS PASES DE AGUA Y LA SALIDA DE LAS AGUAS PLUVIALES QUE SE QUEDAN ESTANCADAS EN EL CAMINO.

~~ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION~~


~~ING. JOSÉ ALBERTO CARRILLO RICÁRDEZ
RESIDENTE DE LA DOOTSM~~




FECHA 21/05/2021

08


SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CONSTRUCCION DE CABEZALES DE CONCRETO HIDRAULICO, Y RELLENO CON ARENA LIMPIA EN AREAS DE LAS ALCANTARILLAS. ASI MISMO SE INFORMA QUE SE TERMINAN CON LOS TRABAJOS DE DESORILLE DEL CAMINO.



ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES,
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ING. JOSÉ ALBERTO CARRILLO RICARDOZ
RESIDENTE DE LA DOOTSM



22 05 2021

09


SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE ESCARIFICADO, DISGREGADO, Y ACAMELLONADO DEL CAD: 0+000.00 AL 0+424.00, ASÍ MISMO SE COMPACTA LA ZONA DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR CON EQUIPO RODILLO VIBROCOMPACTADOR. DE LA MISMA MANERA SE LE NOTIFICA A LA RESIDENCIA QUE SE TERMINAN CON LOS TRABAJOS DE CAJEOS EN ZONAS INESTABLES.



ING. MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLÉS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




ING. JOSÉ ALBERTO CARRILLO RICÁRDEZ
RESIDENTE DE LA DOOTSM




FECHA 24/05/2021

10

SE LE HACE SABER A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE INICIA CON EL TIRO DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS DEL CAD. 07000.00 AL 07424.00, CON SUS RESPECTIVOS ACARREOS, AL PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, SE REALIZAN RIEGOS DE AGUA CON PIPA PARA HUMEDECER EL MATERIAL PARA POSTERIORMENTE SER COMPACTADO CON EQUIPO RODILLO VIBROCOMPACTADOR HASTA ALCANZAR LA COMPACTACION DE PROYECTO, SE INFORMA TAMBIEN QUE EN EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA PERSONAL DE LABORATORIO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS PERTINENTES A LA COMPACTACION DEL MATERIAL Y SU GRANULOMETRIA. POR OTRA PARTE SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA QUE SE TERMINAN CON LOS TRABAJOS DE ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO.


ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ING. JOSÉ ALBERTO CARRILLO RICARDEZ
RESIDENTE DE LA DOOTSM



25 05 2021

11


SE LE NOTIFICA A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA NECESIDAD DE EJECUTAR VOLÚMENES ADICIONALES, EN BREVE SE LE HARÁ LLEGAR UNA RELACION DE LOS CONCEPTOS QUE ESTÁN EXCEDIENDO EL VOLÚMEN DE PROYECTO PARA QUE SE REVISEN Y SE AUTORIZEN SI ASÍ LO CREE O LO CONSIDERA CONVENIENTE LA RESIDENCIA DE OBRA.



ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS,
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




ING. JOSÉ ALBERTO CARRILLO RICÁRDEZ
RESIDENTE DE LA DOTS M



FECHA 28/ 05 2021

12


SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE; BARRIDO DE LAS SUPERFICIES YA CONFORMADAS Y COMPACTADAS DE BASE HIDRAULICA RIEGOS DE IMPREGNACION Y POREOS CON ARENA LIMPIA EN ZONA IMPREGNADA, TODO ESTO PARA PROTEGER LA BASE. ASI MISMO SE INFORMA QUE SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.



ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ING. JOSÉ ALBERTO CARRILLO RICARDEZ
RESIDENTE DE LA DOTSMA



31 05 2021

13


SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA QUE SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE RAVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS, RIEGOS DE IMPREGNACIÓN, Y POREOS CON ARENA LIMPIA EN LAS ZONAS IMPREGNADAS DEL CAD. 0+000.00 AL 0+424.00 RESPECTIVAMENTE; DE LA MISMA MANERA SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE CONCRETO HIDRAULICO.

~~COPIA~~

ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

~~COPIA~~


ING. JOSÉ ALBERTO CARRILLO P. KÁRDEZ
RESIDENTE DE LA DOOTSM




04/06/2021

14

CON ESTA FECHA SE LE HACE ENTREGA A LA RESIDENCIA DE OBRA LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS, LA CUAL COMPRENDE EL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DE 2021, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN; NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS, FOTOS, Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA SU REVISIÓN.



ING. MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLÉS,
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN


ING. JOSÉ ALBERTO CARRILLO RICÁRDEZ
RESIDENTE DE LA DOOTSM

04/06/2021

Nº 15

CON ESTA FECHA SE LE HACE ENTREGA A LA RESIDENCIA DE OBRA LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DE 2021, ACOMPAÑADA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE; BORRADOR DE LA FACTURA, CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, CUERPO DE ESTIMACIÓN PARA SU REVISIÓN O APROBACIÓN SEGÚN, SEA, EL CASO, Y PODER ASÍ CONTINUAR CON LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES


ING. MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLÉS,
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN


ING. JOSÉ ALBERTO CARRILLO RICÁRDEZ
RESIDENTE DE LA DOOTSM

